


揚塵防治 週報表

112/07/31~112/08/06



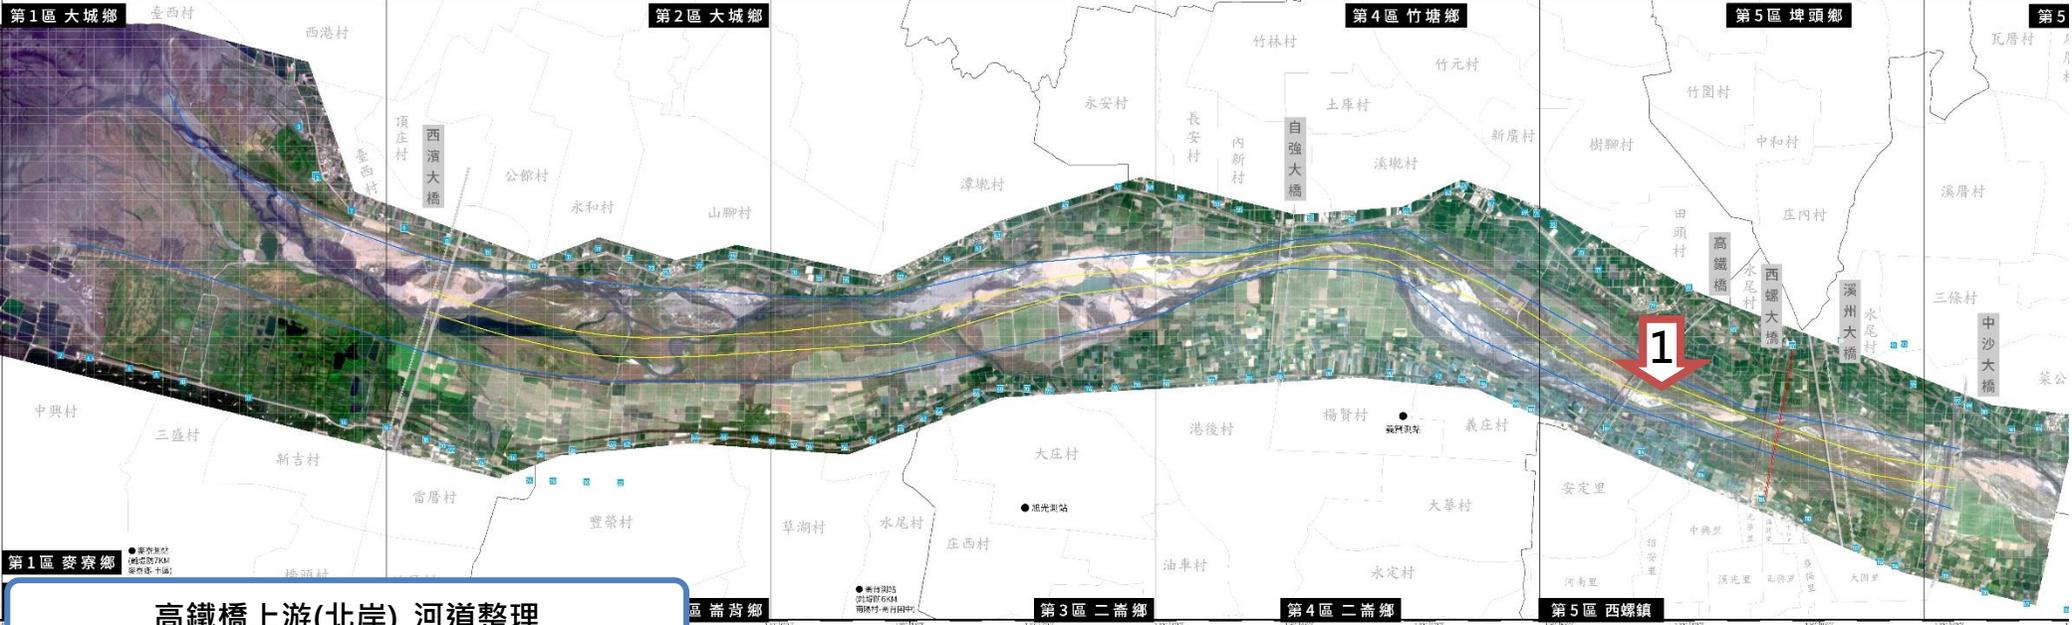

高鐵橋上游(北岸)_河道整理



因卡努颱風及集集攔河堰放流影響，河道水位過高，故河道整理完成日期延長至8月底



各區 空拍現況


第一區

西濱大橋下游



第二區

大庄堤防下游

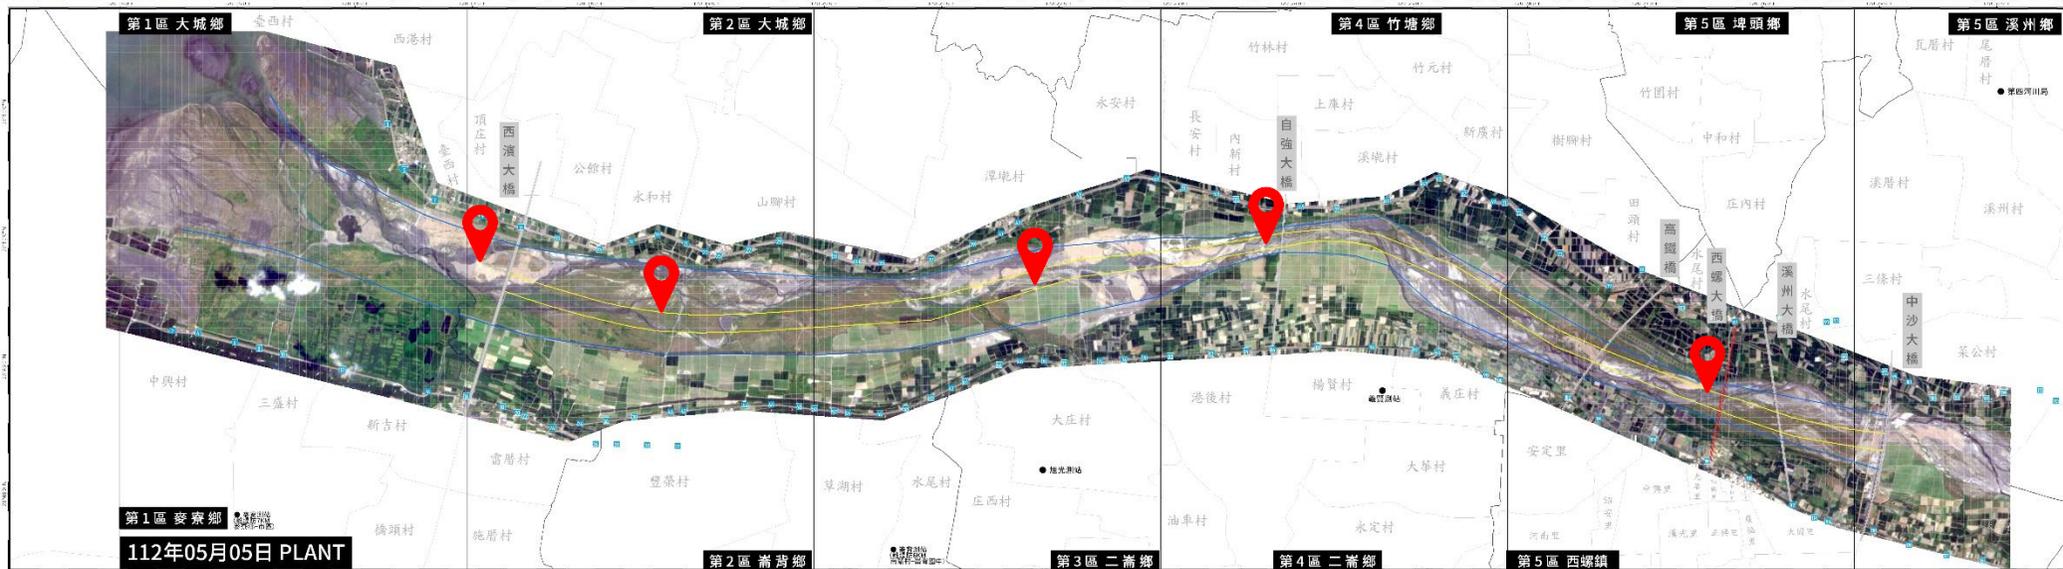

第三區

74號越堤路 下游



第四區

自強大橋 下游



第五區

西螺大橋 上下游



112年度

揚塵KPI進度管制

執行期程:112年5月至113年4月

- 抑制面積
- 進度



其他覆蓋

- 目標值 : 450 公頃
- 已完成 : 6 公頃
- 達成率 : 1.2 %



水覆蓋

- 目標值 : 400 公頃
- 已完成 : 0 公頃
- 達成率 : 0 %



河道整理

- 目標值 : 2.5 公里
- 已完成 : 1.3 公里
- 達成率 : 52%



防洪植栽

- 目標值 : 6 公里
- 已完成 : 1.2 公里
- 達成率 : 20 %



綠覆蓋

- 目標值 : 50 公頃
- 已完成 : 0 公頃
- 達成率 : 0 %

營造複式斷面規劃圖

複式斷面	年度	107-109	110	111	112	合計
	KPI(公里)	8	2	6	4	20
	實際完成	8	2.13	6.05	1.2	17.38



112年營造複式斷面進度管控

KPI / 4公里

已完成 / 1.2 km


達成率 / 30 %

執行進度說明：

- 1、自強大橋下游南岸已於112年7月12日完成1.2公里複式斷面。
- 2、高鐵橋下游北岸(規劃1.6公里)，因受卡努颱風及集集攔河堰放流影響，目前河道水位豐沛，將俟水位下降後，進場辦理便道修復事宜，故土方培厚作業擬依現況調整延至112年8月下旬進場。
- 3、高鐵橋上游北岸(規劃1.2公里)，本週完成0公里，累計已施作0.56公里。因受卡努颱風及集集攔河堰放流影響，河道水位高漲取淹沒作業便道，影響取土作業，故土方培厚作業預計延至112年8月底完成。

水防道路植栽規劃圖

水防道路植栽	年度	110	111	112	113	114	115	合計
	KPI(公里)	1	2	2	2	2	2	11
	實際完成	1	2.3	-	-	-	-	3.3

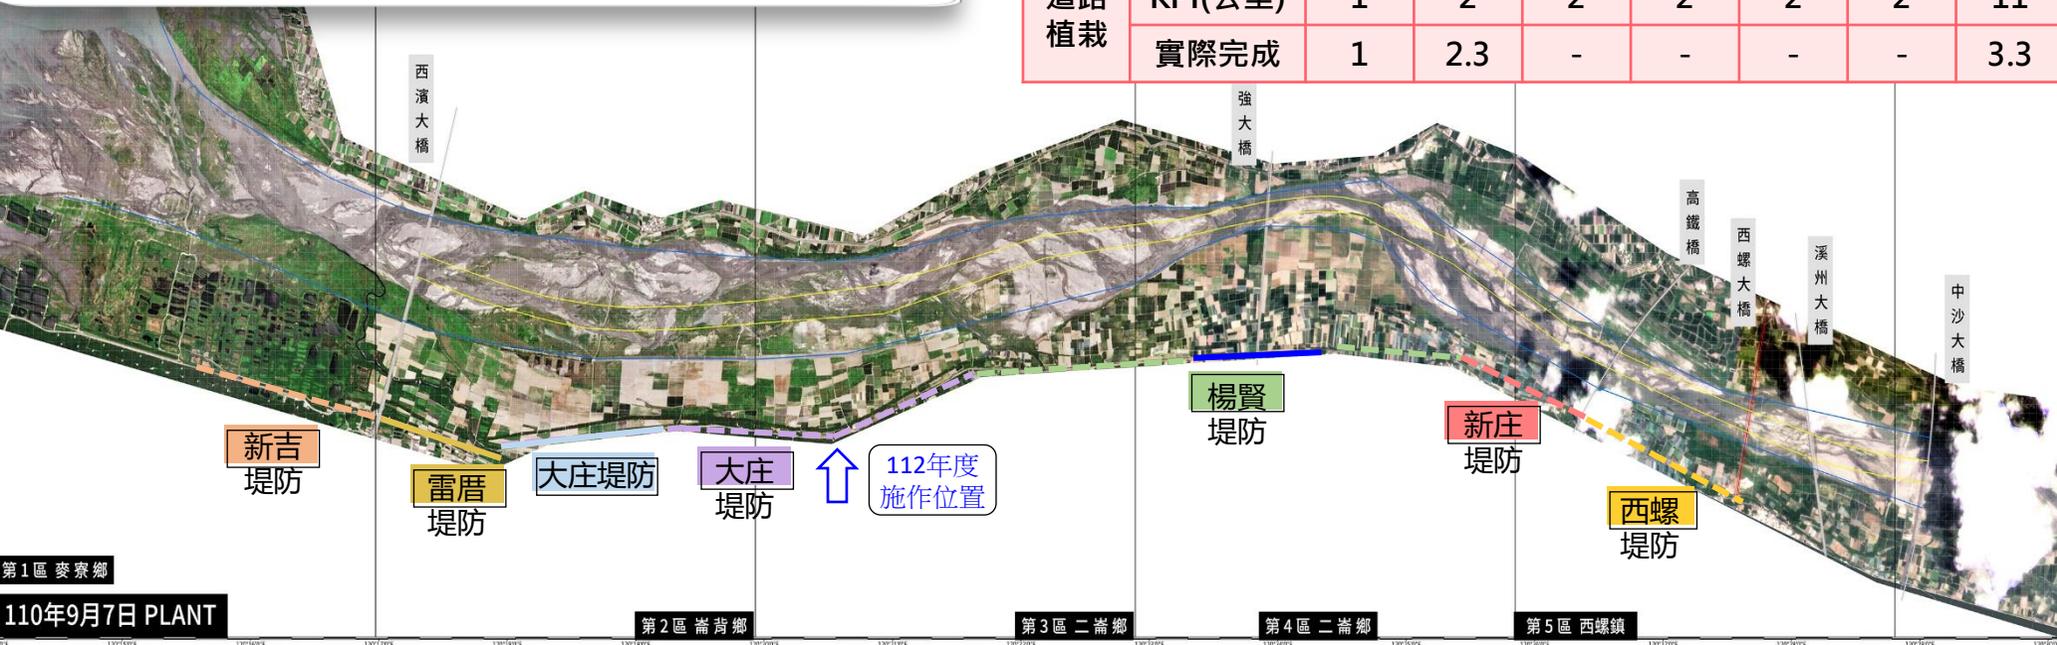

第1區 麥寮鄉

110年9月7日 PLANT

第2區 崙背鄉

第3區 二崙鄉

第4區 二崙鄉

第5區 西螺鎮



• 112年水防道路植栽進度管控

KPI / 2公里 ➤ 執行進度說明：

已完成 / 0公里
達成率 / 0%

- 1、大庄堤防規劃施作0.5公里，目前已進場施作堤防構造改善工程作業中，因變更設計進度修正為80%，預計112年8月底前完成(工務課案件)。
- 2、依112年7月12日工務所小組會議討論，後續1.5公里規劃於大庄堤防42至54號越堤路區段，並擇期至現地會勘，依現況評估後續進場期程。

