
揚塵防治週報表

112/11/13~112/11/19





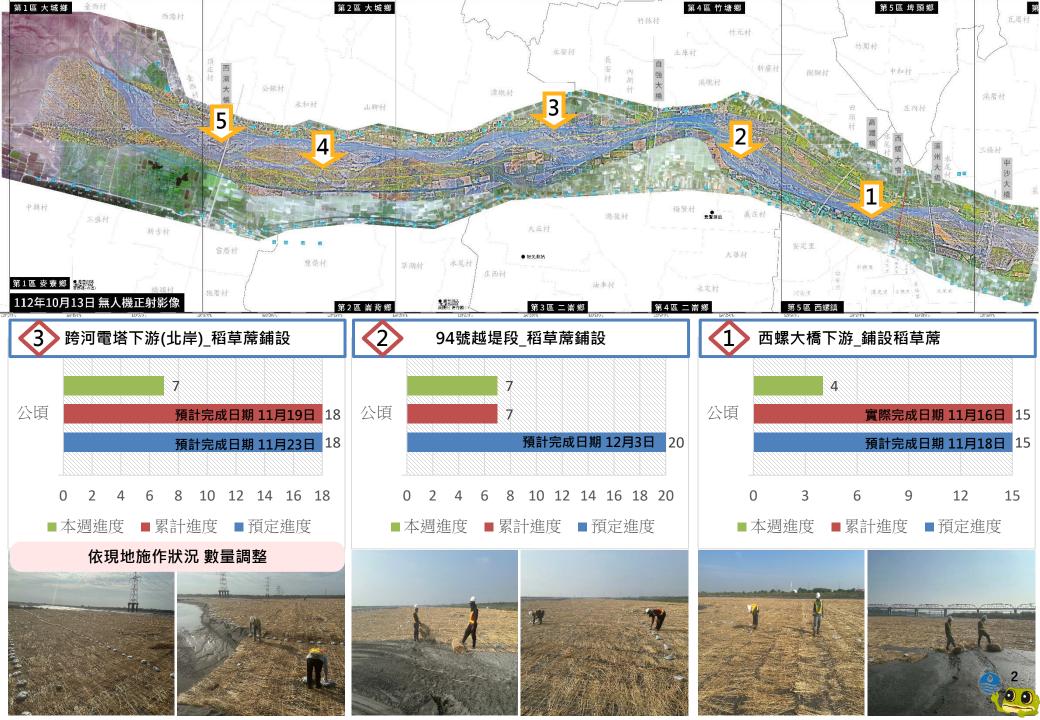


各區

空拍現況





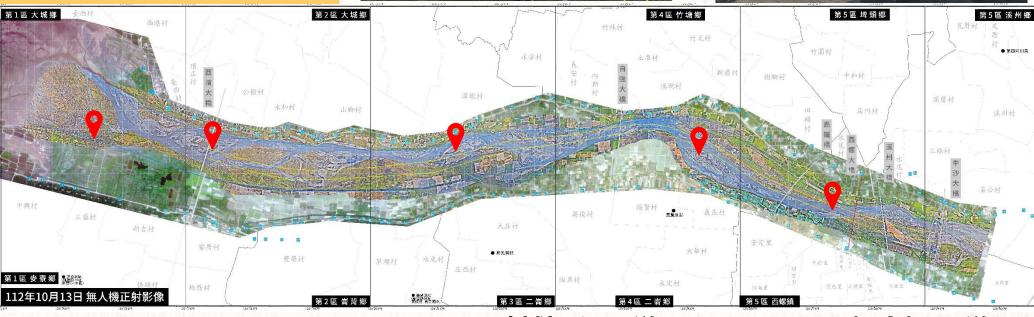



大義崙排水 下游



94號越堤段下游



第五區 西螺大橋 下游



112年度

揚塵KPI進度管制

執行期程:112年5月至113年4月

- > 抑制面積
- > 進度



其他覆蓋

• 目標值: 450 公頃

•已完成:165 公頃

• 達成率: 36.7 %



水覆蓋

• 目標值: 400 公頃

• 已完成: 210 公頃

• 達成率: 52.5 %



河道整理

• 目標值: 2.5 公里

• 已完成: 2 公里

• 達成率: 80%



防洪植栽

• 目標值:6 公里

• 已完成: 4.45 公里

• 達成率:74.2%



綠覆蓋

•目標值:50 公頃

•已完成:292公頃

•達成率:584%





• 112年營造複式斷面進度管控

KPI /4公里

已完成 / 2.45 km

達成率/61%

- > 執行進度說明:
- 1、自強大橋下游南岸已於112年7月12日完成1.2公里複式斷面。
- 2、高鐵橋上游北岸已於10月31日完成完成1.25公里複式斷面。
- 3、高鐵橋下游北岸(規劃1.6公里),疏濬工程廠商辦理土方培厚目前已完成500公尺,持續培厚中,預計於112年11月30日完成,後續造林部分規劃於12月底完成。





112年水防道路植栽進度管控

KPI / 2公里 ➤ 執行進度說明:

達成率/ 100%

- 已完成/2公里 1、大庄堤防規劃施作0.5公里,已於112年8月25 日完成。
 - 2、大庄堤防42至54號越堤段規劃1.5公里,已於 112年9月20日完成。

揚 塵 抑 制 措 施	水覆蓋	原在村 发	永安村 永安村	基準村 新療材	付別村 中和村 在內村 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京
		1)西濱橋下游段(北岸)_蓄水池50公頃		1)51號越堤段_蓄水池80公頃 2)94號越堤段_蓄水池50公頃	1) 溪州大橋上游_蓄水池塘_30公頃
	河道整理	河道整理	河道整理	河道整理	河道整理
			1) 跨河電塔下游0.74公里		1) 高鐵橋上游(北岸)1.26公里
	綠覆蓋	緑覆蓋	綠覆蓋	緑覆蓋	綠覆蓋
1) 出海口 23口井灘地_空灑草籽52公頃 2) 西濱大橋下游至7號越堤路_空灑草籽 45公頃			1) 跨河電塔上下游低灘地_空灑草籽40公頃	1) 94號越堤段北側河道灘地_空灑草籽 55公頃	1) 中沙大橋至溪洲大橋灘地_空灑草籽70公頃 2) 西螺大橋上下游河中低灘地_空灑草籽30公頃
	防洪植栽	防洪植栽	防洪植栽	防洪植栽	防洪植栽
		1) 大庄堤防44-54號越堤_水防道路植 栽1.5公里。	1) 自強大橋下游南岸_培厚區植栽1.2 公里 2) 大庄堤防62-66號越堤_水防道路植栽0.5公里。		1) 高鐵橋上游(北岸)_培厚植栽1.25公里
	其他覆蓋	其他覆蓋	其他覆蓋	其他覆蓋	其他覆蓋
1) 7號越堤路段_舗設稻草蓆9公頃		 40-44號越堤路段_鋪設稻草蓆19公頃 西濱橋下河中島_鋪設稻草蓆18公頃 	1) 自強大橋下游南岸_培厚區簡易灑水系統6公頃 2) 大義崙上游低灘地_稻草蓆30公頃 3) 跨河電塔上游(北岸)_稻草蓆鋪13公頃 4) 跨河電塔下游(北岸)_稻草蓆鋪設18 公頃	1)94號越堤路段_鋪設稻草蓆7公頃	1)溪州大橋上游北岸_稻草蓆鋪設20公頃 2)高鐵橋上游(北岸)_簡易灑水系統10公頃 3)西螺大橋下游_鋪設稻草蓆15公頃
