


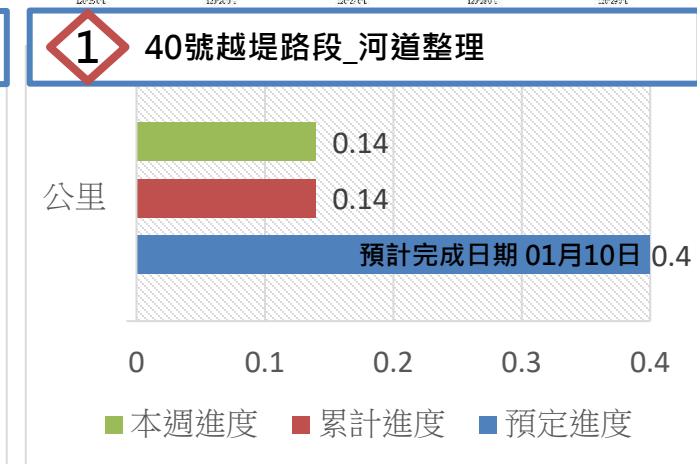
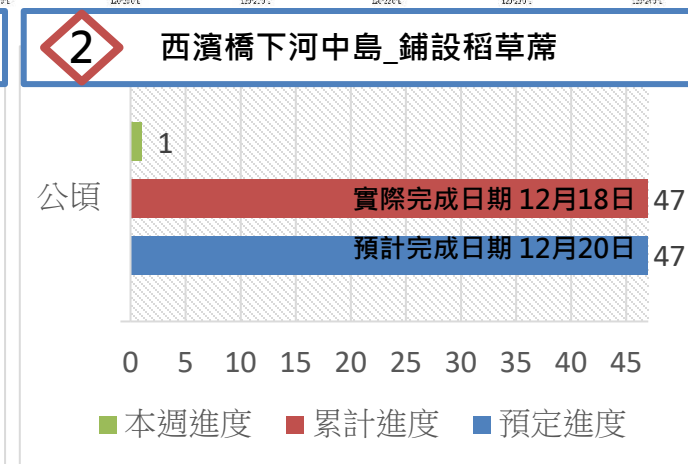
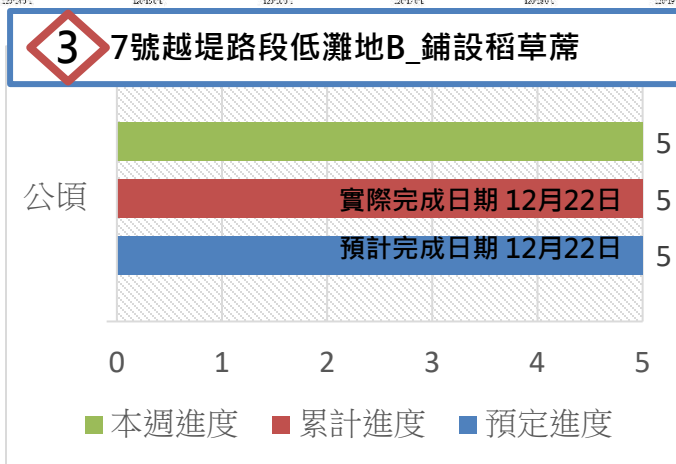


揚塵防治 週報表

112/12/18~112/12/24

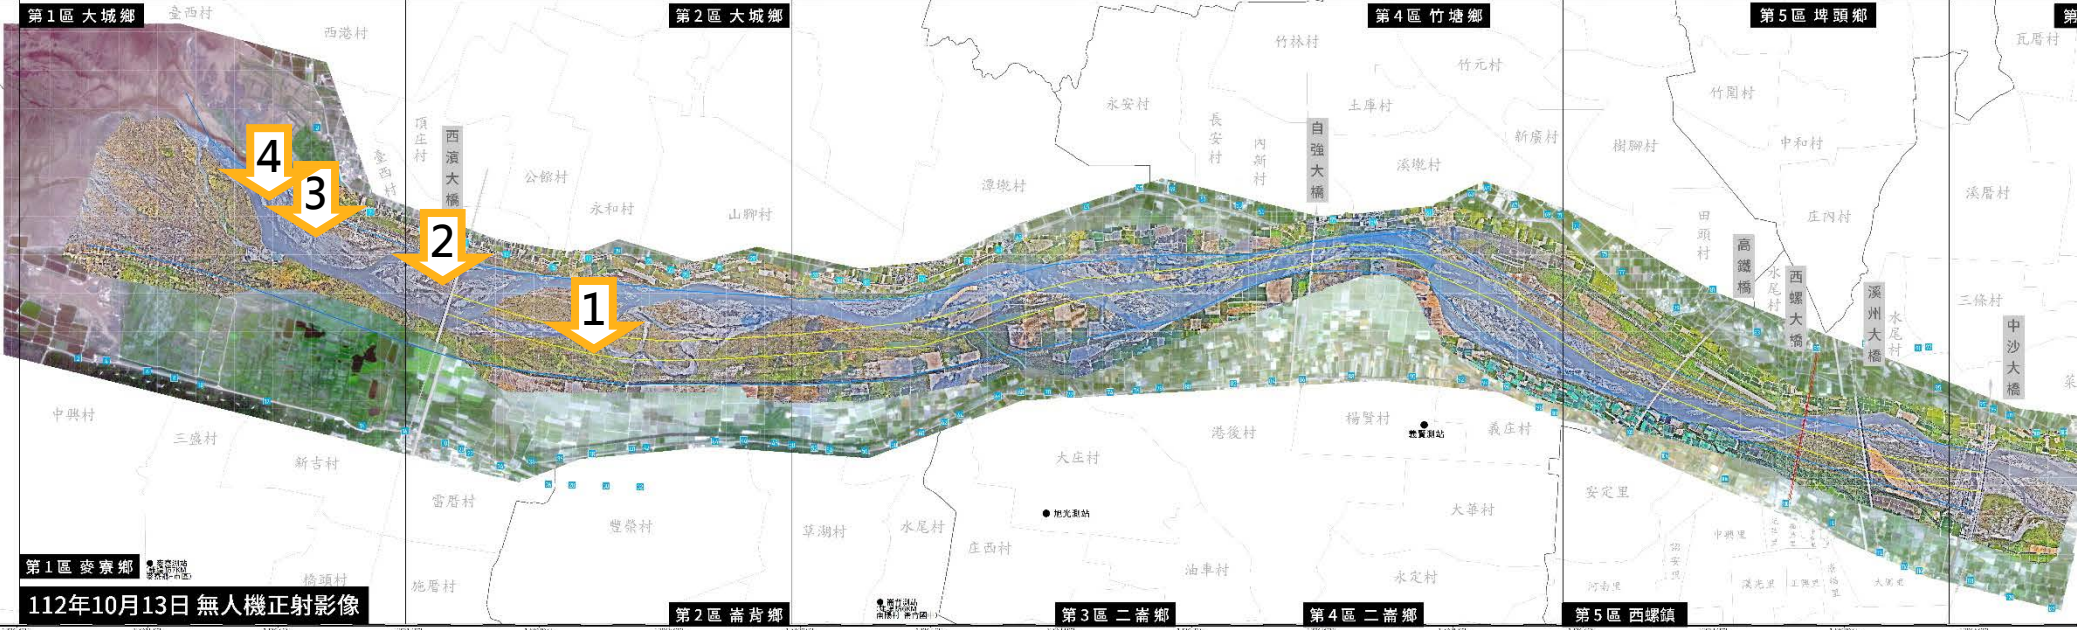

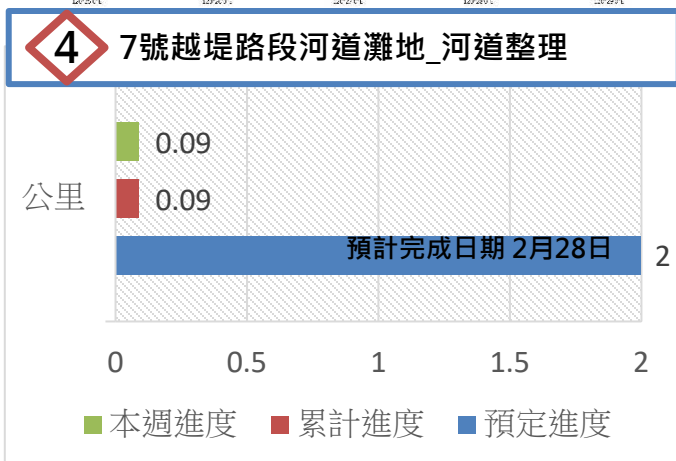

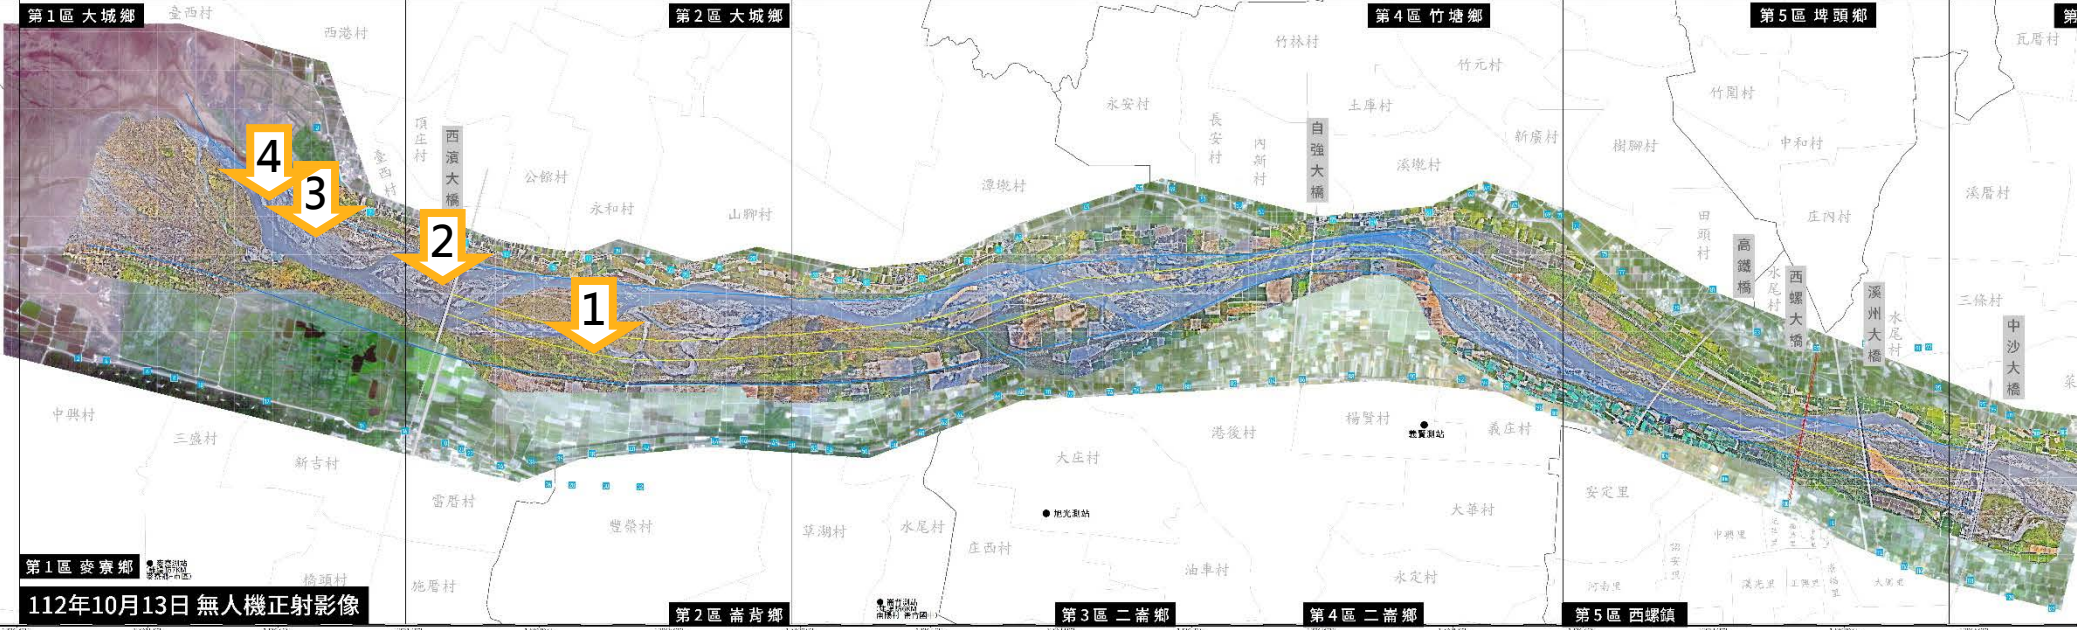

各區 空拍現況


第一區

西濱大橋下游



第二區

40號越堤段 下游

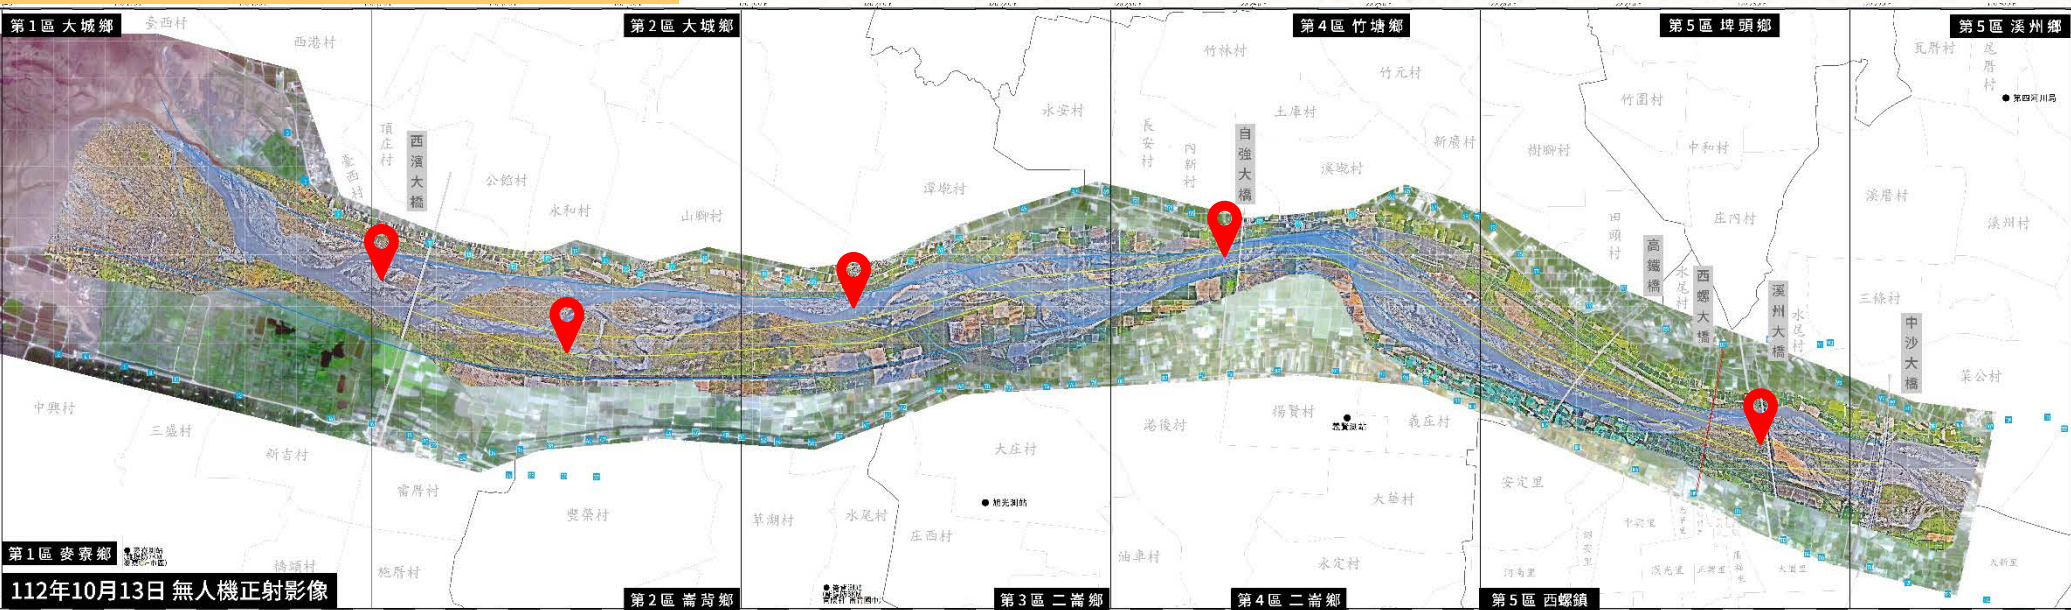

第三區

大義崙排水 下游



第四區

自強大橋 下游



第五區

溪州大橋 上下游



112年度

揚塵KPI進度管制

執行期程:112年5月至113年4月

- 抑制面積
- 進度



其他覆蓋

- 目標值 : 450 公頃
- 已完成 : 260 公頃
- 達成率 : 57.8 %



水覆蓋

- 目標值 : 400 公頃
- 已完成 : 310 公頃
- 達成率 : 77.5 %



河道整理

- 目標值 : 2.5 公里
- 已完成 : 2.23 公里
- 達成率 : 89.2 %



防洪植栽

- 目標值 : 6 公里
- 已完成 : 4.45 公里
- 達成率 : 74.2 %



綠覆蓋

- 目標值 : 50 公頃
- 已完成 : 292公頃
- 達成率 : 584 %



營造複式斷面規劃圖

複式斷面	年度	107-109	110	111	112	合計
	KPI(公里)	8	2	6	4	20
	實際完成	8	2.13	6.05	2.45	18.63



112年營造複式斷面進度管控

KPI / 4公里

已完成 / 2.45 km


達成率/ 61 %

執行進度說明：

- 1、自強大橋下游南岸已於112年7月12日完成1.2公里複式斷面。
- 2、高鐵橋上游北岸已於10月31日完成完成1.25公里複式斷面。
- 3、高鐵橋下游北岸(規劃1.6公里)，已於112年11月30日完成培厚作業，後續造林部分規劃於12月底完成。

水防道路植栽規劃圖

水防道路植栽	年度	110	111	112	113	114	115	合計
	KPI(公里)	1	2	2	2	2	2	11
	實際完成	1	2.3	2	-	-	-	5.3

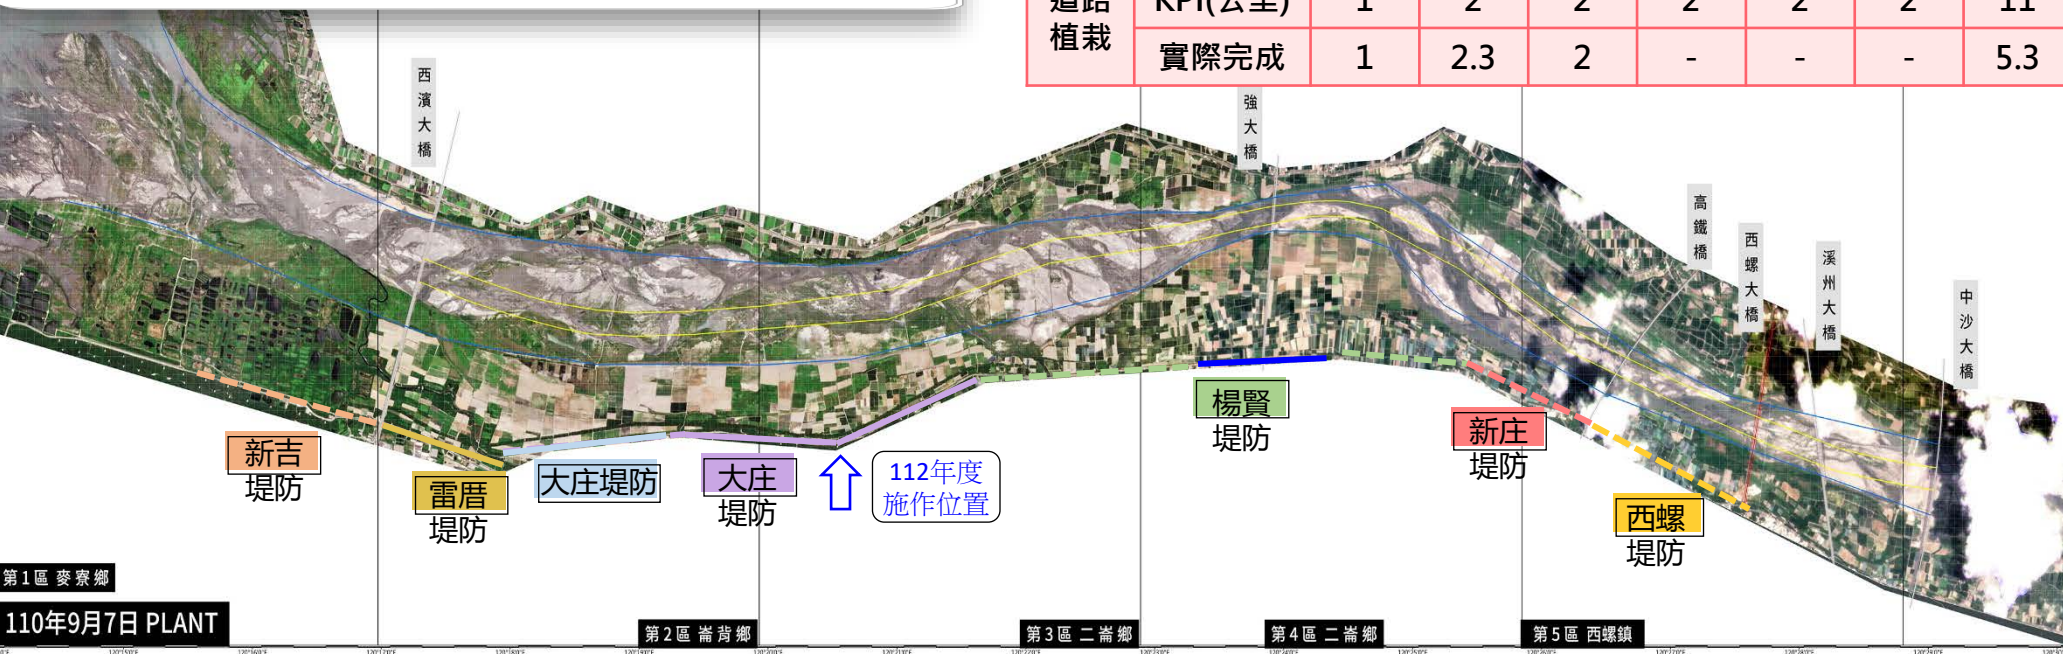

• 112年水防道路植栽進度管控

KPI / 2公里

已完成 / 2公里

達成率/ 100 %

➤ 執行進度說明：

- 1、大庄堤防規劃施作0.5公里，已於112年8月25日完成。
- 2、大庄堤防42至54號越堤段規劃1.5公里，已於112年9月20日完成。



