

附表十二

九十年年度河堤工程執行情形表

90年01月 日填表

編號	局別	工程名稱	經費 (千元)	(A) 完成測設日期 (完成初稿審查)	(B) 完成預算書編 製日期	(C) 上網公告發包 日期	(D) 完成決標日期	備註
1	一河局	羅東溪四方林堤防(二工區)工程	28,000	89.12.15 V				
2	一河局	羅東溪柯子林堤防水防道路工程	14,500	—	—	—	—	用地取得
3	一河局	小礁溪匏崙堤防工程	78,000	V				預定測設完成日期：90年01月15日 預定預算書編製完成：90年03月15日
4	一河局	宜蘭河新生護岸及公館堤防工程	200,000	—	—	—	—	用地取得
5	一河局	羅東溪淋漓堤防工程	20,000	89.11.30				
		小計	340,500					
6	二河局	頭前溪低水治理(竹林橋段)工程	75,000	—	—	—	—	用地取得
7	二河局	鳳山溪舊港堤防整建工程	40,000	89.09.30				設計原則送審,依水利處12月3日 現勘意見修正設計中
8	二河局	油羅溪義興堤防工程	50,000	V				
9	二河局	油羅溪尖石固床工工程	25,000	V				
10	二河局	東河溪東河護岸延長工程	10,000	89.09.18				
11	二河局	中港溪談文湖低水護岸工程	7,500					陳報水利處委外辦理核示中,委託 造橋鄉公所辦理

附註：1.(A)欄(含初稿送審)--90年1月31日前完成 (B)欄--90年2月15日前完成 (C)欄--90年3月1日前完成 (D)欄--90年3月31日前完成
2."V"表示該項正進行中

附表十二

九十年年度河堤工程執行情形表

90年01月 日填表

編號	局別	工程名稱	經費 (千元)	(A) 完成測設日期 (完成初稿審查)	(B) 完成預算書編 製日期	(C) 上網公告發包 日期	(D) 完成決標日期	備註
12	二河局	南港溪護岸工程	25,000					俟苗栗縣府做護岸完成後始能辦理後續水防道路等之工程測設
13	二河局	淡文湖堤防延長工程	65,000	V				
14	二河局	頭前溪中正橋下游固床工工程	20,500	V				
15	二河局	後龍溪七十份堤防(三工區)工程	20,000	89.11.30				
		小計	338,000					
16	三河局	大甲溪土牛堤防工程	52,000	V				
17	三河局	大甲溪豐洲堤防工程	50,000	V				
18	三河局	烏溪和美堤防工程	30,000	—	—	—	—	用地取得
19	三河局	大安溪內灣堤防工程	57,700	V				
20	三河局	烏溪土城堤防工程	20,000	V				
21	三河局	烏溪乾峰一號橋固床工工程	20,000	V				
22	三河局	北港溪清流橋固床工工程	4,000	89.12.28	V			

附註：1.(A)欄(含初稿送審)--90年1月31日前完成 (B)欄--90年2月15日前完成 (C)欄--90年3月1日前完成 (D)欄--90年3月31日前完成
 2."V"表示該項正進行中

附表十二

九十年度河堤工程執行情形表

90年01月 日填表

編號	局別	工程名稱	經費 (千元)	(A) 完成測設日期 (完成初稿審查)	(B) 完成預算書編 製日期	(C) 上網公告發包 日期	(D) 完成決標日期	備註
23	三河局	北港溪長春橋、長安橋、港門橋 固床工工程	10,000	V				
24	三河局	樟平溪上坑護岸工程	17,300	V				
25	三河局	貓羅溪振興堤防工程	4,000	V				
		小計	265,000					
26	四河局	濁水溪社子堤防	20,000	89.12.05	V			
27	四河局	東埔蚋溪東埔蚋一號堤防工程(用 地費)	12,000	—	—	—	—	用地取得
28	四河局	濁水溪濁水低水護岸(二期)工程 (香圓腳堤防)	110,000	89.12.05	V			
29	四河局	陳有蘭溪郡坑段低水護岸工程	20,000	89.11.30	V			
30	四河局	濁水溪潮洋厝堤防延長工程	35,000	89.12.05	V			
31	四河局	濁水溪濁水堤防工程	53,000	89.12.05	V			
32	四河局	郡坑溪郡坑堤防工程	48,000	89.11.20	V			
33	四河局	陳有蘭溪新山護岸工程	30,000	89.11.30	V			

附註：1.(A)欄(含初稿送審)--90年1月31日前完成 (B)欄--90年2月15日前完成 (C)欄--90年3月1日前完成 (D)欄--90年3月31日前完成
 2."V"表示該項正進行中

附表十二

九十年度河堤工程執行情形表

90年01月 日填表

編號	局別	工程名稱	經費 (千元)	(A) 完成測設日期 (完成初稿審查)	(B) 完成預算書編 製日期	(C) 上網公告發包 日期	(D) 完成決標日期	備註
34	四河局	濁水溪九塊厝堤防低水護岸修復工程	10,000	89.11.30	V			
35	四河局	濁水溪興隆二號堤防工程	20,000	89.12.05	V			
		小計	358,000					
36	五河局	朴子溪更寮堤防(二期)工程	110,000	89.12.18 89.12.22				
37	五河局	大湖口溪新崙埤頭堤防工程	60,000	89.12.20 V				
38	五河局	大湖口溪五間厝豐田堤防工程	25,000	V				
39	五河局	赤蘭溪公館堤防(二期)工程	50,000	V				
40	五河局	北港溪大東堤防工程	40,000	V				
41	五河局	北港溪北港一號堤防工程	70,000	V				
42	五河局	龜重溪南溪堤防工程	70,000	89.12.26 V				
43	五河局	急水溪宅港堤防工程	20,000	89.12.15 89.12.17	V			
44	五河局	北港溪崙子堤防工程	40,000	89.12.10	V			

附註：1.(A)欄(含初稿送審)--90年1月31日前完成 (B)欄--90年2月15日前完成 (C)欄--90年3月1日前完成 (D)欄--90年3月31日前完成
 2."V"表示該項正進行中

附表十二

九十年度河堤工程執行情形表

90年01月 日填表

編號	局別	工程名稱	經費 (千元)	(A) 完成測設日期 (完成初稿審查)	(B) 完成預算書編 製日期	(C) 上網公告發包 日期	(D) 完成決標日期	備註
45	五河局	八掌溪義興堤防(下游段)工程	30,000	V				
46	五河局	八掌溪吳鳳堤防(上游段)加高加強工程	30,000	89.12.10 89.12.15				
47	五河局	三疊溪柳構下埤頭堤防工程	60,000	V				
48	五河局	石隴溪中埔七號護岸工程	12,000	V				
49	五河局	急水溪西勢堤防工程	93,000	V				預定測設完成日期：90年01月25日 預定預算書編製完成：90年02月20日
50	五河局	朴子溪東石海埔地堤防工程	30,000	89.12.20				
51	五河局	虎尾溪大美鎮北堤防工程	60,000	V				預定測設完成日期：90年01月30日 預定預算書編製完成：90年02月20日
		小計	800,000					
52	六河局	鹽水溪新灣橋至斷面六十六兩岸堤防工程	45,000	—	—	—	—	用地取得
53	六河局	官田溪低水治理護岸工程	45,000	89.10.30	V			
54	六河局	曾文溪台南市南興至學東段堤防工程	35,000	89.10.30	V			
55	六河局	曾文溪善化堤防工程	50,000	89.11.16	V			

附註：1.(A)欄(含初稿送審)--90年1月31日前完成 (B)欄--90年2月15日前完成 (C)欄--90年3月1日前完成 (D)欄--90年3月31日前完成
 2."V"表示該項正進行中

附表十二

九十年度河堤工程執行情形表

90年01月 日填表

編號	局別	工程名稱	經費 (千元)	(A) 完成測設日期 (完成初稿審查)	(B) 完成預算書編 製日期	(C) 上網公告發包 日期	(D) 完成決標日期	備註
56	六河局	西港大橋上下游低水治理及高灘地美化工程	90,000	V				
57	六河局	曾文溪寮癘堤防工程	55,000	89.12.16				
58	六河局	後旦溪竹圍段護岸工程	6,000	89.10.30 V				
59	六河局	鹽水溪北安橋至太平橋低水治理工程	25,000	V				
60	六河局	阿公店溪岡山堤防工程	10,000	89.11.15	V			
61	六河局	曾文溪蘇厝堤防工程	50,000	89.12.15				
62	六河局	曾文溪山上堤防工程	52,500	89.11.04	V			
63	六河局	二仁溪中路橋上游段疏浚工程	85,000	89.12.31 V				
64	六河局	二仁溪堤防加高加強工程 (河床整治0K~1K)	15,000	89.10.05 89.10.20	89.11.14			
		小計	563,500					
65	七河局	旗山溪三協里護岸工程	17,000	—	—	—	—	用地取得
66	七河局	美濃溪廣林護岸工程	6,300	—	—	—	—	用地取得

附註：1.(A)欄(含初稿送審)--90年1月31日前完成 (B)欄--90年2月15日前完成 (C)欄--90年3月1日前完成 (D)欄--90年3月31日前完成
 2."V"表示該項正進行中

附表十二

九十年年度河堤工程執行情形表

90年01月 日填表

編號	局別	工程名稱	經費 (千元)	(A) 完成測設日期 (完成初稿審查)	(B) 完成預算書編 製日期	(C) 上網公告發包 日期	(D) 完成決標日期	備註
67	七河局	高屏溪左岸(鐵路橋下)低水護岸 (二期)工程	49,000	89.11.13 V				
68	七河局	四重溪山腳堤防工程	57,000	89.12.18 90.01.02	V			
69	七河局	四重溪車城堤防工程	77,000	90.01.02 90.01.02	V			
70	七河局	四重溪二重溪護岸工程	34,000	89.10.15 90.01.06	V			
71	七河局	東港溪崁頂堤防(一工區)工程	120,000	89.10.15 89.10.15	V			
72	七河局	東港溪和興村護岸工程	13,000	89.12.30 89.12.30	V			
73	七河局	東港溪萬巒大橋上游段疏濬工程	50,000	89.12.27 V				
74	七河局	高屏溪高屏大橋下游固床工	120,000	V				
75	七河局	高屏溪高屏大橋右岸低水護岸(一 期)工程	49,000	89.12.28 89.12.30	V			預定測設完成日期： 90年01月27日 預定預算書編製完成：90年02月22日
76	七河局	隘寮北溪伊拉社保護工程	10,000	89.11.13 89.11.27	V			
77	七河局	東港溪成德橋至龍東橋右岸護岸 (一期)工程	25,000	89.12.30 89.12.30	V			
78	七河局	東港溪涼山二.四號堤防工程	12,000	V				

附註：1.(A)欄(含初稿送審)--90年1月31日前完成 (B)欄--90年2月15日前完成 (C)欄--90年3月1日前完成 (D)欄--90年3月31日前完成
 2."V"表示該項正進行中

附表十二

九十年年度河堤工程執行情形表

90年01月 日填表

編號	局別	工程名稱	經費 (千元)	(A) 完成測設日期 (完成初稿審查)	(B) 完成預算書編 製日期	(C) 上網公告發包 日期	(D) 完成決標日期	備註
79	七河局	東港溪崁頂堤防(二工區)工程	80,000	—	—	—	—	用地取得
80	七河局	隘寮溪里港堤防高灘地綠美化工程	25,000	V				
81	七河局	旗山溪甲仙大橋下游高灘地親水公園低水護岸工程	20,000	89.12.27 89.12.30	V			
82	七河局	高屏溪新園堤防加高加強工程	20,000	89.12.16 89.12.30	V			
83	七河局	荖濃溪六龜鄉和平巷保護工程	3,000	89.12.27 89.12.30	V			
84	七河局	旗山溪旗山鎮東平里保護工程	9,000	V				
85	七河局	旗山溪南河護岸下游延長工程	10,000	89.12.30 89.12.30	V			
86	七河局	荖濃溪右岸二坡護岸上游段保護工程	6,000	89.12.11 89.12.18	V			
87	七河局	高屏溪里嶺大橋下游低水護岸排水出口橋樑工程	2,000	89.11.30 89.12.08	V			
		小計	814,300					
88	八河局	卑南溪初來低水護岸工程	29,000	V				
89	八河局	鹿野溪和平堤防延長工程	21,000	V				

附註：1.(A)欄(含初稿送審)--90年1月31日前完成 (B)欄--90年2月15日前完成 (C)欄--90年3月1日前完成 (D)欄--90年3月31日前完成
 2."V"表示該項正進行中

附表十二

九十年年度河堤工程執行情形表

90年01月 日填表

編號	局別	工程名稱	經費 (千元)	(A) 完成測設日期 (完成初稿審查)	(B) 完成預算書編 製日期	(C) 上網公告發包 日期	(D) 完成決標日期	備註
90	八河局	鹿野溪和平低水護岸工程	24,000	V				
91	八河局	卑南溪電光一號護岸工程	28,000	V				
92	八河局	卑南溪電光二號護岸工程	26,000	V				
93	八河局	鹿野溪稻葉護岸整建工程	25,000	V				
94	八河局	卑南溪新興堤防工程	23,000	V				
95	八河局	卑南溪關山堤防延長工程	9,000	89.12.08 89.12.12	89.11.30			
96	八河局	卑南溪池上堤防加強	20,000	V				
97	八河局	卑南溪卑南低水護岸	15,000	V				
98	八河局	卑南溪石山低水護岸工程	18,000	V				
99	八河局	卑南溪月眉堤防工程	12,000	V				
100	八河局	卑南溪卑南堤防工程	20,000	V				
		小計	270,000					

附註：1.(A)欄(含初稿送審)--90年1月31日前完成 (B)欄--90年2月15日前完成 (C)欄--90年3月1日前完成 (D)欄--90年3月31日前完成
 2."V"表示該項正進行中

附表十二

九十年度河堤工程執行情形表

90年01月 日填表

編號	局別	工程名稱	經費 (千元)	(A) 完成測設日期 (完成初稿審查)	(B) 完成預算書編 製日期	(C) 上網公告發包 日期	(D) 完成決標日期	備註
101	九河局	樂樂溪源城堤防工程	30,000	89.12.15 89.12.20				
102	九河局	壽豐溪溪口堤防工程	25,000	89.12.20				
103	九河局	花蓮溪平林護岸工程	30,000	V				
104	九河局	花蓮溪壽豐堤防工程	25,000	V				
105	九河局	馬鞍溪大馬堤防工程	25,000	89.12.20				
106	九河局	紅葉溪瑞美村堤防工程	40,000	89.12.20 V				
107	九河局	卓溪左右岸堤防工程	25,000	89.12.20 V				
108	九河局	鯨溪石平五號堤防工程	15,000	89.12.20 V				
109	九河局	北清水溪大忠三號堤防工程	28,000	89.12.20 V				
110	九河局	富源溪瑞美堤防工程	25,000	V				
111	九河局	南清水溪左岸堤防工程	18,000	89.12.20				
112	九河局	阿眉溪一、二號堤防工程	15,000	V				

附註：1.(A)欄(含初稿送審)--90年1月31日前完成 (B)欄--90年2月15日前完成 (C)欄--90年3月1日前完成 (D)欄--90年3月31日前完成
 2."V"表示該項正進行中

附表十二

九十年度河堤工程執行情形表

90年01月 日填表

編號	局別	工程名稱	經費 (千元)	(A) 完成測設日期 (完成初稿審查)	(B) 完成預算書編 製日期	(C) 上網公告發包 日期	(D) 完成決標日期	備註
113	九河局	秀姑巒溪高寮堤防工程	20,000	V				
114	九河局	樂樂溪客城堤防工程	29,000	89.12.20				
		小計	350,000					
115	十河局	景美溪中正橋至萬福橋護岸(下游段)工程用地費	50,000	—	—	—	—	用地取得
116	十河局	景美溪埔新溪匯合口護岸工程用地費	10,000	—	—	—	—	用地取得
117	十河局	大漢溪三鶯橋下游南靖堤防應急工程用地費	10,000	—	—	—	—	用地取得
118	十河局	三峽河長福橋上游左岸堤防工程用地費	70,000	—	—	—	—	用地取得
119	十河局	基隆河橋東護岸(水尾灣段)工程	20,000	89.12.05	V			
120	十河局	新店溪碧潭橋至安坑橋左岸護岸工程	36,000	89.12.20				
121	十河局	新店溪碧潭橋至安坑橋右岸護岸工程	44,000	89.12.20				
122	十河局	基隆河瑞芳國中護岸工程	60,000	89.12.06	V			
123	十河局	基隆河大華橋至崇智橋右岸堤防工程	140,000	89.11.30	V			

附註：1.(A)欄(含初稿送審)--90年1月31日前完成 (B)欄--90年2月15日前完成 (C)欄--90年3月1日前完成 (D)欄--90年3月31日前完成
 2."V"表示該項正進行中

附表十二

九十年 度 河 堤 工 程 執 行 情 形 表

90年01月 日填表

編號	局 別	工 程 名 稱	經 費 (千 元)	(A) 完成測設日期 (完成初稿審查)	(B) 完成預算書編 製 日 期	(C) 上網公告發包 日 期	(D) 完成決標日期	備 註
124	十河局	大漢溪鶯歌堤防延長工程	60,000	—	—	—	—	用地取得
		小 計	500,000					
		總 計	4,599,300					

附註：1.(A)欄(含初稿送審)--90年1月31日前完成 (B)欄--90年2月15日前完成 (C)欄--90年3月1日前完成 (D)欄--90年3月31日前完成
 2."V"表示該項正進行中

附表十二之一

九十年度海堤工程執行情形表

90年01月 日填表

編號	局別	工程名稱	經費 (千元)	(A) 完成測設日期 (完成初稿審查)	(B) 完成預算書編 製日期	(C) 上網公告發包 日期	(D) 完成決標日期	備註
1	一河局	大溪海岸保護工程	4,000	89.11.30 89.12.06				
2	一河局	更新海岸(南岸)保護工程	7,000	89.12.15 V				
3	一河局	大坑海岸保護工程	9,000	89.12.02 89.12.05				
4	一河局	粉鳥林海岸保護工程	9,000	89.11.30 89.12.27				
5	一河局	瑞濱海岸保護工程	6,000	89.12.11 89.12.20				
6	一河局	石門海岸保護工程	3,000	89.11.15 89.11.19				
7	一河局	草里海岸保護工程	6,000	89.12.15 89.12.21				
8	一河局	深澳海岸保護工程	17,000	89.12.01 89.12.11				
		小計	61,000					
9	二河局	桃園縣內海海堤工程	25,000	89.10.31 V				
10	二河局	桃園縣沙崙海堤工程	15,000	89.09.08 V				
11	二河局	桃園縣沙崙防潮堤工程	12,000	89.09.08 V				

附註：1.(A)欄(含初稿送審)--90年1月31日前完成 (B)欄--90年2月15日前完成 (C)欄--90年3月1日前完成 (D)欄--90年3月31日前完成
 2.此列表示該項工程進行中

附表十二之一

九十年度海堤工程執行情形表

90年01月 日填表

編號	局別	工程名稱	經費 (千元)	(A) 完成測設日期 (完成初稿審查)	(B) 完成預算書編 製日期	(C) 上網公告發包 日期	(D) 完成決標日期	備註
12	二河局	苗栗縣通霄海岸保護工程	28,000	89.09.20 V				
13	二河局	過港海岸保護工程	24,000	89.10.15 V				
14	二河局	灣瓦海岸保護工程	20,000	89.11.30 V				
15	二河局	苗栗縣房裡海堤工程	18,000	89.11.30 V				
16	二河局	苗栗縣淡文湖二號防潮堤工程	20,000	89.11.30 V				
17	二河局	新竹市港南海堤工程	8,000	89.11.30 V				
		小計	170,000					
18	三河局	頂安海堤工程	19,000	—	—	—	—	用地取得
19	三河局	高美二號海堤工程	25,000	V				
		小計	44,000					
20	四河局	漢寶南段海堤整建工程	12,000	89.11.20	V			
21	四河局	大城北段海堤工程	18,000	89.11.30	V			

附註：1.(A)欄(含初稿送審)--90年1月31日前完成 (B)欄--90年2月15日前完成 (C)欄--90年3月1日前完成 (D)欄--90年3月31日前完成
 2.藍色表示該項工程進行中

附表十二之一

九十年度海堤工程執行情形表

90年01月 日填表

編號	局別	工程名稱	經費 (千元)	(A) 完成測設日期 (完成初稿審查)	(B) 完成預算書編 製日期	(C) 上網公告發包 日期	(D) 完成決標日期	備註
22	四河局	彰化縣王功海埔地海堤	12,000	89.12.05	89.12.25			
		小計	42,000					
23	六河局	三光海堤	4,000	89.10.30 89.12.16	89.12.21			
24	六河局	青草崙海堤工程	25,000	89.11.30	V			
25	六河局	七股海岸(離岸堤)工程	25,000	89.10.30	V			
26	六河局	七股海堤水防道路工程	7,500	89.11.14 V				
27	六河局	曾文海埔地海堤(西堤)工程	25,000	89.10.30 V				
		小計	86,500					
28	七河局	大庄離岸堤新建工程	45,000	89.12.14 89.12.21	V			
29	七河局	赤馬海堤新建工程	25,000	89.11.27 89.12.04	V			
30	七河局	大庄導流堤整建工程	8,000	89.12.08 89.12.16	V			
31	七河局	鎮海海岸保護工程	20,000	V				

附註：1.(A)欄(含初稿送審)--90年1月31日前完成 (B)欄--90年2月15日前完成 (C)欄--90年3月1日前完成 (D)欄--90年3月31日前完成
2.凡列表示該項正進行中

附表十二之一

九十年度海堤工程執行情形表

90年01月 日填表

編號	局別	工程名稱	經費 (千元)	(A) 完成測設日期 (完成初稿審查)	(B) 完成預算書編 製日期	(C) 上網公告發包 日期	(D) 完成決標日期	備註
32	七河局	小門村海岸養護工程	6,000	89.12.08 89.12.29	V			
33	七河局	東石海堤延長工程	5,000	89.12.29 89.12.30	V			
34	七河局	加祿村海岸保護工程	9,000	89.12.14 89.12.30	V			
35	七河局	青螺村金水沙灘海堤新建工程	12,000	89.12.28 89.12.30	V			
36	七河局	水利村海堤養護工程	3,000	89.11.24 89.12.13	V			
37	七河局	通樑海堤工程	8,000	89.12.18 89.12.21	V			
38	七河局	七美海堤水防道路工程	3,000	89.12.27 89.12.30	V			
39	七河局	鳥嶼海堤養護工程	5,000	V				
40	七河局	保生村南側保護工程	9,000	89.12.12 89.12.19	V			
41	七河局	七美 鯉港海岸保護工程	12,000	V				
42	七河局	馬公市菜園海堤新建工程	4,500	89.12.12 89.12.21	V			
43	七河局	東衛海堤新建工程	8,000	89.12.27 89.12.30	V			

附註：1.(A)欄(含初稿送審)--90年1月31日前完成 (B)欄--90年2月15日前完成 (C)欄--90年3月1日前完成 (D)欄--90年3月31日前完成
 2.此列表示該項工程進行中

附表十二之一

九十年度海堤工程執行情形表

90年01月 日填表

編號	局別	工程名稱	經費 (千元)	(A) 完成測設日期 (完成初稿審查)	(B) 完成預算書編 製日期	(C) 上網公告發包 日期	(D) 完成決標日期	備註
44	七河局	風櫃海堤養護工程	3,000	89.11.29 89.12.02	V			
		小計	185,500					
45	八河局	台東海堤延長工程	60,000	V				
46	八河局	南竹湖海岸保護工程	20,000	89.11.15 89.11.17	V			
47	八河局	大俱來海岸保護工程	18,000	89.11.29 89.12.04	V			
48	八河局	機場墓地保護工程	15,000	V				
49	八河局	崎腳海岸保護工延長工程	12,000	89.11.20 89.11.22	V			
50	八河局	富崗海岸保護工程	5,000	89.12.08 89.12.12	V			
		小計	130,000					
51	九河局	化仁海堤(潛堤)工程	50,000	89.12.25				
		小計	50,000					
		總計	769,000					

附註：1.(A)欄(含初稿送審)--90年1月31日前完成 (B)欄--90年2月15日前完成 (C)欄--90年3月1日前完成 (D)欄--90年3月31日前完成
 2.藍色表示該項正進行中

附表十二之一

九十年度海堤工程執行情形表

90年01月 日填表

編號	局別	工程名稱	經費 (千元)	(A) 完成測設日期 (完成初稿審查)	(B) 完成預算書編 製日期	(C) 上網公告發包 日期	(D) 完成決標日期	備註

附註：1.(A)欄(含初稿送審)--90年1月31日前完成 (B)欄--90年2月15日前完成 (C)欄--90年3月1日前完成 (D)欄--90年3月31日前完成
 2.此列表示該項工程進行中

附表十四 九十年 度 區 域 排 水 改 善

編號	局 別	工 程 名 稱	經 費 (千元)	(A)完成測設日期 (完成初稿審查)	(B)完成預算書 編 製 日 期
1	第十河川局	塔寮坑溪開南橋段護岸工程	6,000		V
2	第十河川局	塔寮坑溪全真道院段護岸工程	12,000		V
3	第十河川局	塔寮坑溪福慧橋段護岸工程用地徵收及違建拆除費	20,000		
4	第十河川局	塔寮坑溪全真道院段護岸工程用地徵收	6,000		
小 計			44,000		
5	第二河川局	塔寮坑溪西盛溝及潭底溝出口閘門工程	60,000	V	
6	第二河川局	福興溪羊寮段治理工程	70,000		V
7	第二河川局	福興溪深坑段治理工程用地徵收	65,000		
8	第二河川局	鹽港溪中隘段(第二期)治理工程用地徵收	28,000		
9	第二河川局	鹽港溪南隘段治理工程用地徵收	27,000		
10	第二河川局	客雅溪排水改善第四期用地費	70,000		
小 計			320,000		
11	第三河川局	隘寮溪排水改善工程	20,000	V	

備註：(A)--欄90年1月31日前完成 (B)--欄90年2月15日前完成 (A)--欄90年3

12	第四河川局	濁水排水改善工程用地先期作業費	2,000		
13	第五河川局	興安排水改善工程(第二期)	70,000	V	
14	第六河川局	三爺溪排水改善工程(第七期)	20,000	V	
15	第六河川局	溪南寮排水改善工程	22,000	V	
16	第六河川局	後勁溪(德惠橋至縣市界段)河堤整建工程	50,000		V

17	第六河川局	柴頭港溪整治工程(第一期)	150,000	V	
18	第六河川局	後勁溪(德惠橋至縣市界段)河堤整建工程用地費	120,000		
小計			362,000		
19	第七河川局	外六寮排水改善工程第七期	12,000	V	
20	第七河川局	外六寮排水改善工程第七期用地徵收	40,000		
小計			52,000		
總計			870,000		

備註：(A)--欄90年1月31日前完成 (B)--欄90年2月15日前完成 (A)--欄90年3月1

工程計畫執行情形表

90年1月10日填表

(C)上網公告 發包日期	(D)完成決標 日期	備註
		用地取得
		用地取得
		用地取得
		用地取得
		用地取得
		用地取得
		預定測設完成日期： 90年02月28日 預定預算書編製完成： 90年03月15日

3月1日前完成 (A)--欄90年3月31日前完成

		用地取得先期作業
		預定測設完成日期： 90年04月30日 預定預算書編製完成： 90年05月31日
		預定測設完成日期： 90年02月28日 預定預算書編製完成： 90年04月15日

		預定測設完成日期： 90年04月30日 預定預算書編製完成： 90年05月31日
		用地取得
		用地取得

日前完成 (A)--欄90年3月31日前完成

水利統計簡訊

STA. 53

經濟部水利處會計室


90年1月19日 星期五

90年度計畫辦理河堤工程124件，海堤工程51件，合計175件，其中包含用地取得15件（河堤14件及海堤1件）；河海堤工程均以第七河川局辦理23、17件及經費814.3百萬元、185.5百萬元為最高。90年度計畫辦理區域排水改善工程20件，其中包含用地取得9件；區域排水工程以第二河川局辦理6件最多，經費則以第六河川局362百萬元為最高。

九十年河海堤、區域排水計畫概況

類別 機關別	河堤工程		海堤工程		區排工程	
	件數(件)	經費(千元)	件數(件)	經費(千元)	件數(件)	經費(千元)
總計	124	4,599,300	51	769,000	20	870,000
一河局	5	340,500	8	61,000	-	-
二河局	10	338,000	9	170,000	6	320,000
三河局	10	265,000	2	44,000	1	20,000
四河局	10	358,000	3	42,000	1	2,000
五河局	16	800,000	-	-	1	70,000
六河局	13	563,500	5	86,500	5	362,000
七河局	23	814,300	17	185,500	2	52,000
八河局	13	270,000	6	130,000	-	-
九河局	14	350,000	1	50,000	-	-
十河局	10	500,000	-	-	4	44,000

資料來源：本處河川組

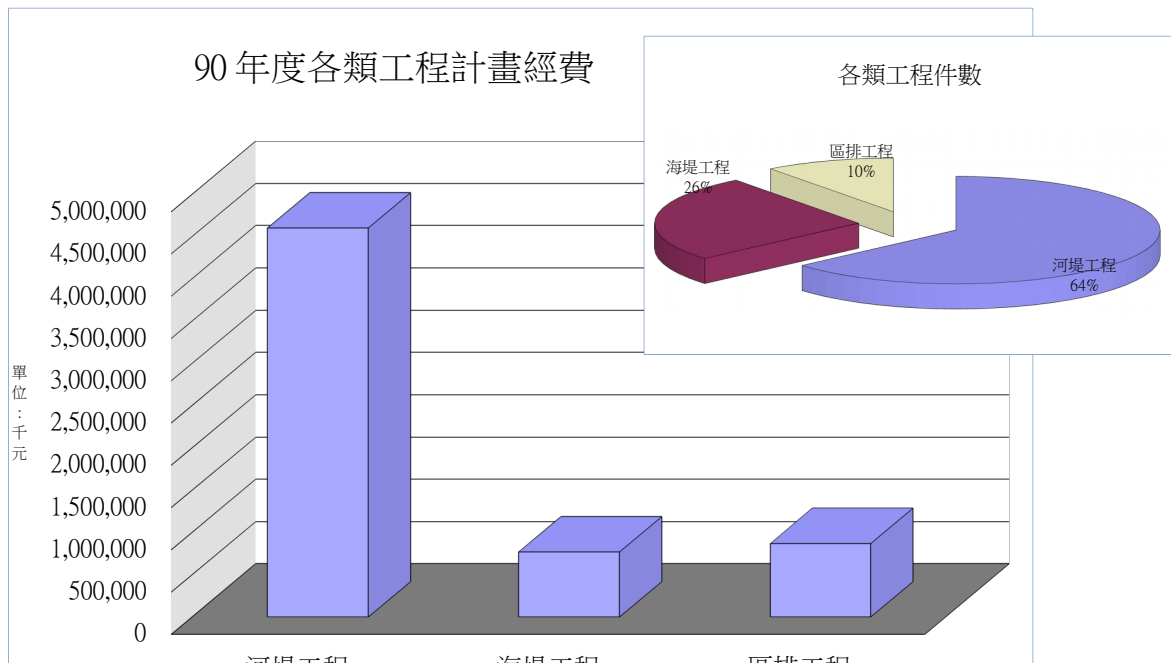

河堤工程

海堤工程
工程類別

圍排工程
