

- 依據營建署 105 年核定之「高雄污水下水道系統第四階段檢討規劃報告」辦理
- 阿公店溪流域中岡山區屬岡山橋頭污水區，102 年開始辦理第一期實施計畫
- 阿蓮區屬未規劃都計區，預計第五階段檢討規劃報告評估納入。



岡山橋頭污水下水道系統

➤ 全期 (102~127 年)

✓ 總處理水量 50,000CMD 、用戶接管戶數 53,274 戶、
總經費約 94.9 億




於營建署 105 年核定之
「高雄污水下水道系統第
四階段檢討規劃報告」
納入燕巢、梓官、彌陀區
一併處理

岡山橋頭污水區開辦 (102~109 年)

- 營建署 102 年「岡山橋頭污水下水道系統第一期實施計畫」


第一期實施計畫 (102~109 年)

收集範圍	434 公頃
污水處理廠	2 萬噸 / 日
污水管線	49.5 公里
用戶接管	13,250 戶
可提升 用戶接管率	約 25%(岡橋區)
總經費	34.86 億元
至 107 年投入經費	23.76 億元

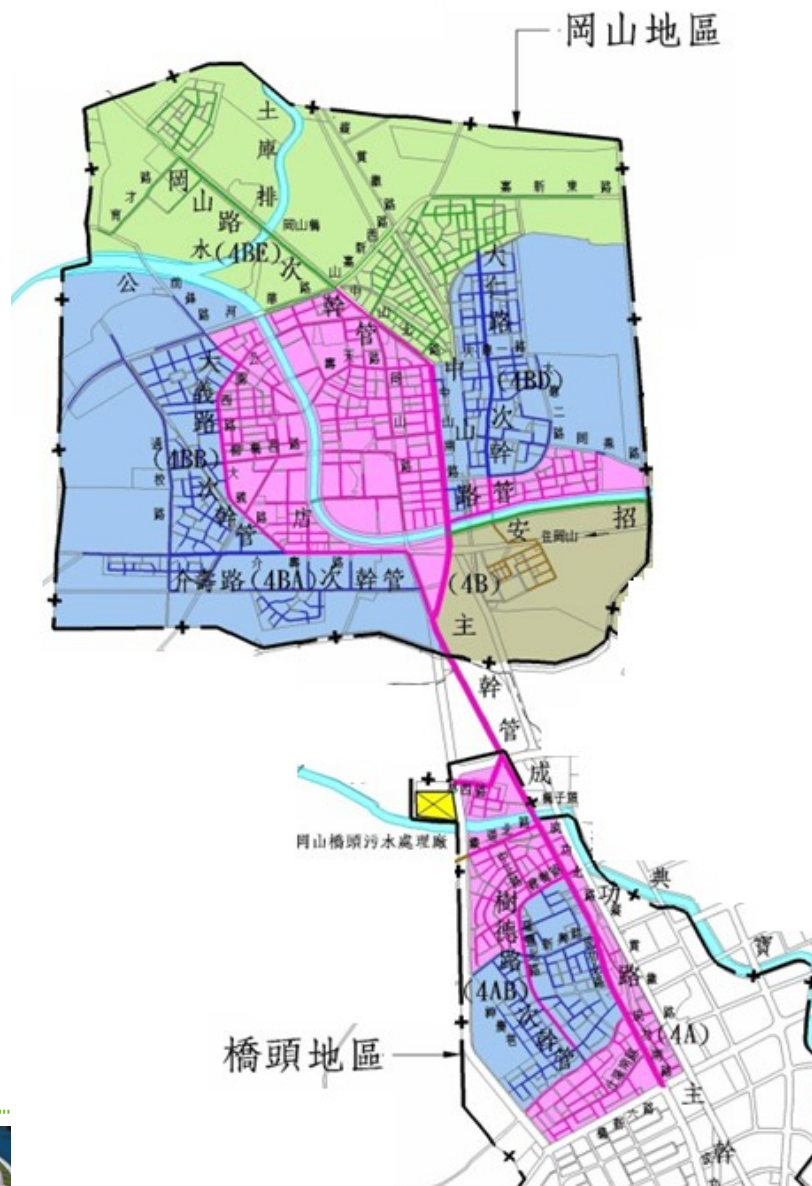

污水管線 - 阿公店溪、典寶溪污染改善 (102~107 年)

	工程名稱
已完工	(岡山區) 第一標工程 (I)
	(岡山區) 第一標工程 (II)
	(橋頭區) 第一標工程 (I)
	(橋頭區) 第一標工程 (II)
施工中	(岡山區) 第一標工程 (III)
	(橋頭區) 第一標工程 (III)
總計	主次幹管及分支管：38.4 公里 約佔第一期管線長度 77.45%
經費	約 9.5 億元 (營建署 8.8 億、本府 0.7 億)

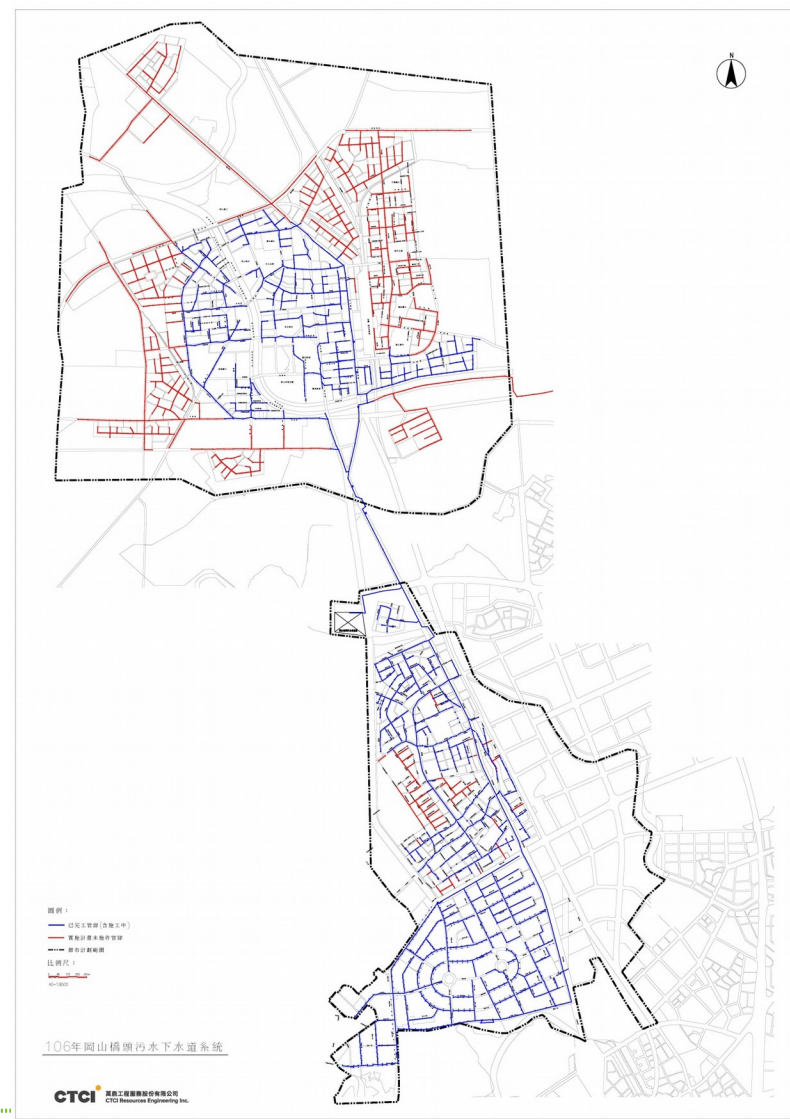

用戶接管 - 阿公店溪、典寶溪污染改善 (107 年

統計至 107 年 9 月底止

岡山第 2-1 標


進度	預定 21.76% 實際 20.18% 預訂完工日 108.6.28
效益	預計接管 3,694 戶 預計施設管線 3,621m

岡山第 2-2 標

進度	預定 2.50% 實際 4.22% 預訂完工日 108.11.4
效益	預計接管 2,291 戶 預計施設管線 2,167m

岡山第 2-3 標

進度	預定 0.95% 實際 1.41% 預訂完工日 108.12.6
效益	預計接管 2,305 戶 預計施設管線 3,222m

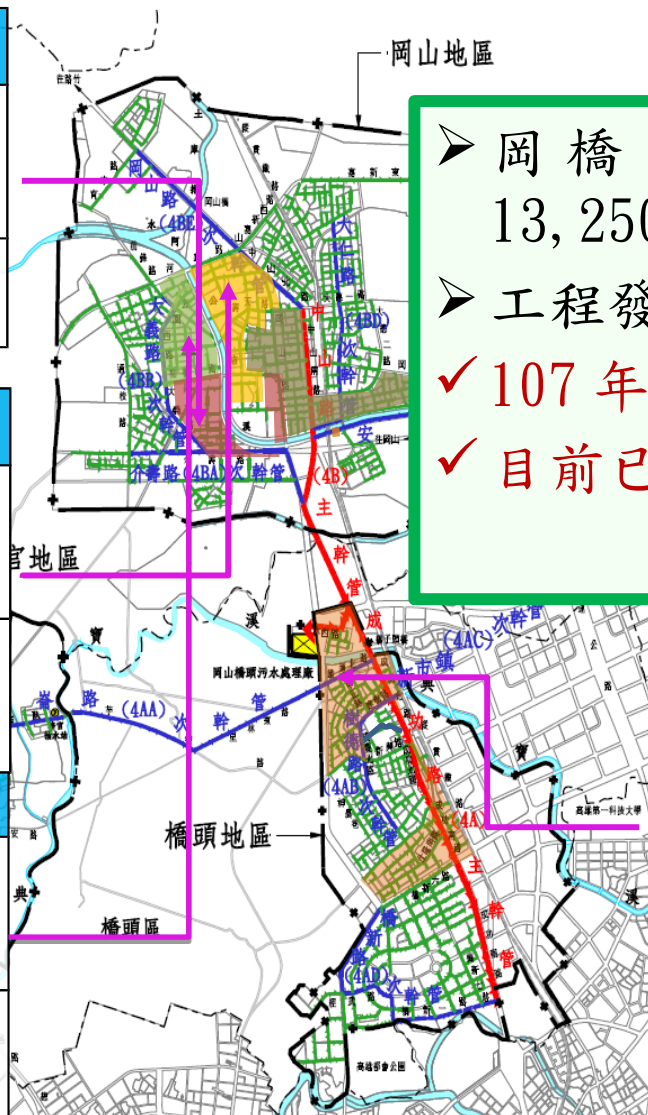

➤ 岡橋用戶接管第一期：
13,250 戶 (至 109 年底)


➤ 工程發包：4 標

✓ 107 年預計完成接管 2,000 戶

✓ 目前已完成接管 1,466 戶

橋頭第 2 標

進度	預定 0.0924% 實際 3.5512% 預訂完工日 108.12.20
效益	預計 2,850 戶



礮間處理與截流 - 阿公店溪污染改善 (101-106 年)

一 截流 10 處排水至礮間淨化場進行處理： 8,000 噸 / 日 (103 年完成)

二 截流 6 處至污水廠： 8,000 噸 / 日
(106 年底完成，已於 107 年 6 月通水)

- 可提供污水廠初期水量
，
並改善阿公店溪水質



污水處理廠簡介

- 工程總經費：6 億 3,600 萬元
 - ✓ 工程 6 億 37 萬 2,000 元、三年試運轉 3,562 萬 8,000 元
 - ✓ 營建署補助 5 億 8512 萬元 (92%)、本府自籌 5088 萬元 (8%)
- 處理容量：第一期 20,000 噸 / 日 (全期處理容量：50,000 噸 / 日)



橋頭區筆秀里
面積約 4.96 公頃

開工日 105 年 1 月 25 日
已於 107 年 5 月辦理試車
107 年 7 月 19 日完工

水利建造物搭排許可情形

- 申請搭排入五甲尾（百甲圳）排水案件
 - ✓ 漢翔航空工業股份有限公司
- 排入水利會圳路
 - ✓ 友山牧場
 - ✓ 鈺權牧場
 - ✓ 合盛牧場
 - ✓ 添財牧場
 - ✓ 寶全牧場
 - ✓ 久勝牧場
 - ✓ 林 〇 〇 君、孫 〇 〇 君、鄭 〇 〇 君（農舍）

