

# 濁水溪揚塵抑制

## 1080603~1080609周報表

- ▶ 第四區北岸竹塘防洪植栽造林作業開始進場。




# 108年度改善措施執行期程

實際進度

預定進度


改善措施		108年度											實際完成	
		5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3		4
水利防制工法	水覆蓋	5%		計畫發包		視汛期後灘地變化檢討	進場施作			施作				發包完成
				5%	10%	30%	50%	70%	80%	100%				
	河道整理	12%		計畫發包		視汛期後灘地變化檢討	進場施作			施作				300公尺
				5%	10%	30%	50%	70%	80%	100%				
	疏濬	19%	施作										52萬m3	
			10%	30%	50%	70%	80%	100%						
防災應變	其他措施	核定計畫			完成發包	施作							發包完成	
		5%	10%	80%	100%									
造林新植與撫育	灘地綠覆蓋	5%					施作			施作			發包完成	
						5%	10%	80%	100%					
	堤防培厚植栽	44%	施作		完成造林								執行中	
			10%	30%	50%	70%	80%	100%						

# 本周施作项目及位置

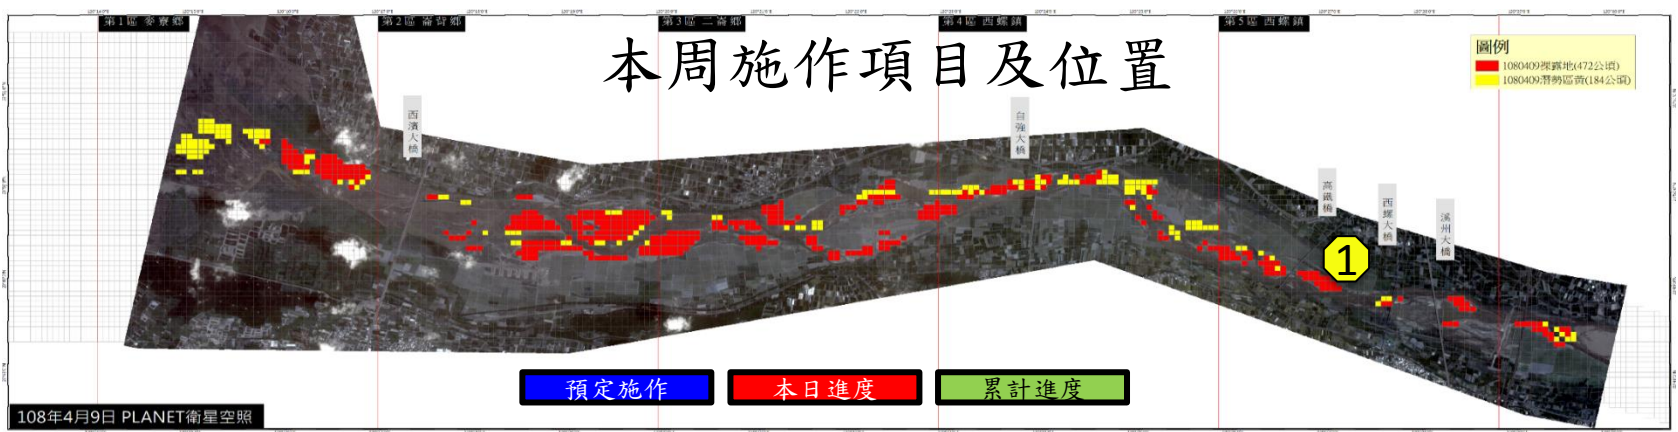

區域	施工位置	施工內容	目前進度
四	北岸竹塘	植樹造林	施工便道作業

# 108年濁水溪揚塵抑制工法規劃圖

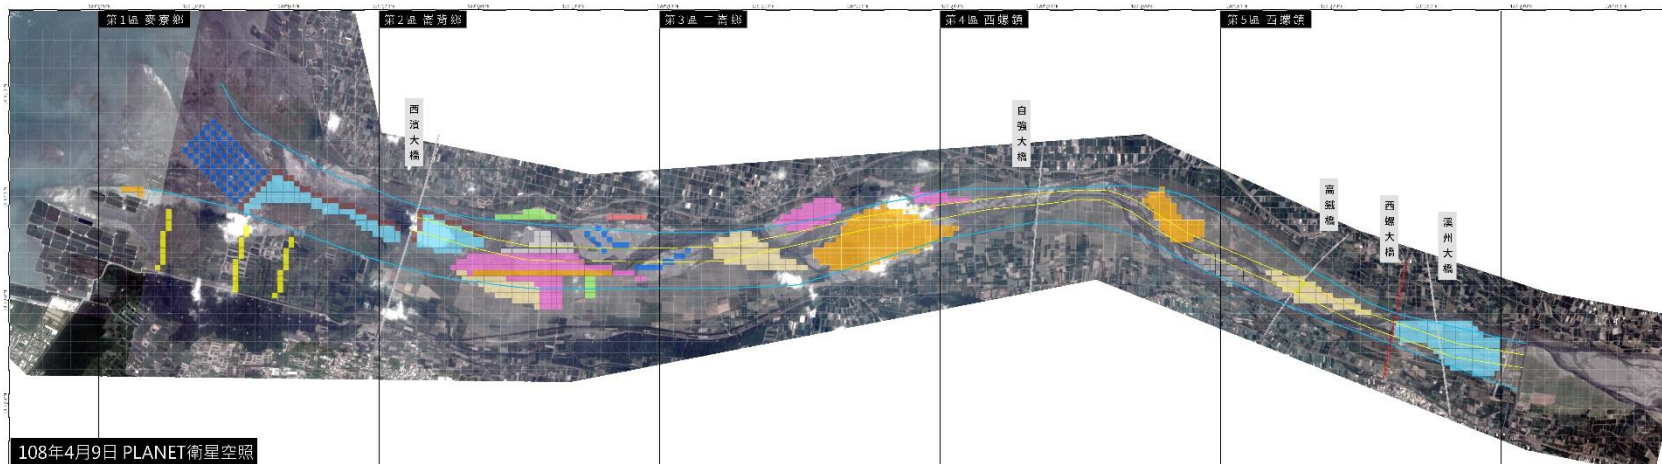

## 108年濁水溪揚塵抑制已完成項目

第一區	第二區	第三區	第四區	第五區
<p>● 水綠覆蓋其他措施：</p> <p>● 水綠覆蓋其他措施：</p>	<p>● 水綠覆蓋其他措施：</p> <p>1. 防里洪植栽6.6公頃</p> <p>● 其他措施：</p> <p>1. 簡易灑水系統抑制(12公頃)</p>	<p>● 水綠覆蓋其他措施：</p> <p>● 水綠覆蓋其他措施：</p>	<p>● 水綠覆蓋其他措施：</p> <p>● 水綠覆蓋其他措施：</p>	<p>● 水綠覆蓋其他措施：</p> <p>● 水綠覆蓋其他措施：</p>
