

濁水溪揚塵抑制

1080610~1080616周報表

- ▶ 第四區北岸竹塘防洪植栽造林作業本周因雨暫停作業。


108年度改善措施執行期程

實際進度

預定進度


改善措施		108年度											實際完成	
		5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3		4
水利防制工法	水覆蓋			計畫發包		視汛期後灘地變化檢討	進場施作			施作				發包完成
		5%		5%	10%	30%	50%	70%	80%	100%				
	河道整理			計畫發包		視汛期後灘地變化檢討	進場施作			施作				300公尺
		12%		5%	10%	30%	50%	70%	80%	100%				
	疏濬	施作											83萬m3	
		30%		10%		30%		50%		70%		80%	100%	
防災應變	其他措施	核定計畫			完成發包	施作							發包完成	
			10%	10%	80%	100%								
造林新植與撫育	灘地綠覆蓋						施作		施作				發包完成	
		5%					5%	10%		80%	100%			
	堤防培厚植栽	施作			完成造林							執行中		
		44%		10%		30%		50%		70%			80%	100%

本周施作项目及位置

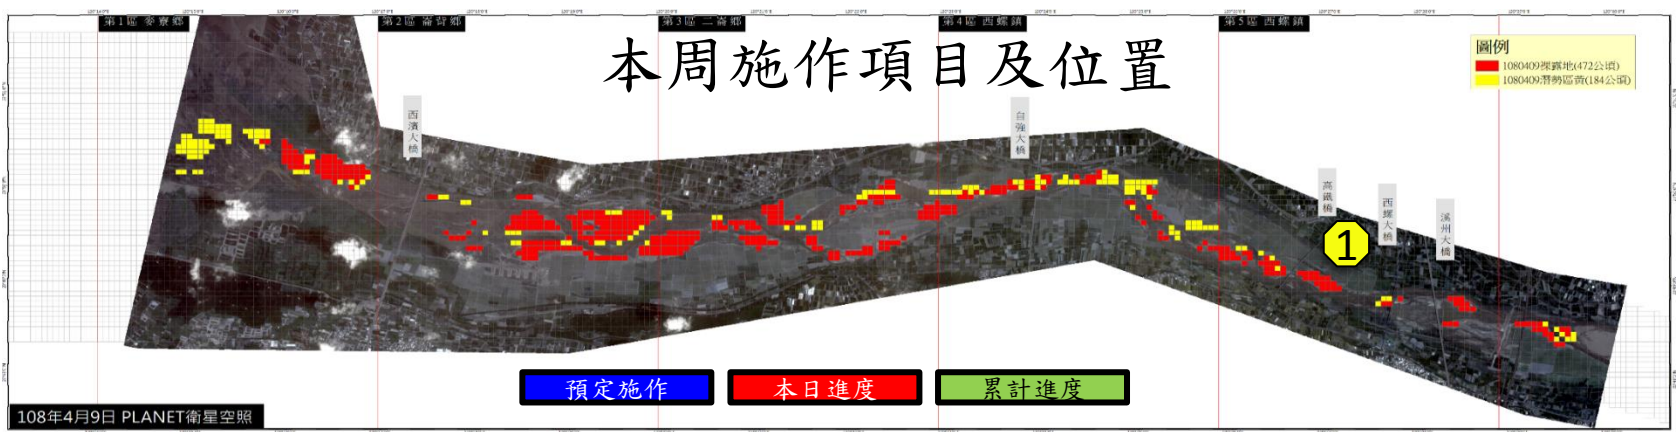

區域	施工位置	施工內容	目前進度
四	北岸竹塘	植樹造林	施工便道作業

108年濁水溪揚塵抑制工法規劃圖

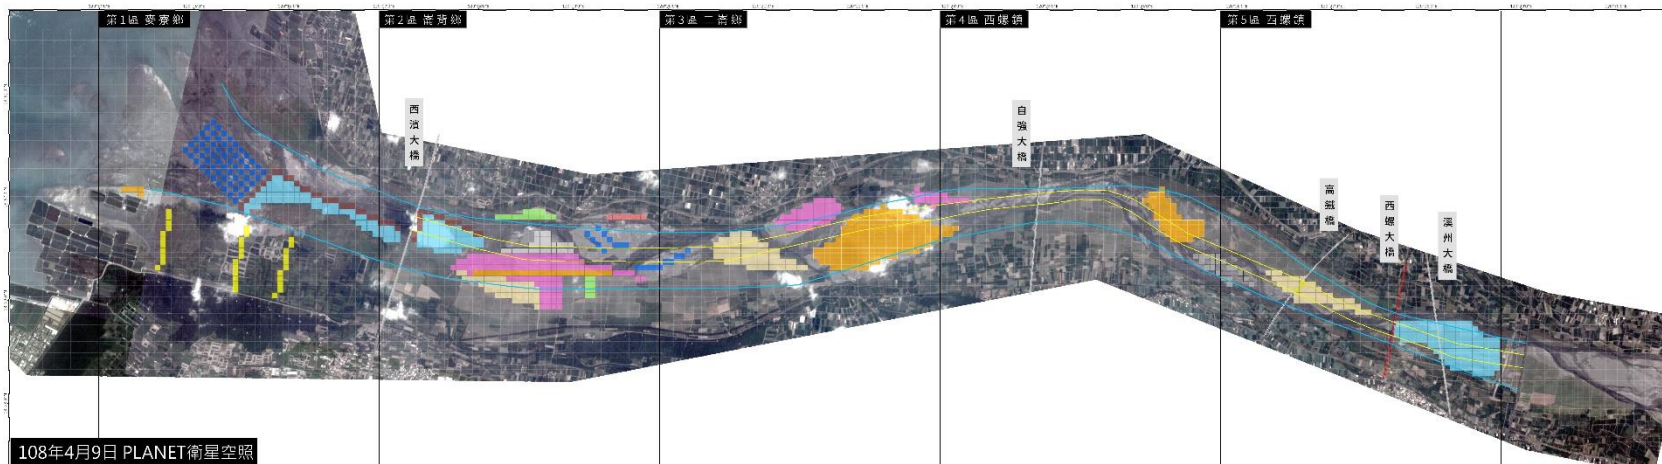

108年濁水溪揚塵抑制已完成項目

第一區	第二區	第三區	第四區	第五區
<ul style="list-style-type: none"> ● 水綠覆蓋其他措施： ● 水綠覆蓋其他措施： ● 水綠覆蓋其他措施： 	<ul style="list-style-type: none"> ● 水綠覆蓋其他措施： 1. 防里洪植栽6.6公頃 ● 其他措施： 1. 簡易灑水系統抑制(12公頃) 	<ul style="list-style-type: none"> ● 水綠覆蓋其他措施： ● 水綠覆蓋其他措施： ● 水綠覆蓋其他措施： 	<ul style="list-style-type: none"> ● 水綠覆蓋其他措施： ● 水綠覆蓋其他措施： ● 水綠覆蓋其他措施： 	<ul style="list-style-type: none"> ● 水綠覆蓋其他措施： ● 水綠覆蓋其他措施： ● 水綠覆蓋其他措施：

各區空拍現況(108/06/13)

第一區

水位高，低灘地濕潤




第二區

水位高，低灘地濕潤



第三區

水位高，低灘地濕潤

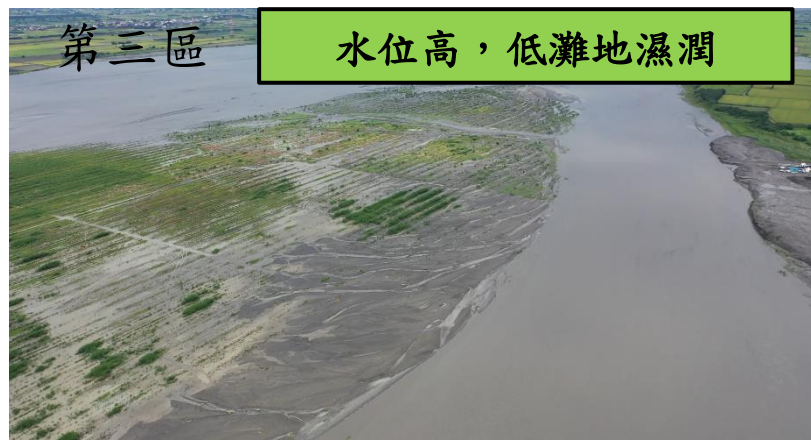

第四區

水位高，低灘地濕潤



第五區

水位高，低灘地濕潤

