

濁水溪揚塵抑制

1080708~1080714周報表


- ▶ 第五區北岸竹塘防洪植栽造林作業施工便道作業。

# 108年度改善措施執行期程

實際進度


預定進度

| 改善措施                |         | 108年度    |   |          |          |                    |      |     |      |     |      |      |      | 實際完成  |
|---------------------|---------|----------|---|----------|----------|--------------------|------|-----|------|-----|------|------|------|-------|
|                     |         | 5        | 6 | 7        | 8        | 9                  | 10   | 11  | 12   | 1   | 2    | 3    | 4    |       |
| 水利<br>防制<br>工法      | 水覆蓋     |          |   | 計畫<br>發包 |          | 視汛期後<br>灘地變化<br>檢討 | 進場施作 |     |      | 施作  |      |      |      | 執行中   |
|                     |         | 5%       |   | 5%       |          | 10%                | 30%  | 50% | 70%  | 80% | 100% |      |      |       |
|                     | 河道整理    |          |   | 計畫<br>發包 |          | 視汛期後<br>灘地變化<br>檢討 | 進場施作 |     |      | 施作  |      |      |      | 300公尺 |
|                     |         | 12%      |   | 5%       |          | 10%                | 30%  | 50% | 70%  | 80% | 100% |      |      |       |
|                     | 疏濬      | 施作       |   |          |          |                    |      |     |      |     |      |      |      | 83萬m3 |
|                     |         | 30%      |   | 10%      |          | 30%                |      | 50% |      | 70% |      | 80%  | 100% |       |
| 防災<br>應變            | 其 他 措 施 | 核定<br>計畫 |   |          | 完成<br>發包 | 施作                 |      |     |      |     |      |      |      | 發包完成  |
|                     |         | 10.0%    |   |          |          | 5%                 | 10%  | 80% | 100% |     |      |      |      |       |
| 造林<br>新植<br>與撫<br>育 | 灘地綠覆蓋   |          |   |          |          |                    | 施作   |     |      | 施作  |      |      |      | 執行中   |
|                     |         | 5%       |   |          |          |                    | 5%   |     | 10%  |     | 80%  | 100% |      |       |
|                     | 堤防培厚植栽  | 施作       |   |          | 完成<br>造林 |                    |      |     |      |     |      |      |      | 執行中   |
|                     |         | 88%      |   | 10%      |          | 30%                |      | 50% |      | 70% |      | 80%  | 100% |       |

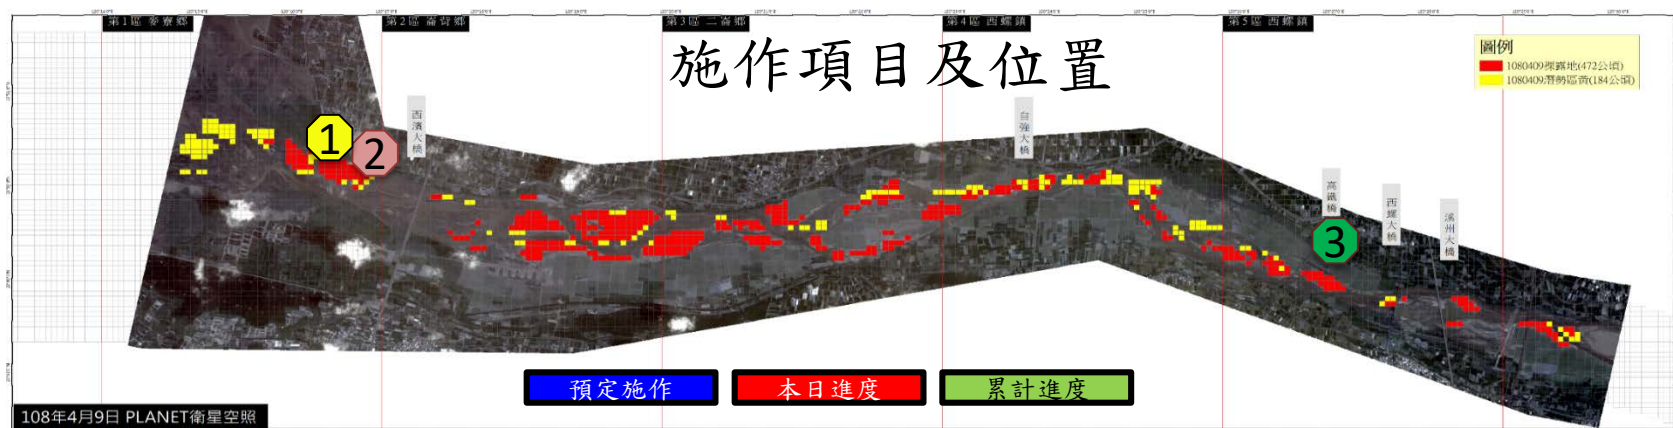

| 區域 | 施工位置 | 施工內容   | 目前進度    |
|----|------|--------|---------|
| 一  | 北岸大城 | 簡易灑水系統 | 完成6.0公頃 |
| 一  | 北岸大城 | 植樹造林   | 完成6.0公里 |
| 五  | 北岸竹塘 | 植樹造林   | 施工便道作業  |

# 108年濁水溪揚塵抑制工法規劃圖

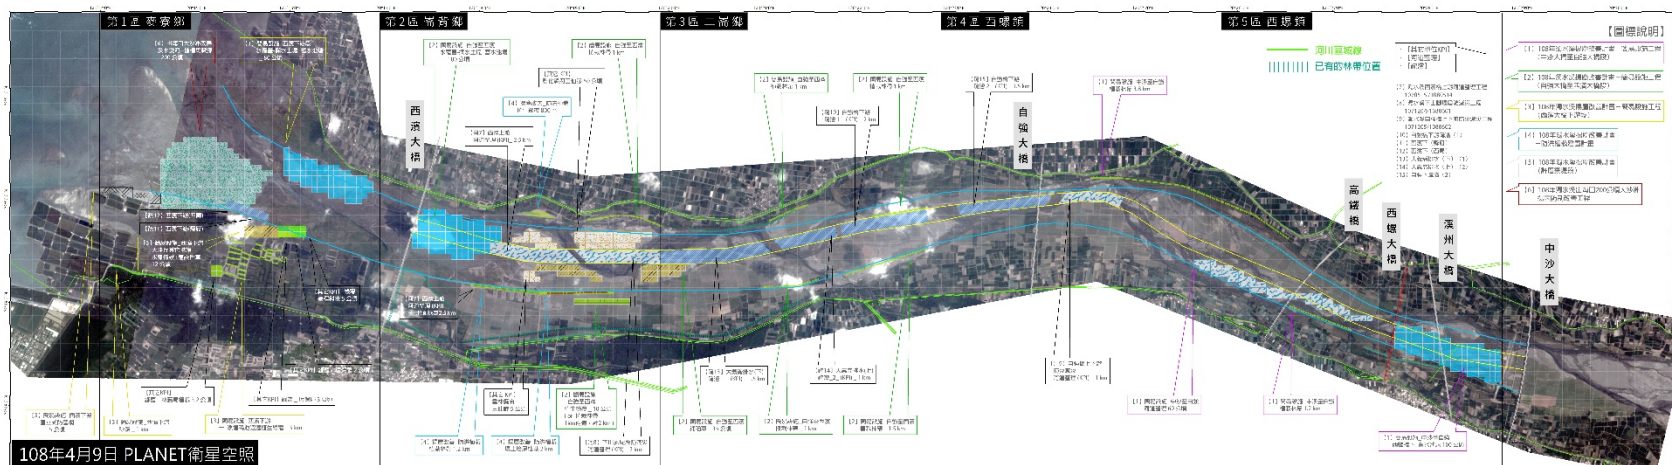

## 108年濁水溪揚塵抑制已完成項目

| 第一區                                                                           | 第二區                                                                          | 第三區                               | 第四區                               | 第五區                               |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| <p>●水覆蓋：<br/>●綠覆蓋：<br/>1. 防洪植栽6.0公里</p> <p>●其他措施：<br/>1. 簡易灑水系統抑制 (6.0公頃)</p> | <p>●水覆蓋：<br/>●綠覆蓋：<br/>1. 防洪植栽7.2公里</p> <p>●其他措施：<br/>1. 簡易灑水系統抑制 (12公頃)</p> | <p>●水覆蓋：<br/>●綠覆蓋：<br/>●其他措施：</p> | <p>●水覆蓋：<br/>●綠覆蓋：<br/>●其他措施：</p> | <p>●水覆蓋：<br/>●綠覆蓋：<br/>●其他措施：</p> |



# 各區空拍現況(更新至0630)

第一區

水位降，低灘地浮現



第二區

水位降，低灘地浮現，半濕潤



第三區

水位降，低灘地濕潤



第四區

水位降，低灘地浮現，半濕潤



第五區

水位降，低灘地浮現，濕潤

