

# 濁水溪揚塵抑制

## 1080715~1080721周報表

- ▶ 第五區北岸竹塘防洪植栽造林作業施工便道作業。
- ▶ 本周7/20~7/21大城測站空品不良，已啟動緊急應變措施(簡易灑水系統2KM及灑水車機動灑水)




# 108年度改善措施執行期程

實際進度

預定進度


改善措施		108年度											實際完成	
		5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3		4
水利 防制 工法	水覆蓋			計畫 發包		視汛期後 灘地變化 檢討	進場施作			施作				執行中
		5%		5%		10%	30%	50%	70%	80%	100%			
	河道整理			計畫 發包		視汛期後 灘地變化 檢討	進場施作			施作				300公尺
		12%		%		10%	30%	50%	70%	80%	100%			
	疏濬	施作											83萬m3	
		30%		0%		30%		50%		70%		80%	100%	
防災 應變	其他措施	核定 計畫			完成 發包	施作							發包完成	
		10.0%				5%	10%	80%	100%					
造林 新植 與 撫育	灘地綠覆蓋					施作			施作				執行中	
		5%					5%	10%		80%	100%			
	堤防培厚植栽	施作			完成 造林								執行中	
		88%		0%		30%	50%	70%	80%	100%				

# 本周施作項目及位置

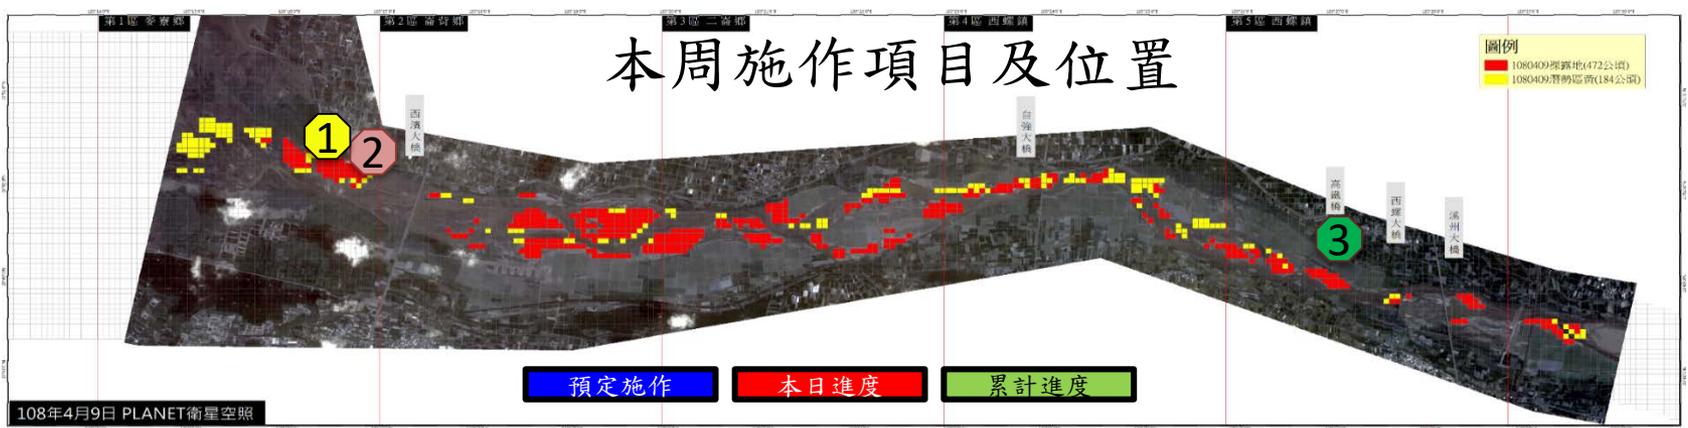

區域	施工位置	施工內容	目前進度
一	北岸大城	簡易灑水系統	完成6.0公頃
一	北岸大城	植樹造林	完成6.0公里
五	北岸竹塘	植樹造林	施工便道作業

# 108年濁水溪揚塵抑制工法規劃圖

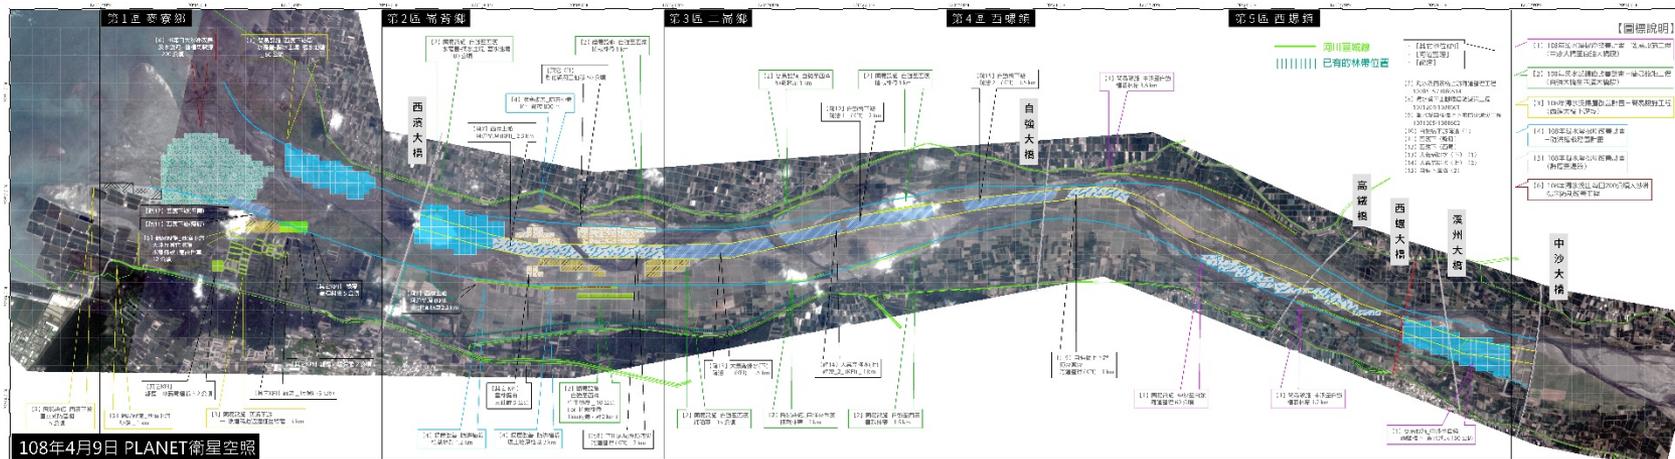

108年4月9日 PLANET衛星空照

## 108年濁水溪揚塵抑制已完成項目

第一區	第二區	第三區	第四區	第五區
<ul style="list-style-type: none"> <li>● 水覆蓋：</li> <li>● 綠覆蓋：</li> <li>1. 防洪植栽6.0公里</li> <li>● 其他措施：</li> <li>1. 簡易灑水系統抑制(6.0公頃)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 水覆蓋：</li> <li>● 綠覆蓋：</li> <li>1. 防洪植栽7.2公里</li> <li>● 其他措施：</li> <li>1. 簡易灑水系統抑制(12公頃)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 水覆蓋：</li> <li>● 綠覆蓋：</li> <li>● 其他措施：</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 水覆蓋：</li> <li>● 綠覆蓋：</li> <li>● 其他措施：</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 水覆蓋：</li> <li>● 綠覆蓋：</li> <li>● 其他措施：</li> </ul>

# 各區空拍現況(更新至0712)

第一區

水位降，低灘地浮現



第二區

水位降，低灘地浮現，半濕潤



第三區

水位降，低灘地浮現，半濕潤



第四區

水位降，低灘地浮現，半濕潤



第五區

水位降，低灘地浮現，半濕潤

