


濁水溪揚塵抑制1081125~1081201周報表



崙背大庄培厚作業



自強大橋上游攔水土堤作業




溪州大橋上游平舖防塵網

各區緊急應變作為



本周施作項目及位置

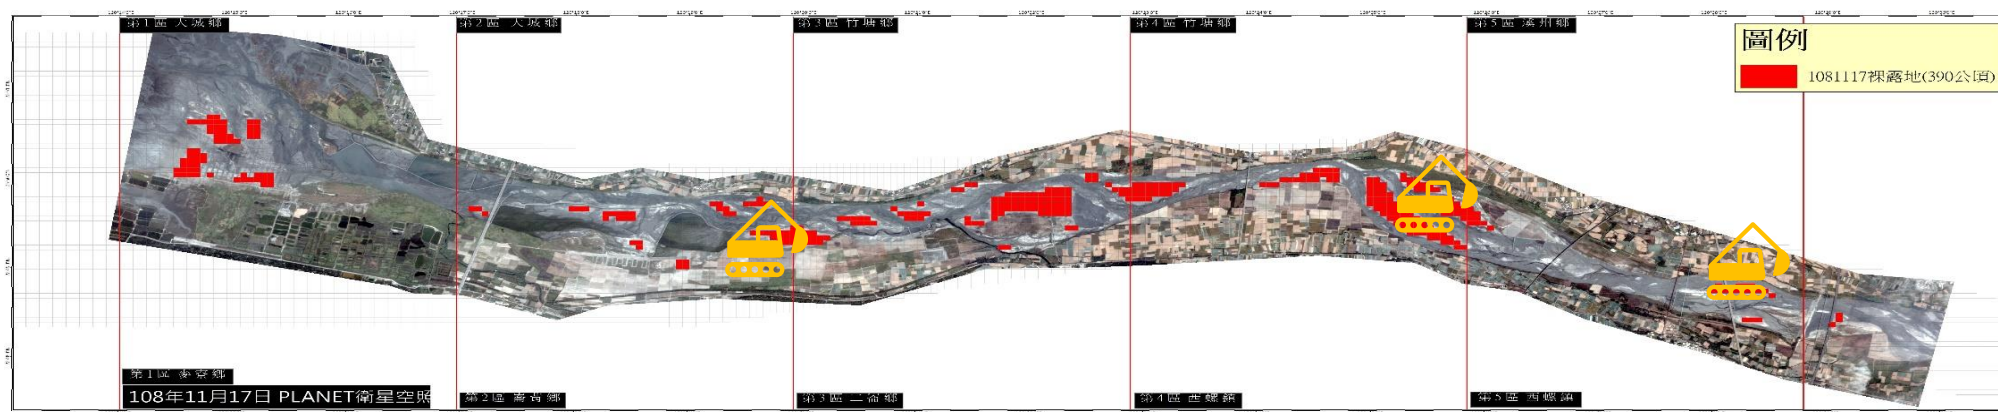

區域	施工位置	施工內容	目前進度
二	崙背大庄	培厚	12.6萬方
四	自強橋上游	攔水土堤	1800M
五	溪州大橋	平鋪防塵網	4公頃

108年度改善措施執行期程

預定進度

實際進度

改善措施		108年度												實際完成
		5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	
水利 防制工 法	水覆蓋 (300公 頃)			50%										432公頃
		144%												
	河道整 理 (2.5KM)			50%										2300公尺
		92%												
	河道疏濬及去 化土砂 (405萬方)(視 實際情形檢 討)	50%												163.22萬方
		40.3												
防災應 變	其他覆 蓋(500 公頃)				40%									426.3公頃
		85.3												
造林新 植與撫 育	灘地綠 覆蓋(50 公頃)					10%								137.5公頃
		275%												
	防洪林帶 及行道樹 (15公里)	100%												25公里
		167%												

108年度改善措施分區項目及KPI達成率

改善措施		區域					KPI達成率	11月KPI	備註
		第一區	第二區	第三區	第四區	第五區			
水利防制工法	水覆蓋 (300公頃)	140.0 公頃	192.0 公頃			100.0 公頃	144%	50%	
							432		
	河道整理 (2.5KM)		300.0 M	2000.0 M			92%	50%	
							2300		
	河道疏濬及去 化土砂 (405萬方) (視 實際情形檢 討)	68.6 萬	12.6 萬	82.0 萬			40.3%	50%	
							163.2		
防災應變	其他覆 蓋(500 公頃)	273.2 公頃	37.0 公頃	35.2 公頃		80.9 公頃	85.3%	40%	
							426.3		
造林新植與撫育	灘地綠 覆蓋(50 公頃)	1.5 公頃	4.0 公頃	61.0 公頃	10.0 公頃	61.0 公頃	275%	10%	
							137.5		
	防洪林帶 及行道樹 (15公里)	6.0 公里	7.2 公里			11.8 公里	167%	100%	
							25		

各區空拍現況(更新至1110)

第一區

蓄水池塘施作完畢



第二區

蓄水池塘施作完畢



第三區

防塵網鋪設完畢



第四區





蓄水池塘施作中




第五區

蓄水池塘施作完畢



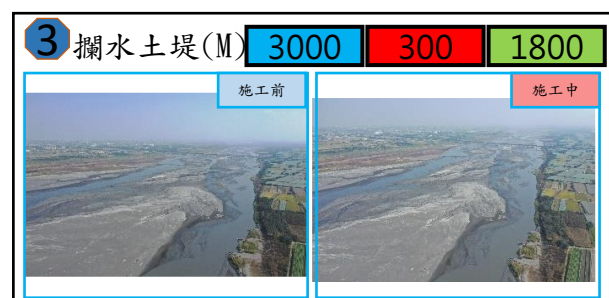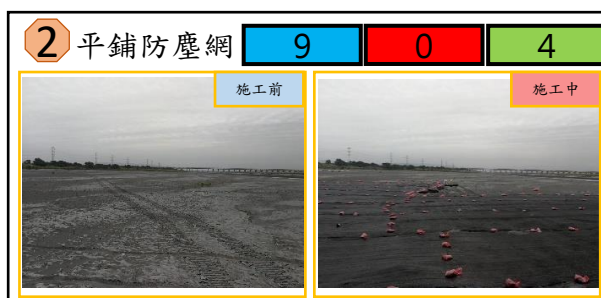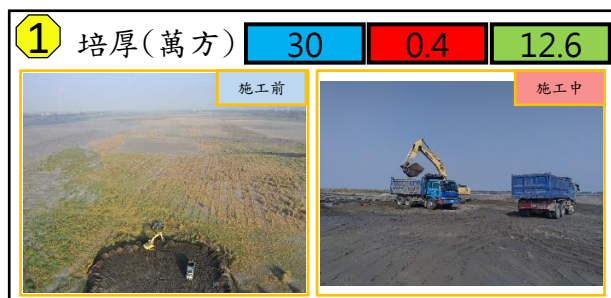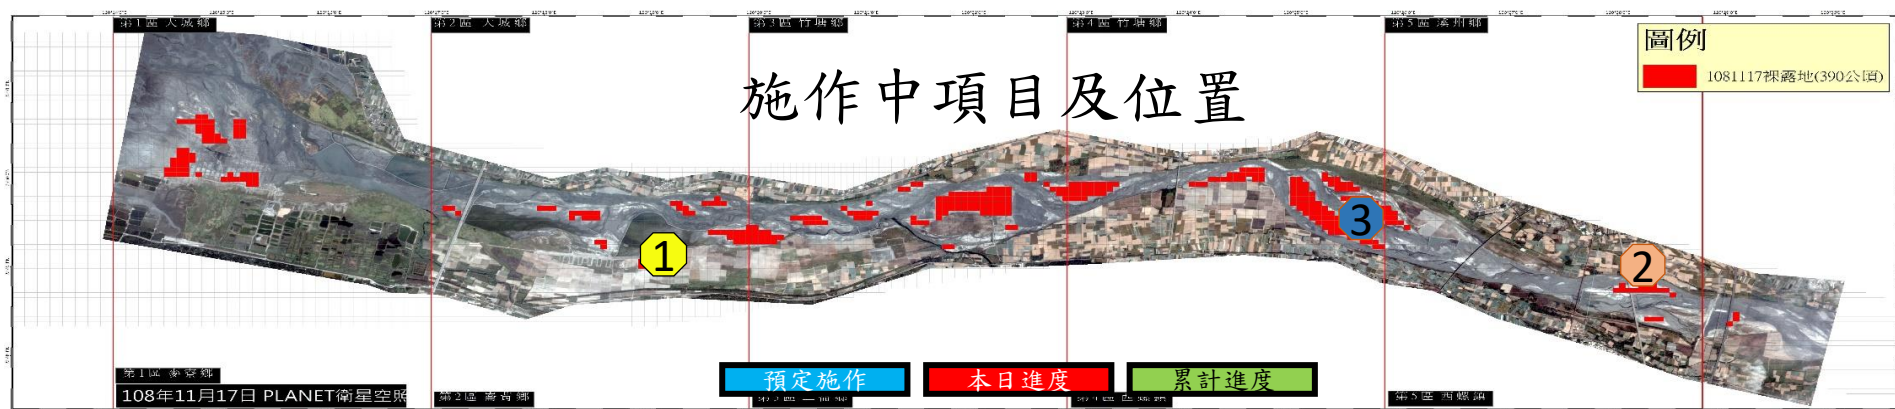

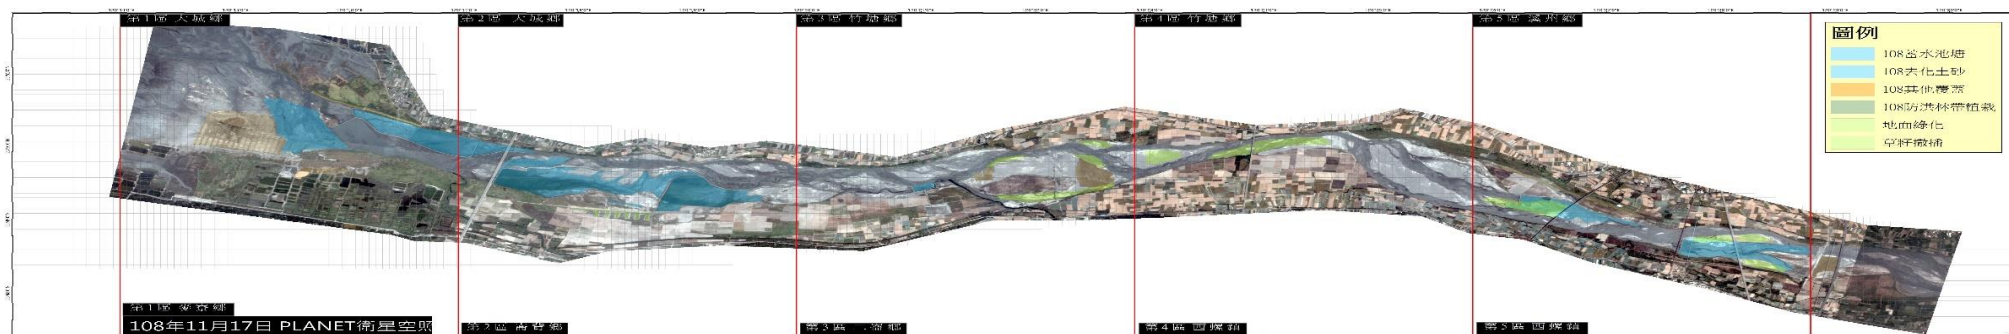

第一區		第二區		第三區		第四區		第五區	
水覆蓋		水覆蓋		水覆蓋		水覆蓋		水覆蓋	
蓄水池塘(公頃)	140	蓄水池塘(公頃)	192			蓄水池塘(公頃)	50	蓄水池塘(公頃)	100
綠覆蓋		綠覆蓋		綠覆蓋		綠覆蓋		綠覆蓋	
北岸林帶植栽(公頃)	6	防洪植栽(公頃)	7.2	草籽撒播(公頃)	61	草籽撒播(公頃)	10	防洪植栽(公頃)	11.8
大沙丘植栽(公頃)	1.5	綠覆蓋(公頃)	4					草籽撒播(公頃)	61
疏濬填池綠覆(公頃)	2.5								
大沙丘綠覆(公頃)	2								
林帶植栽(公頃)	4.2								
其他覆蓋		其他覆蓋		其他覆蓋		其他覆蓋		其他覆蓋	
去化土砂(萬方)	68.62	去化土砂(萬方)	12.6	去化土砂(萬方)	82	三仙膠(公頃)	26.1	三仙膠(公頃)	53.9
大沙丘水線(公頃)	20	河道整理(M)	300	河道整理(M)	2000			灑水系統(公頃)	11.5
200公頃灑水系統(公頃)	200	灑水系統(公頃)	18	平鋪防塵網	35			便道鋪設級配(公頃)	0.5
		牡蠣殼鋪灑(公頃)	2	便道鋪設級配	0.2			平鋪防塵網(公頃)	15
三仙膠(公頃)	2	三仙膠(公頃)	17						
稻草鋪設(公頃)	0.4								
疏濬填池鋪設稻草(公頃)	2.5								
便道鋪設級配(公頃)	2.3								
平鋪防塵網(公頃)	0.3								
直立式防塵網(公頃)	8								
三仙膠(公頃)	29.7								
牡蠣殼鋪灑(公頃)	5								
碎石級配(公頃)	3								
其他覆蓋總計	273.2	其他覆蓋總計	37	其他覆蓋總計	35.2	其他覆蓋總計	26.1	其他覆蓋總計	80.9
