

# 濁水溪揚塵抑制1090210~1090216周報表

➔ 崙背大庄培厚作業

➔ 各區緊急應變作為





# 濁水溪揚塵改善措施執行期程

預定進度

實際進度

改善措施		108年								109年				實際完成			
		5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4				
水利 防制工 法	水覆蓋 (300公 頃)			80%												572公頃	
		191%															
	河道整 理 (2.5KM)			80%												4500公尺	
	河道疏濬及去 化土砂 (210萬方)(視 實際情形檢 討)	100%												217.4萬方			
		103.5															
防災應 變	其他覆 蓋(500 公頃)					100%											497.02公頃
		99.4															
造林新 植與撫 育	灘地綠 覆蓋(50 公頃)						70%										143公頃
		286%															
	防洪林帶 及行道樹 (15公里)	100%												25公里			
		167%															



## 各區空拍現況(更新至0205)

第一區

蓄水池塘施作完畢



第二區

蓄水池塘施作完畢



第三區

防塵網鋪設完畢



第四區


蓄水池塘施作完畢



第五區

蓄水池塘施作完畢



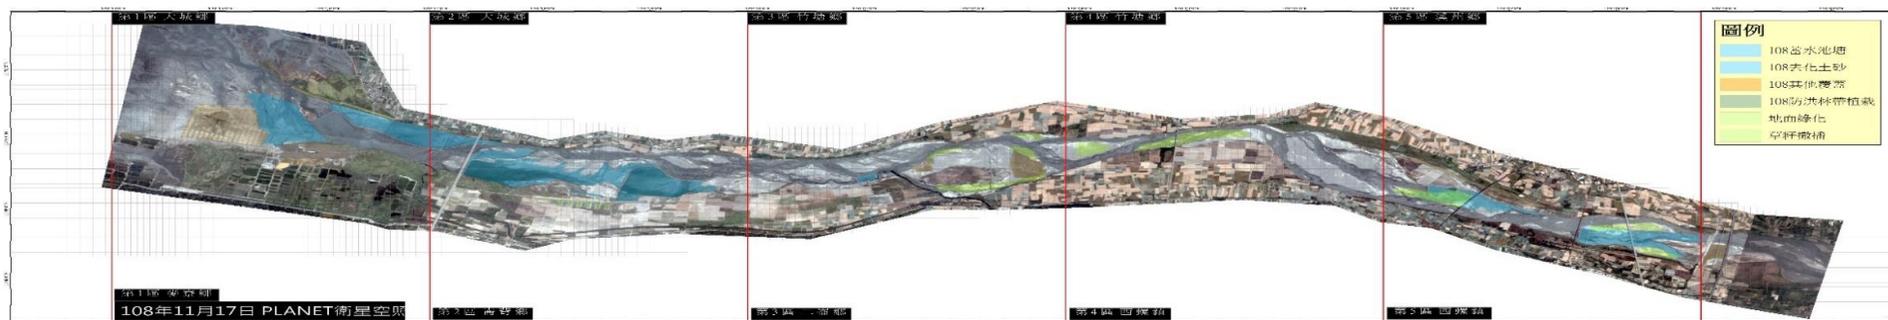

第一區		第二區		第三區		第四區		第五區	
水覆蓋		水覆蓋		水覆蓋		水覆蓋		水覆蓋	
蓄水池塘(公頃)	140	蓄水池塘(公頃)	192	蓄水池塘(公頃)	10	蓄水池塘(公頃)	50	蓄水池塘(公頃)	180
綠覆蓋		綠覆蓋		綠覆蓋		綠覆蓋		綠覆蓋	
北岸林帶植栽(公里)	6	防洪植栽(公里)	7.2	草籽撒播(公頃)	61	草籽撒播(公頃)	10	防洪植栽(公里)	11.8
大沙丘植栽(公里)	1.5	綠覆蓋(公頃)	5					草籽撒播(公頃)	61
疏濬填池綠覆(公頃)	2.5								
大沙丘綠覆(公頃)	2								
林帶植栽(公頃)	4.2								
其他覆蓋		其他覆蓋		其他覆蓋		其他覆蓋		其他覆蓋	
去化土砂(萬方)	85.7	去化土砂(萬方)	49.1	去化土砂(萬方)	82.6	三仙膠(公頃)	26.1	三仙膠(公頃)	53.9
大沙丘水線(公頃)	20	河道整理(M)	2000	河道整理(M)	2500			灑水系統(公頃)	7.5
200公頃灑水系統(公頃)	220	灑水系統(公頃)	23	平鋪防塵網	35			便道鋪設級配(公頃)	0.5
		牡蠣殼鋪灑(公頃)	11.91	便道鋪設級配	0.2			平鋪防塵網(公頃)	19.3
三仙膠(公頃)	2	三仙膠(公頃)	20	三仙膠(公頃)	6.23				
稻草鋪設(公頃)	0.4								
疏濬填池鋪設稻草(公頃)	2.5								
便道鋪設級配(公頃)	2.3								
平鋪防塵網(公頃)	4.5								
直立式防塵網(公頃)	8								
三仙膠(公頃)	47.68								
牡蠣殼鋪灑(公頃)	11.21								
碎石級配(公頃)	7.12								
其他覆蓋總計	325.71	其他覆蓋總計	54.91	其他覆蓋總計	35.2	其他覆蓋總計	26.1	其他覆蓋總計	81.2
