


# 揚塵防治 週報表


114/11/03~114/11/09



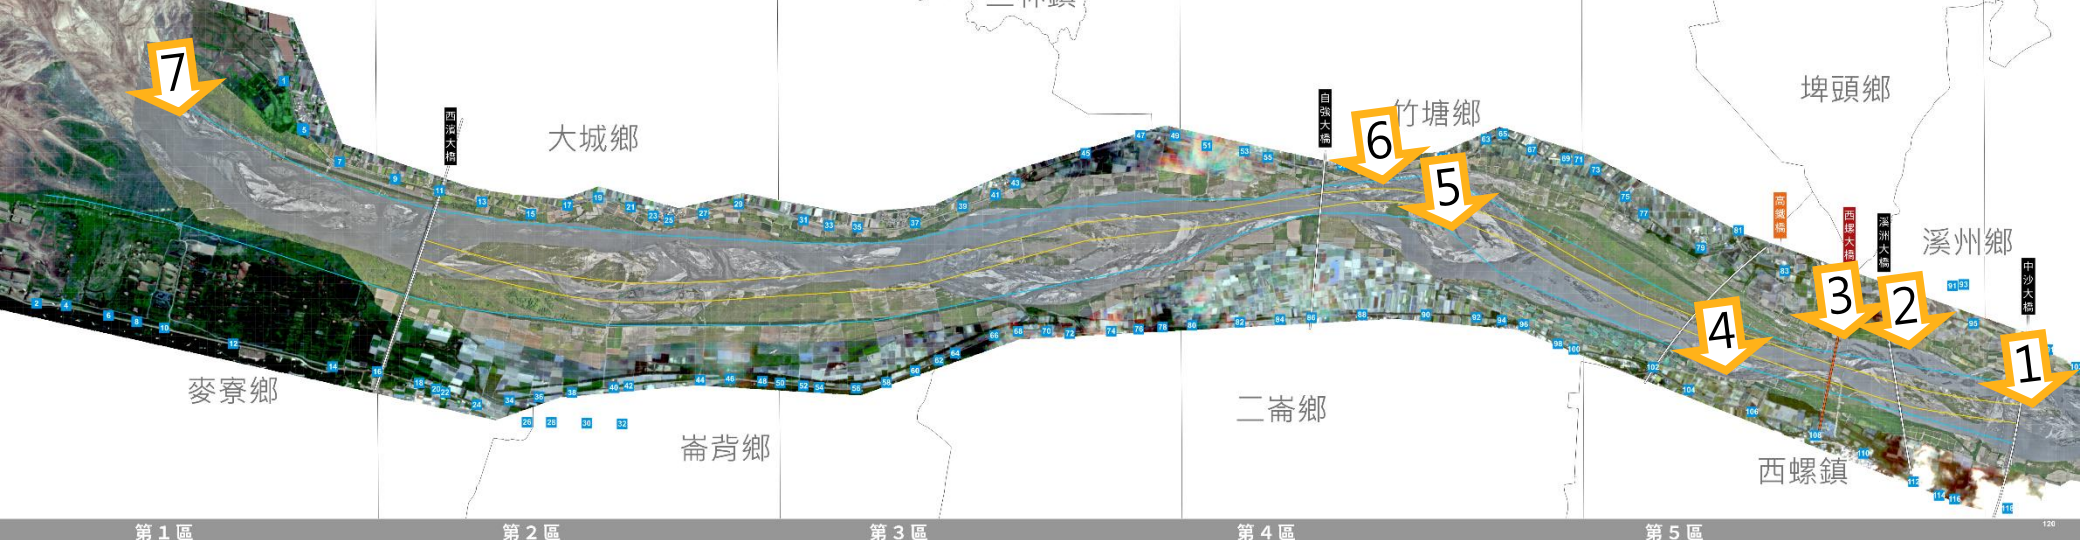


114年8月18日 PLANT 衛星空拍


### 3 西螺大橋上游北岸\_攔水土堤

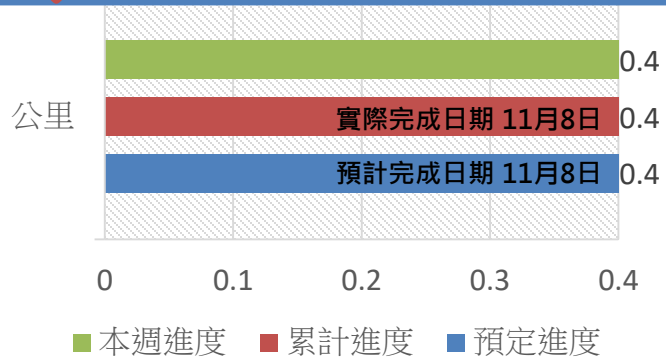


### 2 溪州大橋上游北岸\_攔水土堤

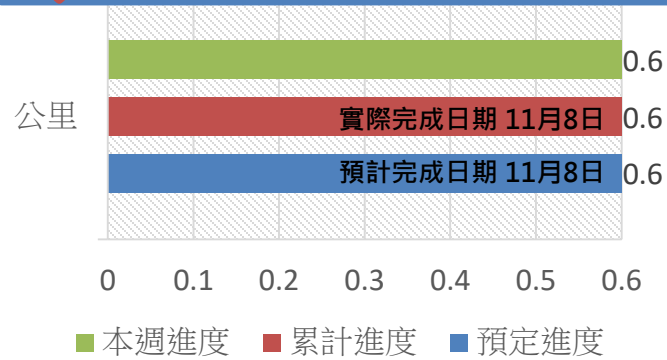

### 1 中沙大橋上游低灘地\_鋪設稻草蓆

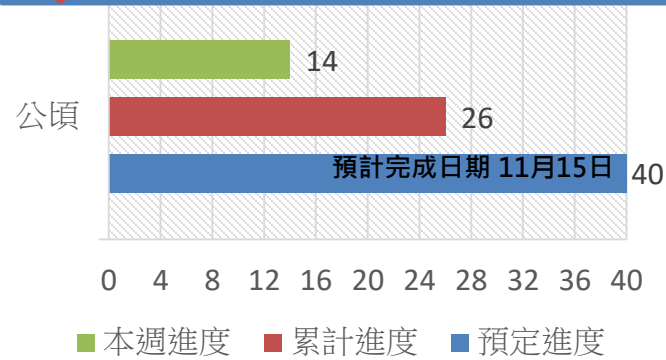

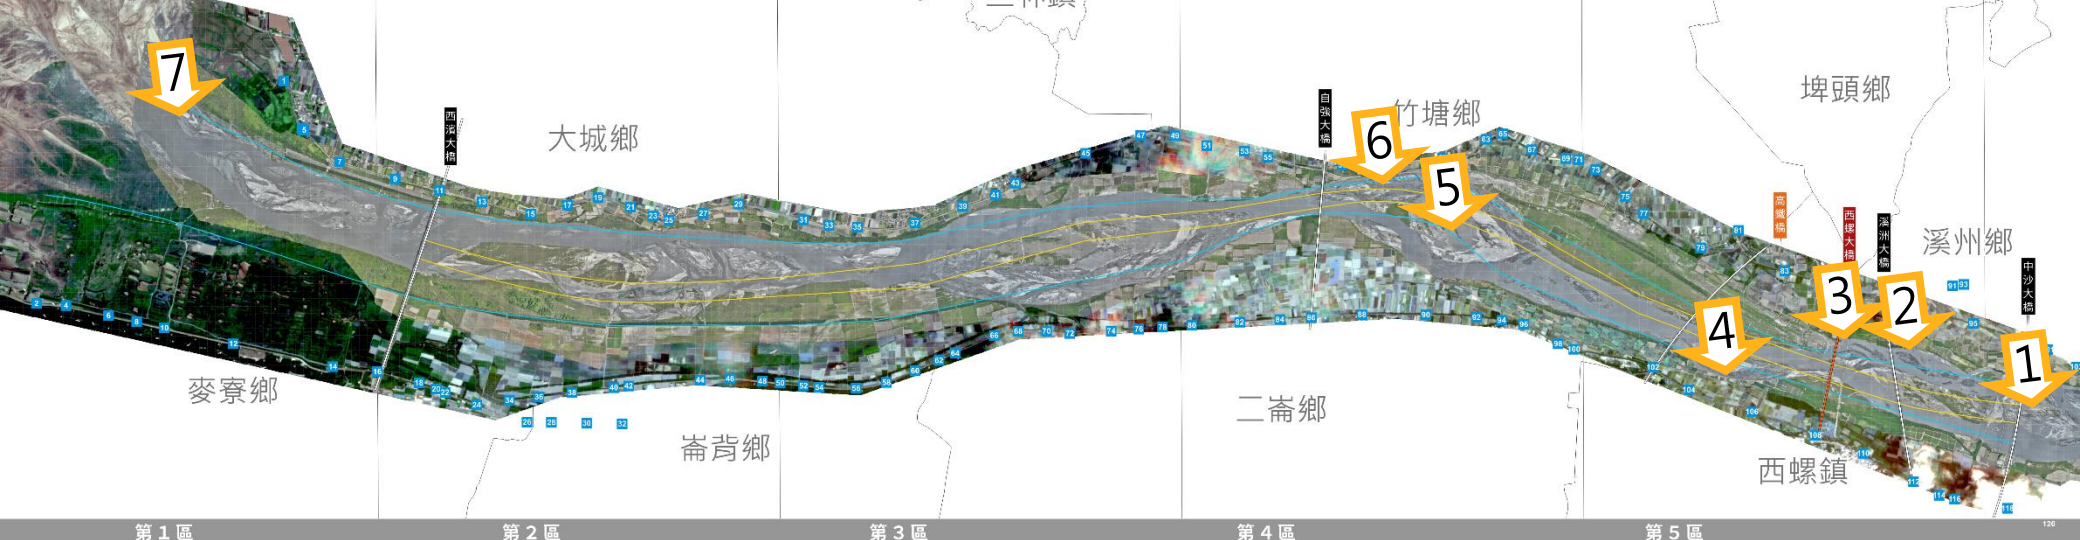

第 1 區

第 2 區

第 3 區

第 4 區


第 5 區

114年8月18日 PLANT 衛星空拍

6

59號越堤路段\_攔水土堤

公里




0 0.1 0.2 0.3 0.4

■ 本週進度 ■ 累計進度 ■ 預定進度

5

61號越堤路段低灘地\_鋪設防塵網

公頃




0 10 20 30 40 50 60

■ 本週進度 ■ 累計進度 ■ 預定進度

4

高鐵橋上游低灘地\_鋪設稻草蓆


公頃



0 5 10 15 20


■ 本週進度 ■ 累計進度 ■ 預定進度



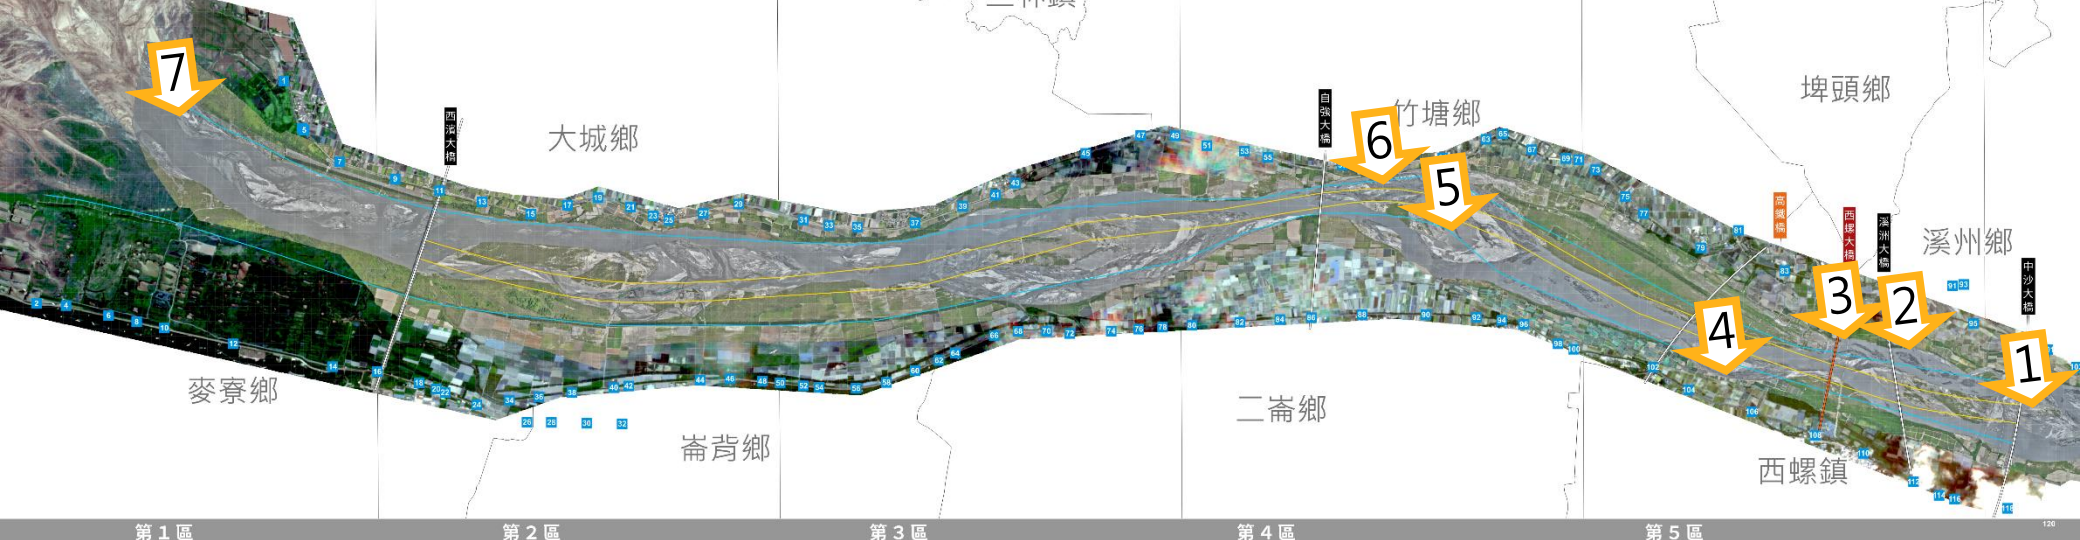

114年8月18日 PLANT 衛星空拍

### 7 5號越堤路段下游低灘地\_鋪設稻草蓆

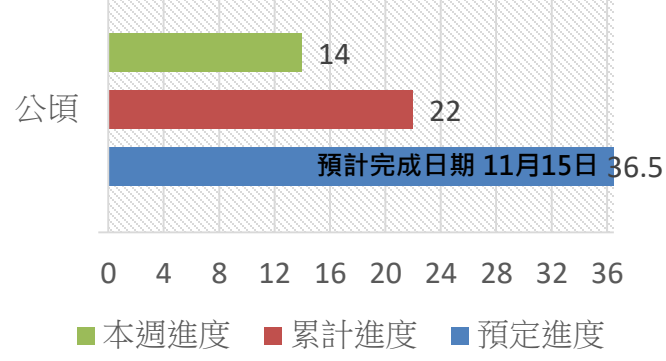



# 各區 空拍現況

**第一區** 0號越堤路段下游



**第二區** 西濱大橋上游




**第三區** 跨河電塔 下游



**第四區** 自強大橋上游



**第五區** 西螺大橋 上游

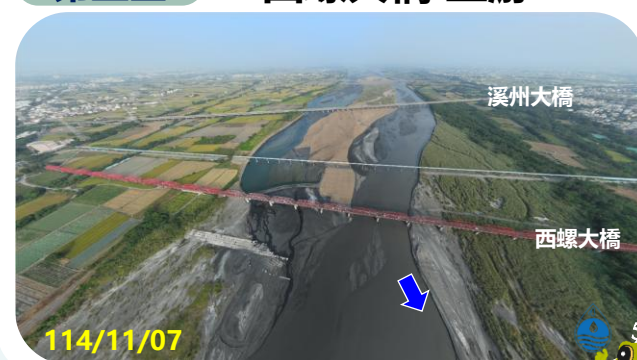

114年度

揚塵KPI進度管制

執行期程:114年5月至115年4月

- 抑制面積
- 進度



## 其他覆蓋

- 目標值 : 300 公頃
- 已完成 : 388.6公頃
- 達成率 : 129.5%



## 水覆蓋

- 目標值 : 400公頃
- 已完成 : 405 公頃
- 達成率 : 101.3 %



## 河道整理

- 目標值 : 4 公里
- 已完成 : 1.9公里
- 達成率 : 47.5%



## 防洪植栽


- 目標值 : 4 公里
- 已完成 : 5.2公里
- 達成率 : 130 %



## 綠覆蓋

- 目標值 : 250 公頃
- 已完成 : 357公頃
- 達成率 : 142.8%



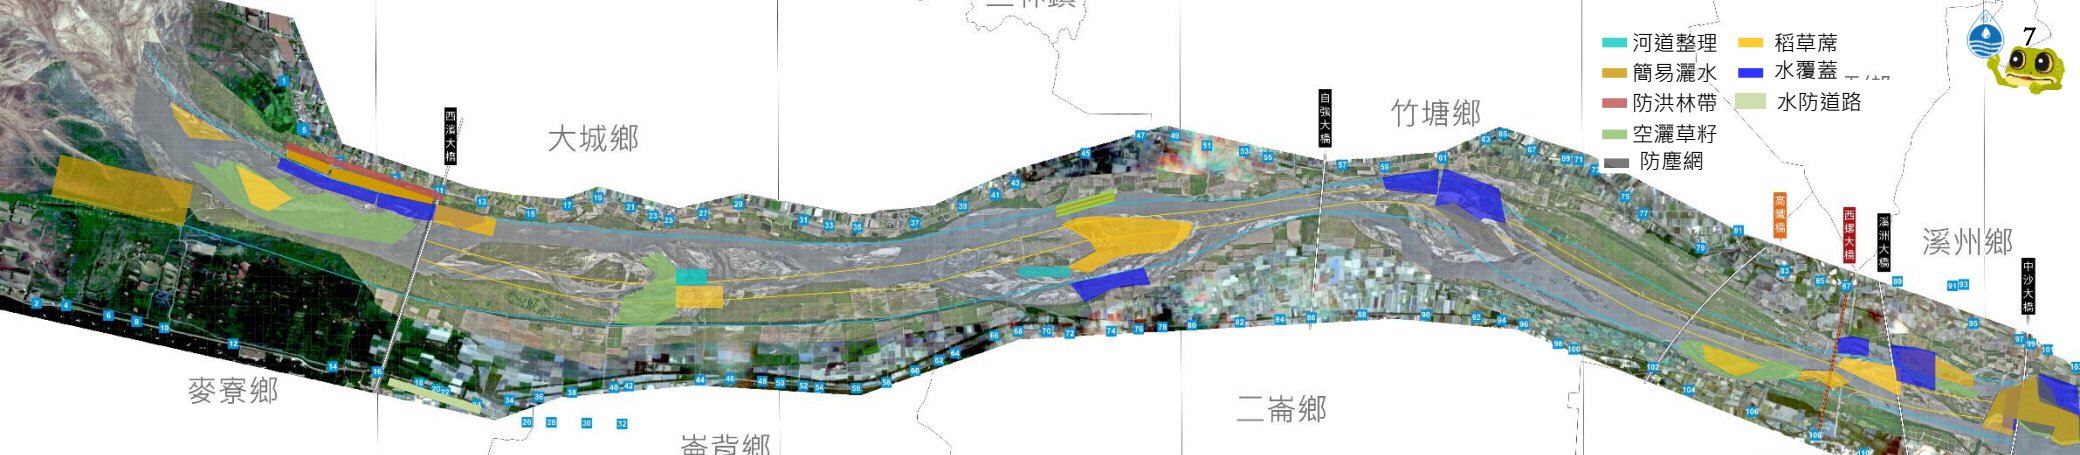

| 水覆蓋                                                                                                                    | 水覆蓋                                                    | 水覆蓋                                                | 水覆蓋                                    | 水覆蓋                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1) 西濱下游北岸(9號至13號越堤)_蓄水池60公頃<br>2) 西濱下游北岸7號越堤_蓄水池40公頃<br>3) 西濱下游北岸5號越堤_蓄水池40公頃                                          |                                                        | 1) 74號越堤路段_蓄水池30公頃                                 | 1)61號越堤路段_蓄水池60公頃<br>2)59號越堤路段_蓄水池30公頃 | 1) 中沙大橋上游_蓄水池50公頃<br>2) 中沙大橋下游_蓄水池30公頃<br>3) 溪州大橋上游北岸_蓄水池45公頃<br>4) 西螺大橋上游北岸_蓄水池20公頃                                                                                             |
| 河道整理                                                                                                                   | 河道整理                                                   | 河道整理                                               | 河道整理                                   | 河道整理                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                        | 1) 40號越堤_河道整理1.5公里                                     | 1) 74號越堤下游河中低灘地_河道整理0.4公里                          |                                        |                                                                                                                                                                                  |
| 綠覆蓋                                                                                                                    | 綠覆蓋                                                    | 綠覆蓋                                                | 綠覆蓋                                    | 綠覆蓋                                                                                                                                                                              |
| 1) 西濱大橋下游_空灑草籽80公頃                                                                                                     | 1) 44號越堤路段_空灑草籽60公頃                                    |                                                    |                                        | 1) 中沙大橋上游至高鐵橋上游_空灑草籽217公頃                                                                                                                                                        |
| 防洪植栽                                                                                                                   | 防洪植栽                                                   | 防洪植栽                                               | 防洪植栽                                   | 防洪植栽                                                                                                                                                                             |
| 1) 5-11號越堤_防洪林帶2公里                                                                                                     | 1) 雷厝堤防_水防道路植栽2公里                                      | 1) 43-45號越堤_防洪林帶1.2公里                              |                                        |                                                                                                                                                                                  |
| 其他覆蓋                                                                                                                   | 其他覆蓋                                                   | 其他覆蓋                                               | 其他覆蓋                                   | 其他覆蓋                                                                                                                                                                             |
| 1) 7號越堤_簡易灑水設施6.4公頃<br>2) 5-11號越堤_簡易灑水設施9.6公頃<br>3) 0-22號水線更換11公頃<br>4) 7號越堤路段上下游_鋪設稻草蓆40公頃<br>5) 5號越堤路段下游低灘地_鋪設稻草22公頃 | 1) 40號越堤路上游低灘地_鋪設稻草蓆20公頃<br>2) 西濱上游北岸(13號越堤)_鋪設稻草蓆10公頃 | 1) 43-45號越堤_簡易灑水設施9.6公頃<br>2) 74號越堤路段低灘地_鋪設稻草蓆90公頃 | 1) 61號越堤路段低灘地_鋪設防塵網50公頃                | 1)西螺大橋下游南岸低灘地_鋪設稻草蓆6公頃<br>2)高鐵大橋上游南岸低灘地鋪設稻草蓆20公頃<br>3)中沙大橋上游河中低灘地鋪設防塵網20公頃<br>4) 溪州大橋下游北岸低灘地_鋪設稻草蓆10公頃<br>5)西螺大橋上游低灘地_鋪設稻草蓆24公頃<br>6)中沙大橋上游低灘地_鋪設稻草蓆26公頃<br>7)高鐵橋上游低灘地_鋪設稻草蓆14公頃 |
