




揚塵防治 週報表

114/07/28~114/08/03

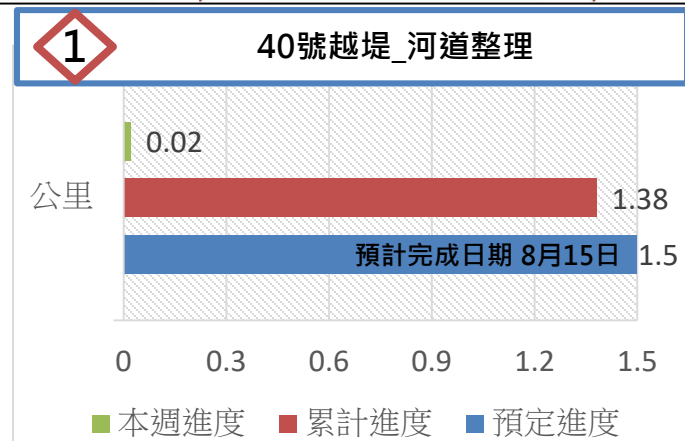

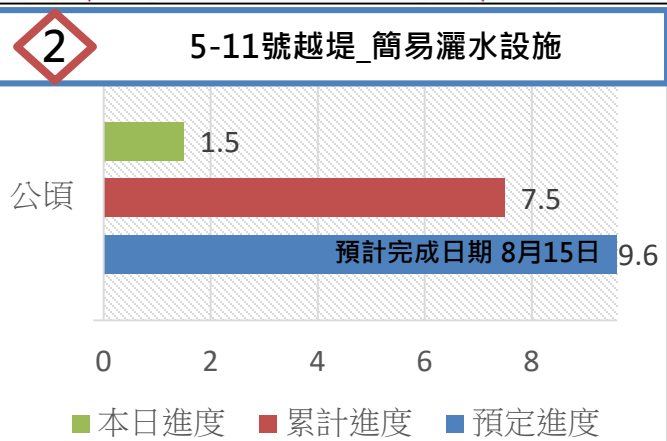

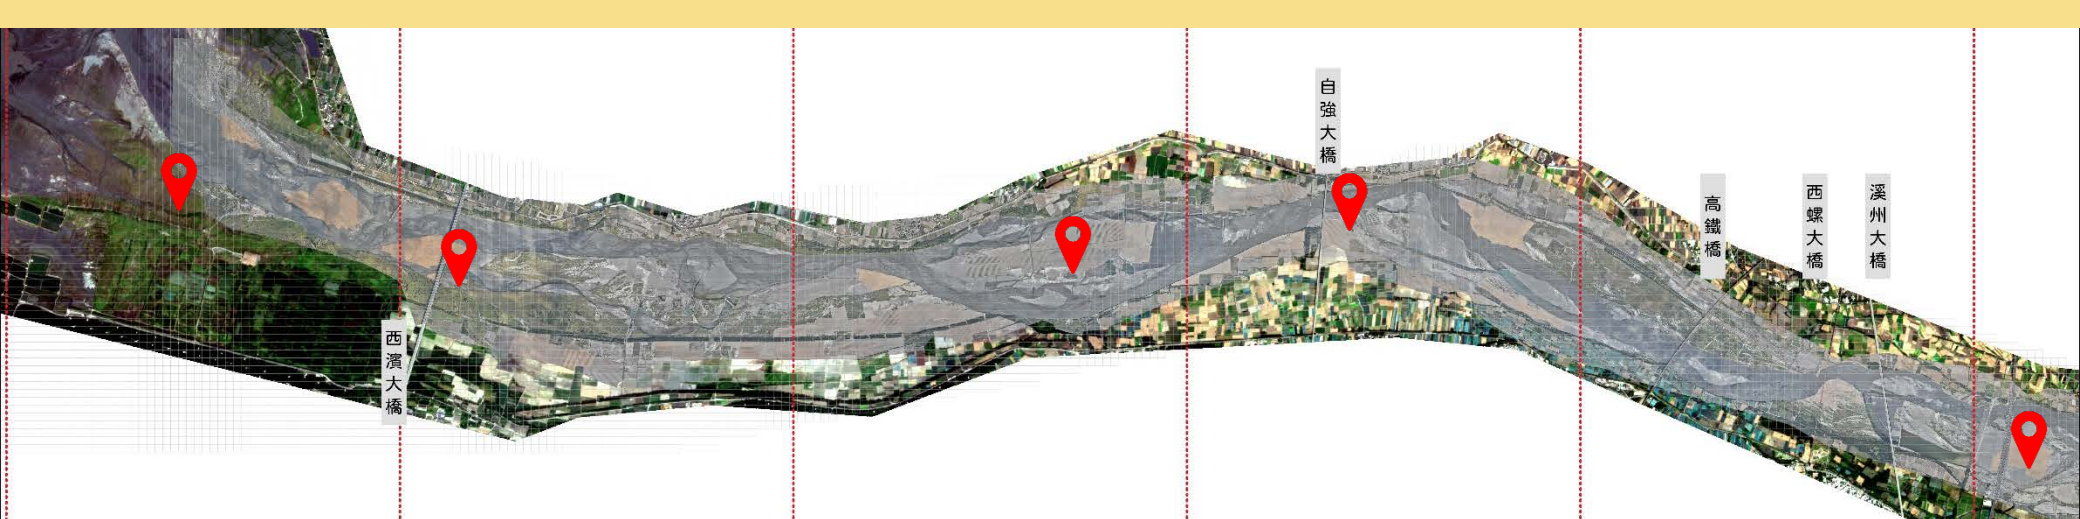

各區 空拍現況

第一區 麥寮出海口 下游



第二區 西濱大橋 上游



第三區 跨河電塔 下游



第四區 自強大橋 上游



第五區 中沙大橋 下游



114年度

揚塵KPI進度管制

執行期程:114年5月至115年4月

- 抑制面積
- 進度



其他覆蓋

- 目標值：300 公頃
- 已完成：23.5公頃
- 達成率：7.8%



水覆蓋

- 目標值：400公頃
- 已完成：- 公頃
- 達成率：- %



河道整理

- 目標值：4 公里
- 已完成：1.38公里
- 達成率：34.5%



防洪植栽


- 目標值：4 公里
- 已完成：1.2 公里
- 達成率：30%



綠覆蓋

- 目標值：250 公頃
- 已完成：-公頃
- 達成率：-%



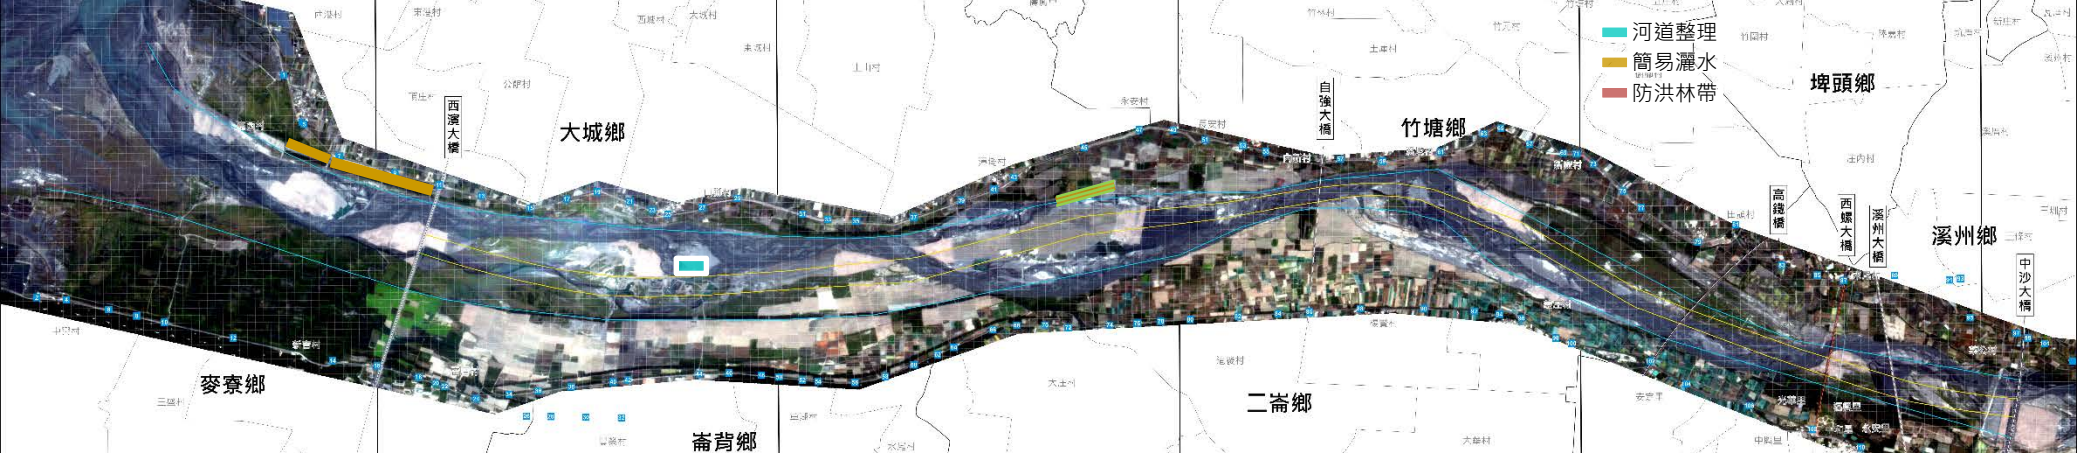

水覆蓋	水覆蓋	水覆蓋	水覆蓋	水覆蓋
河道整理	河道整理	河道整理	河道整理	河道整理
	1) 40號越堤_河道整理1.38公里			
綠覆蓋	綠覆蓋	綠覆蓋	綠覆蓋	綠覆蓋
防洪植栽	防洪植栽	防洪植栽	防洪植栽	防洪植栽
		1) 43-45號越堤_防洪林帶1.2公里		
其他覆蓋	其他覆蓋	其他覆蓋	其他覆蓋	其他覆蓋
1) 7號越堤_簡易灑水設施6.4公頃 2) 5-11號越堤_簡易灑水設施7.5公頃		1) 43-45號越堤_簡易灑水設施9.6公頃		
