


# 揚塵防治 週報表


114/09/15~114/09/21



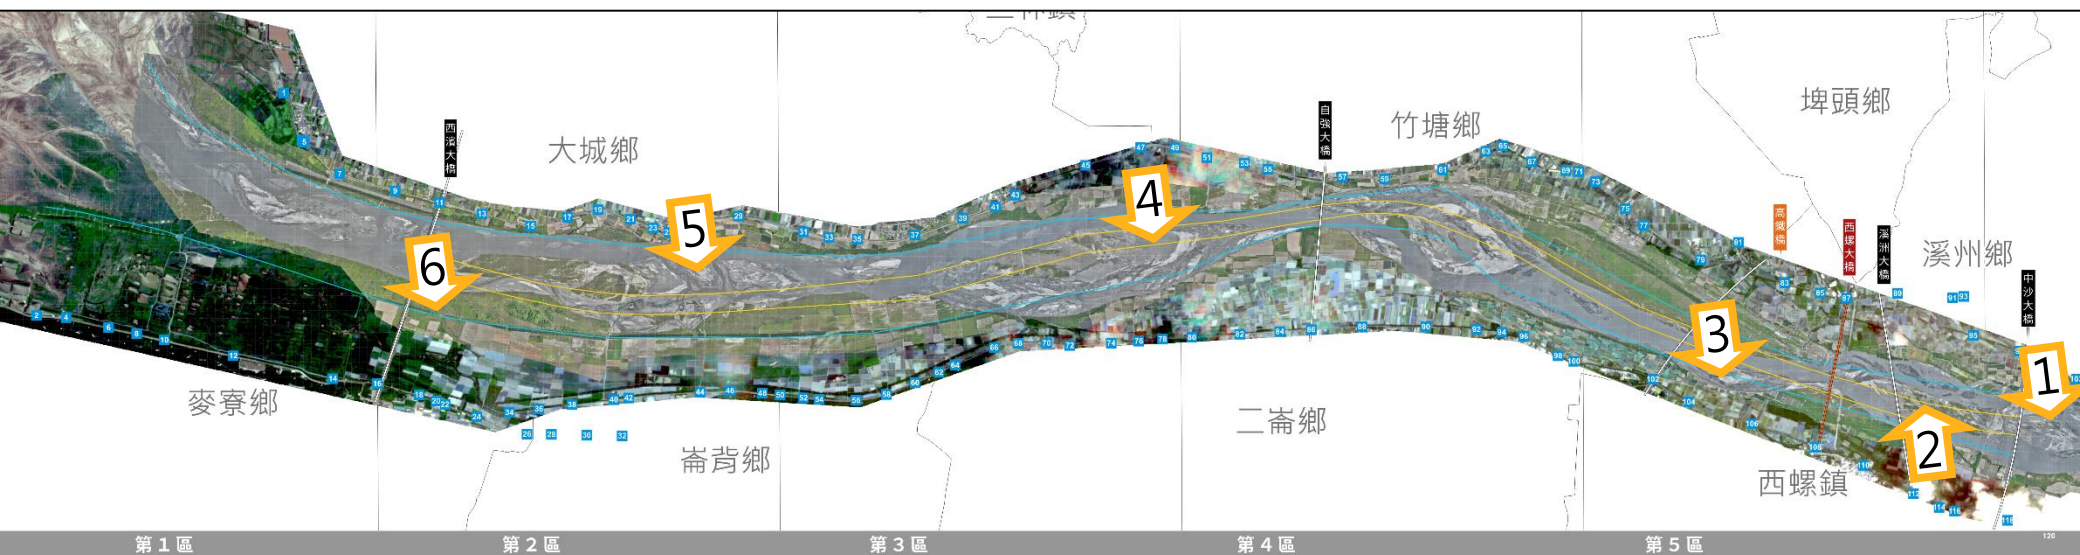


114年8月18日 PLANT 衛星空拍



### 3 高鐵大橋上游南岸低灘地\_鋪設稻草蓆

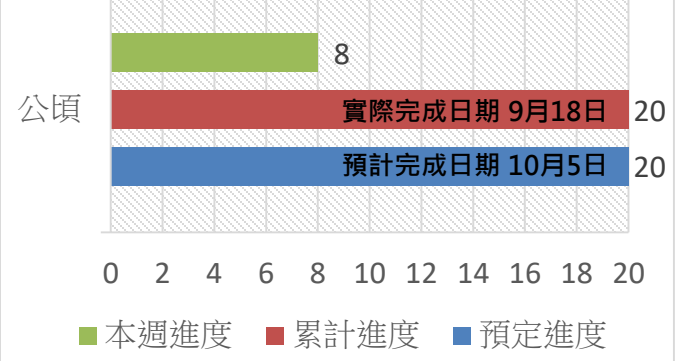


### 2 溪州大橋下游北岸低灘地\_鋪設稻草蓆

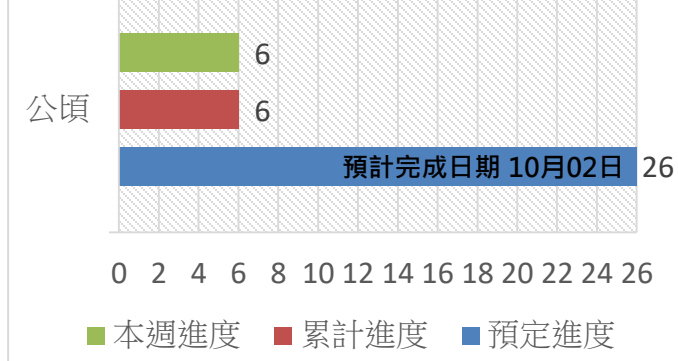


### 1 中沙大橋上游河中低灘地\_鋪設防塵網

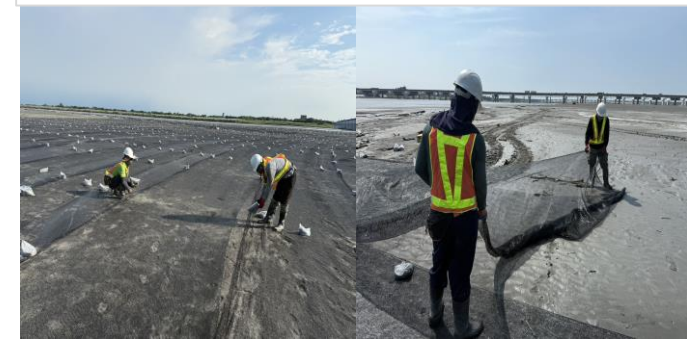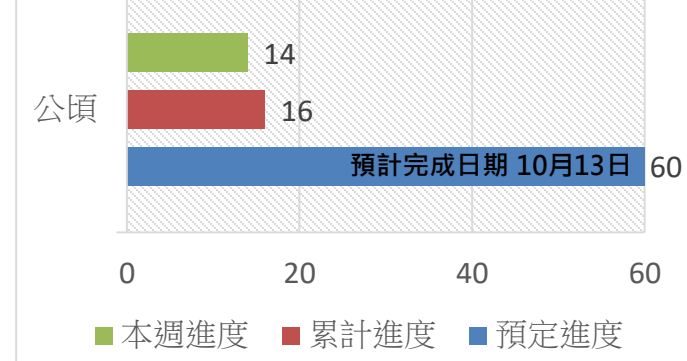

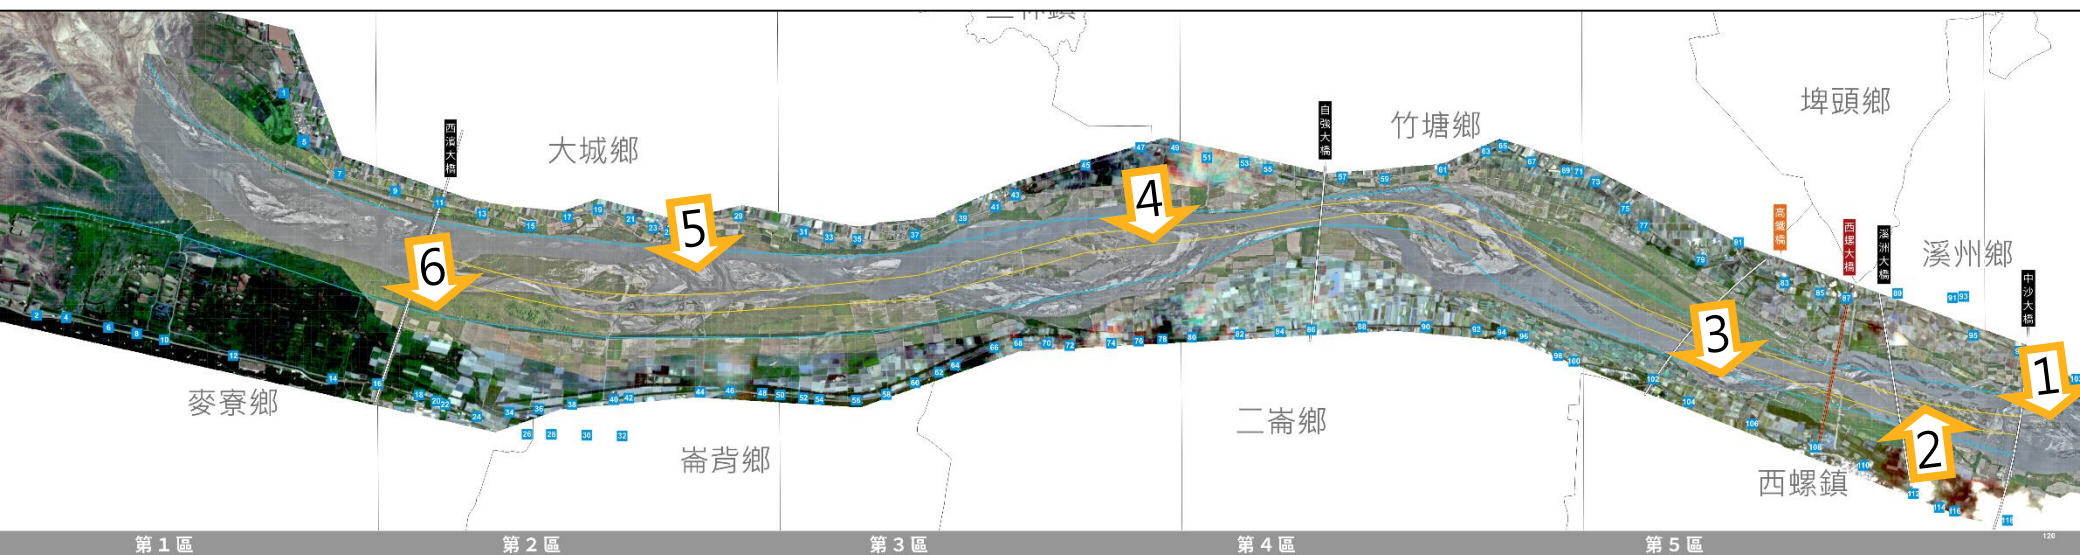


114年8月18日 PLANT 衛星空拍


### 6 雷厝堤防\_水防道路植栽

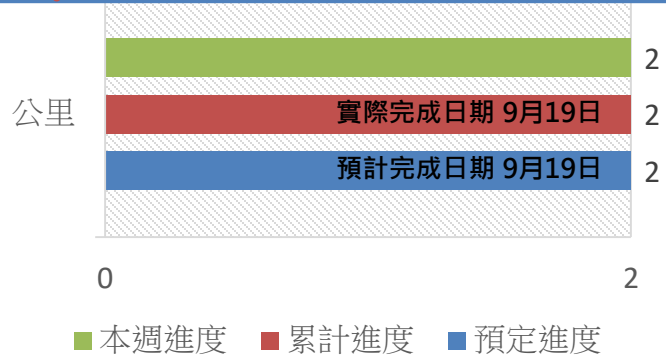


### 5 40號越堤路段低灘地\_鋪設稻草蓆

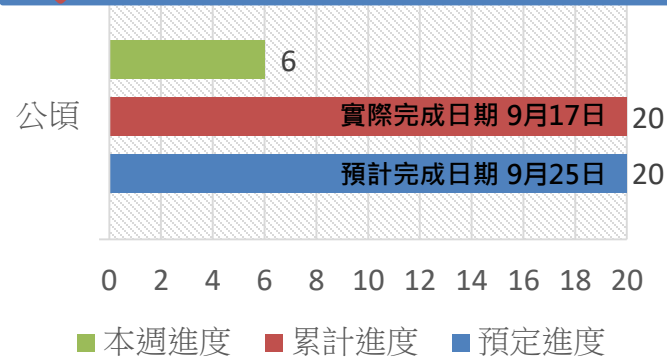

### 4 74號越堤路段低灘地\_鋪設稻草蓆

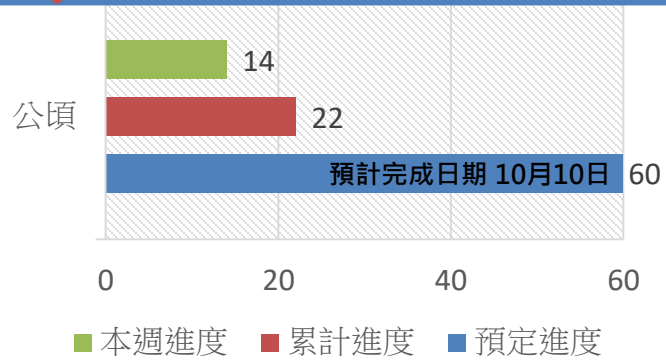

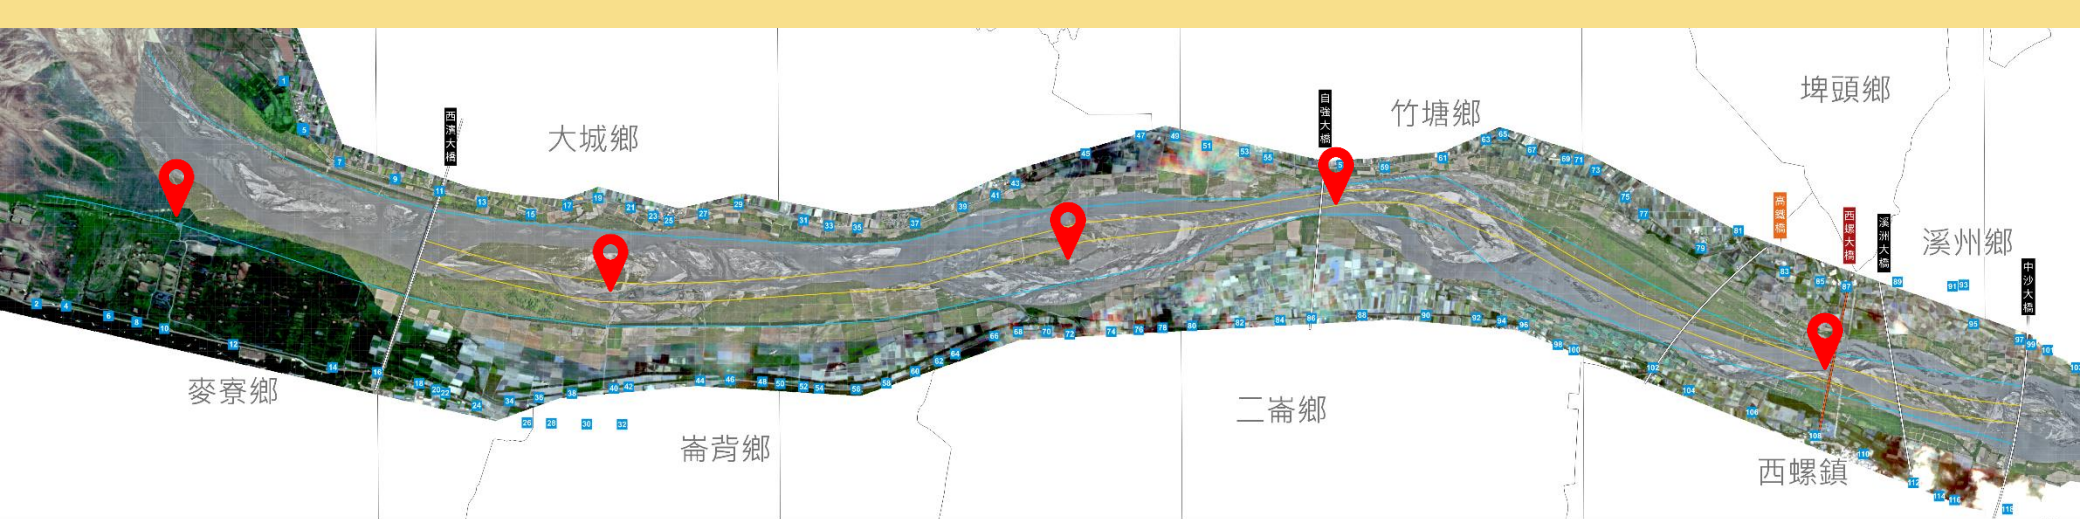

# 各區 空拍現況

**第一區** 麥寮出海口 0號井



**第二區** 40號越堤路段 下游



**第三區** 跨河電塔 下游



**第四區** 自強大橋 上游



**第五區** 西螺大橋 上下游



114年度

揚塵KPI進度管制

執行期程:114年5月至115年4月

- 抑制面積
- 進度



## 其他覆蓋

- 目標值：300 公頃
- 已完成：126.6公頃
- 達成率：42.2%



## 水覆蓋

- 目標值：400公頃
- 已完成：170 公頃
- 達成率：42.5 %



## 河道整理

- 目標值：4 公里
- 已完成：1.5公里
- 達成率：37.5%



## 防洪植栽


- 目標值：4 公里
- 已完成：5.2公里
- 達成率：130 %



## 綠覆蓋

- 目標值：250 公頃
- 已完成：357 公頃
- 達成率：142.8%



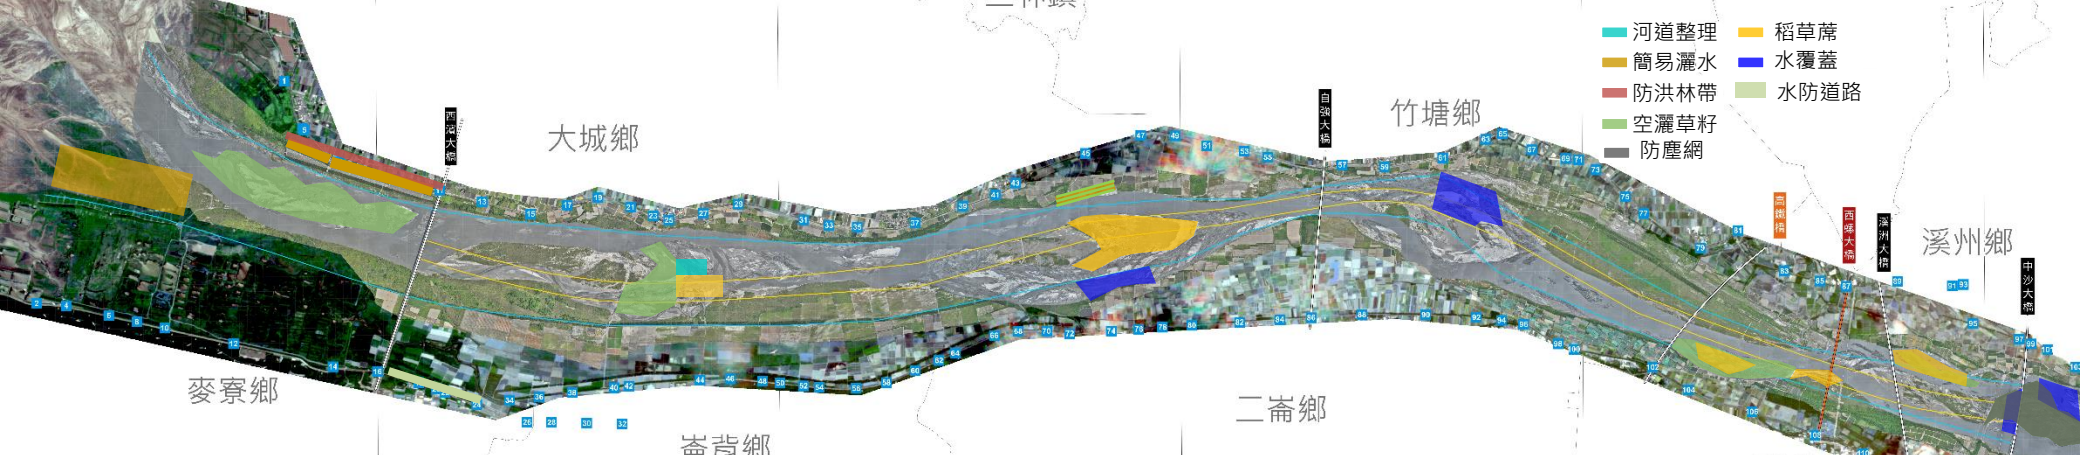

| 水覆蓋                                                               | 水覆蓋                      | 水覆蓋                                                | 水覆蓋               | 水覆蓋                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                   |                          | 1) 74號越堤路段_蓄水池30公頃                                 | 1)61號越堤路段_蓄水池60公頃 | 1) 中沙大橋上游_蓄水池50公頃<br>2) 中沙大橋下游_蓄水池30公頃                                                                |
| 河道整理                                                              | 河道整理                     | 河道整理                                               | 河道整理              | 河道整理                                                                                                  |
|                                                                   | 1) 40號越堤_河道整理1.5公里       |                                                    |                   |                                                                                                       |
| 綠覆蓋                                                               | 綠覆蓋                      | 綠覆蓋                                                | 綠覆蓋               | 綠覆蓋                                                                                                   |
| 1) 西濱大橋下游_空灑草籽80公頃                                                | 1) 44號越堤路段_空灑草籽60公頃      |                                                    |                   | 1) 中沙大橋上游至高鐵橋上游_空灑草籽217公頃                                                                             |
| 防洪植栽                                                              | 防洪植栽                     | 防洪植栽                                               | 防洪植栽              | 防洪植栽                                                                                                  |
| 1) 5-11號越堤_防洪林帶2公里                                                | 1) 雷厝堤防_水防道路植栽2公里        | 1) 43-45號越堤_防洪林帶1.2公里                              |                   |                                                                                                       |
| 其他覆蓋                                                              | 其他覆蓋                     | 其他覆蓋                                               | 其他覆蓋              | 其他覆蓋                                                                                                  |
| 1) 7號越堤_簡易灑水設施6.4公頃<br>2) 5-11號越堤_簡易灑水設施9.6公頃<br>3) 0-22號水線更換11公頃 | 1) 40號越堤路上游低灘地_鋪設稻草蓆20公頃 | 1) 43-45號越堤_簡易灑水設施9.6公頃<br>2) 74號越堤路段低灘地_鋪設稻草蓆22公頃 |                   | 1)西螺大橋下游南岸低灘地_鋪設稻草蓆6公頃<br>2)高鐵大橋上游南岸低灘地鋪設稻草蓆20公頃<br>3)中沙大橋上游河中低灘地鋪設防塵網16公頃<br>4) 溪州大橋下游北岸低灘地_鋪設稻草蓆6公頃 |
