



# 揚塵防治 週報表

114/01/13~114/01/19




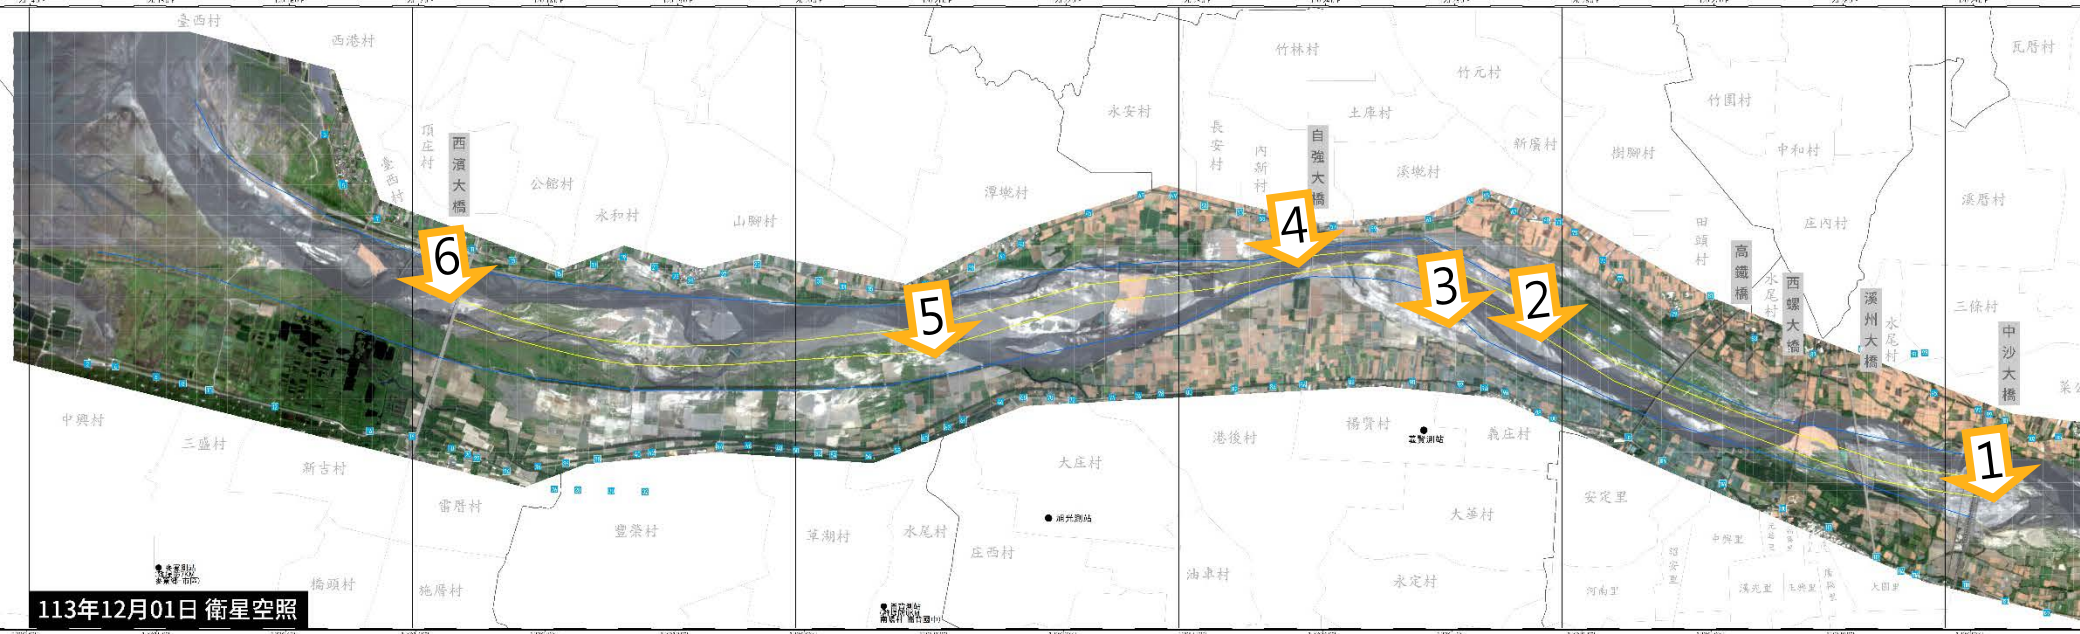



### 3 92號越堤路河中灘地\_防塵網鋪設

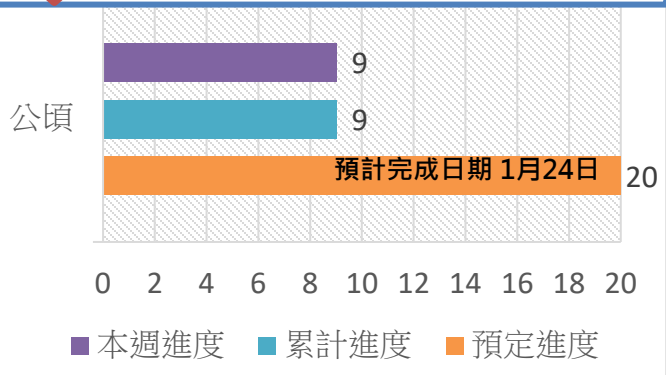


### 2 96號越堤路\_攔水土堤

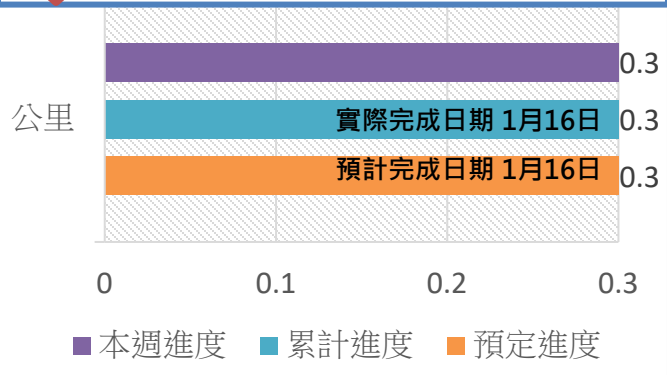


### 1 中沙大橋上游低灘地\_稻草蓆鋪設

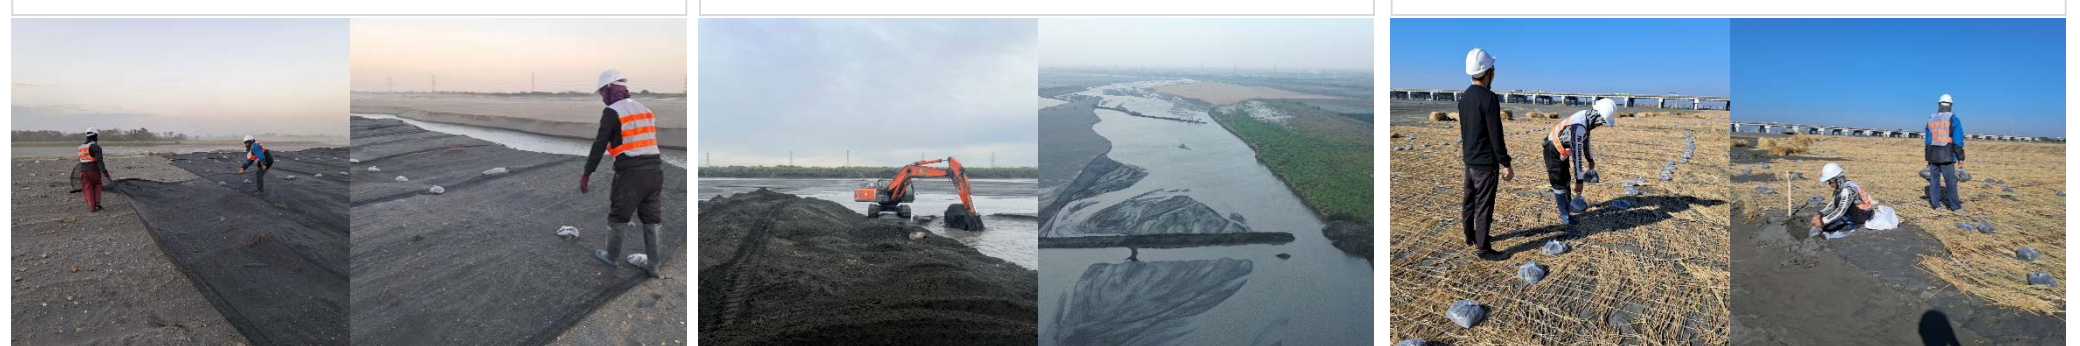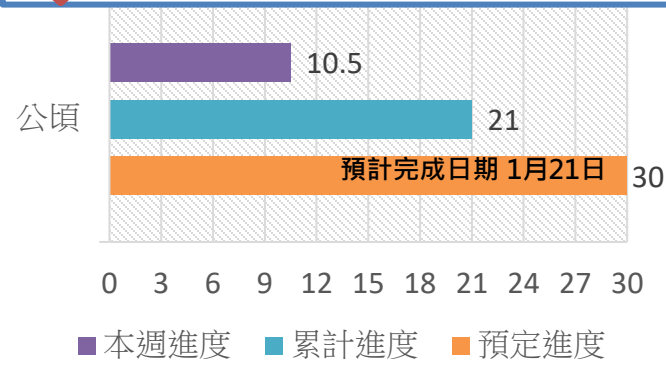


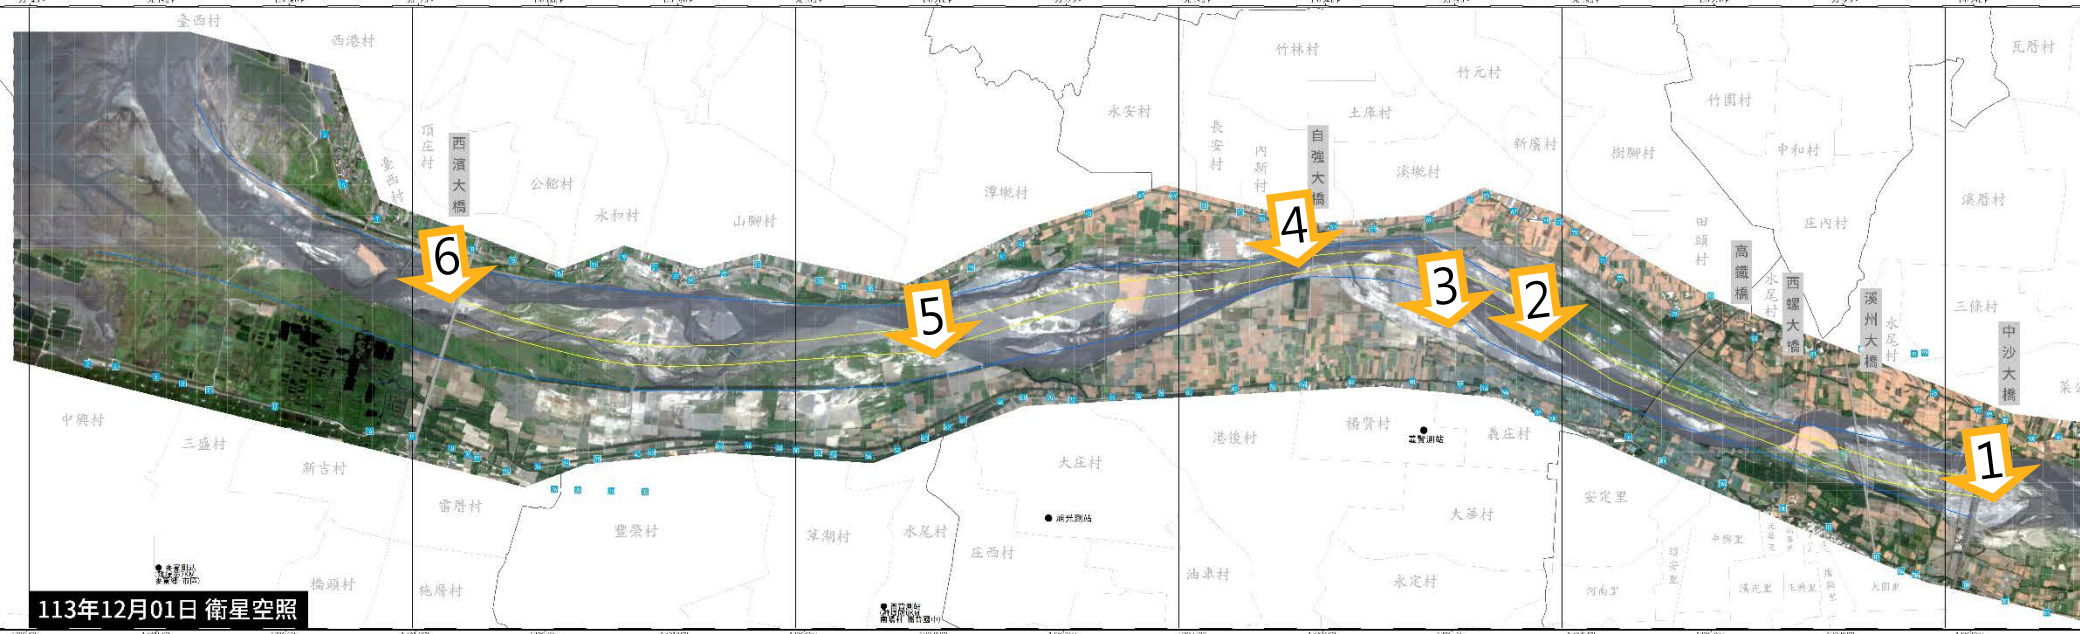



### 6 西濱大橋上下游低灘地\_稻草蓆鋪設

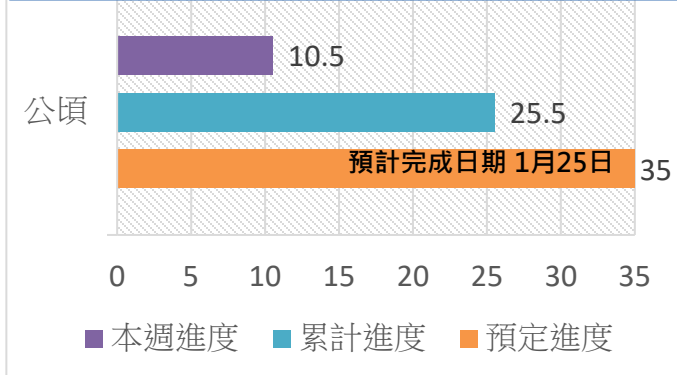


### 5 64號越堤路段低灘地\_稻草蓆鋪設

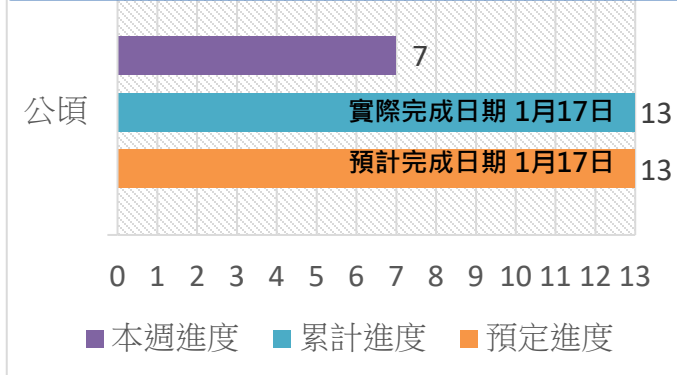

### 4 自強大橋橋下\_防塵網鋪設

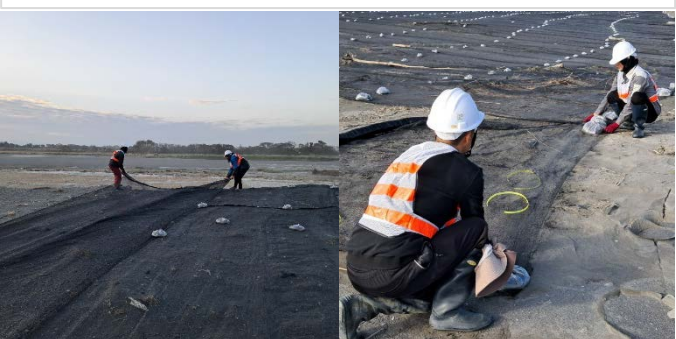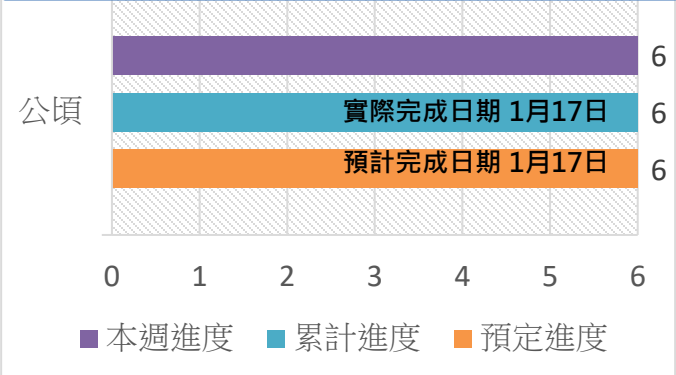

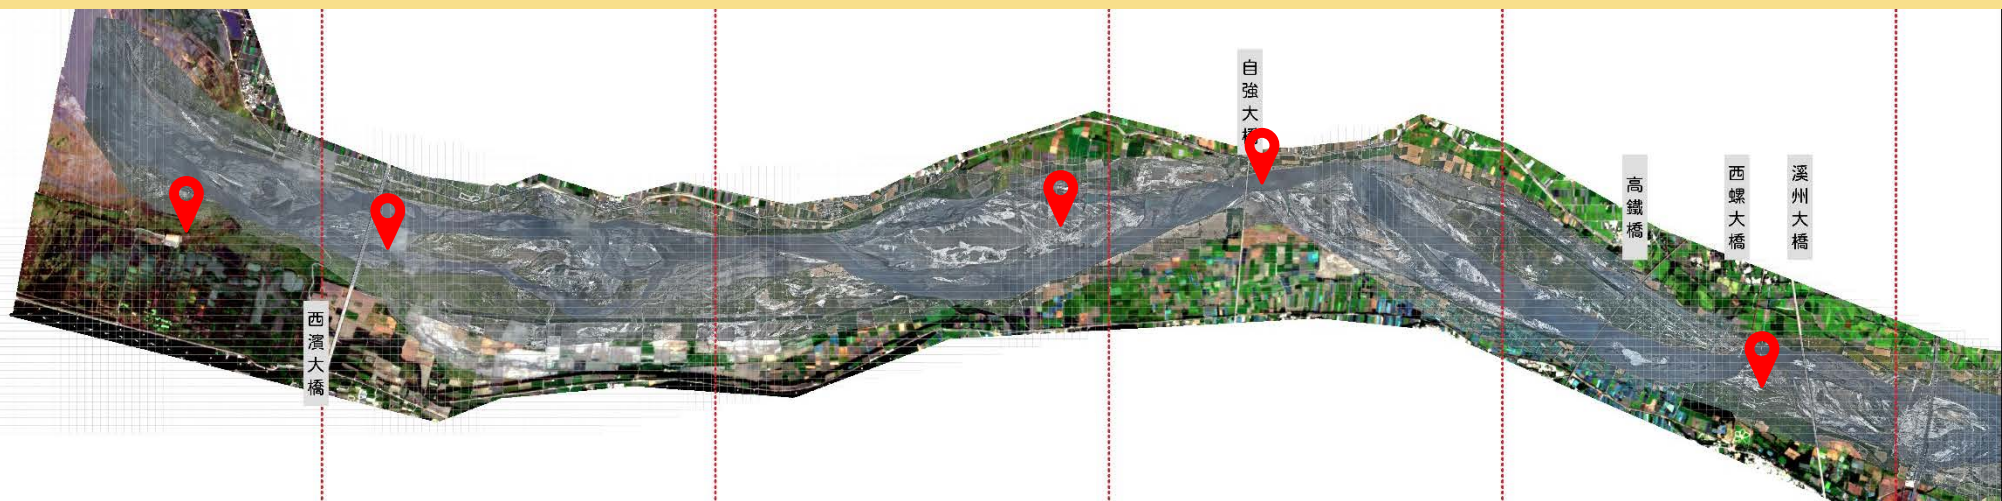

# 各區 空拍現況

**第一區** 麥寮出海口 0號井



**第二區** 西濱大橋 上下游



**第三區** 跨河電塔 下游



**第四區** 自強大橋 上游



**第五區** 西螺大橋 上游



113年度

揚塵KPI進度管制

執行期程:113年5月至114年4月

- 抑制面積
- 進度



## 其他覆蓋

- 目標值 : 300 公頃
- 已完成 : 581.5公頃
- 達成率 : 193.8%



## 水覆蓋

- 目標值 : 400 公頃
- 已完成 : 485 公頃
- 達成率 : 121.3 %



## 河道整理

- 目標值 : 4 公里
- 已完成 : 2.30公里
- 達成率 : 57.5%



## 防洪植栽


- 目標值 : 4 公里
- 已完成 : 6 公里
- 達成率 : 150%



## 綠覆蓋

- 目標值 : 250 公頃
- 已完成 : 600公頃
- 達成率 : 240%

揚塵抑制措施

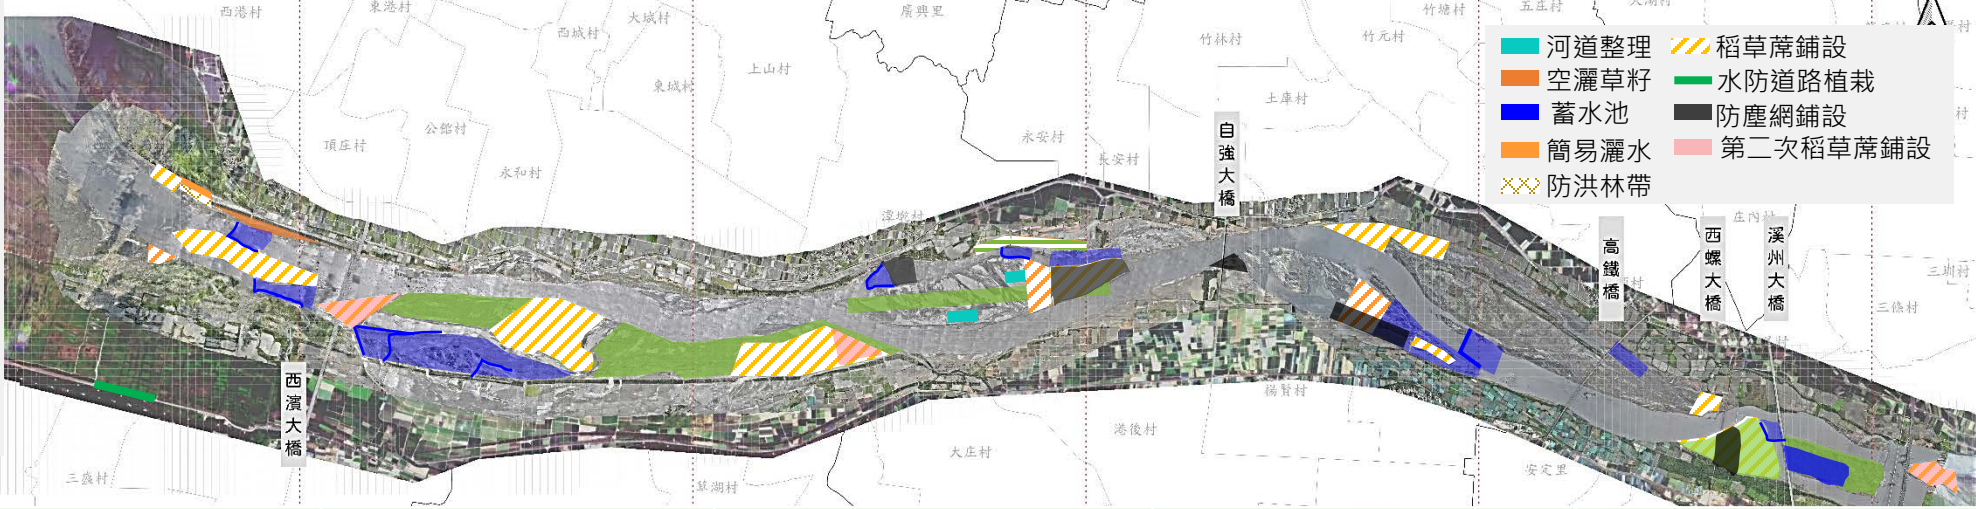

| 水覆蓋                                                                                                                         | 水覆蓋                                                                                                    | 水覆蓋                                                                                                                                                                                                 | 水覆蓋                                                                                                                                                                                                     | 水覆蓋                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1) 西濱下游南岸_蓄水池50公頃<br>2) 西濱大橋下游北岸(7號越堤)_蓄水池20公頃                                                                              | 1)西濱大橋上游南岸_蓄水池120公頃<br>2)20號越堤路段_蓄水池20公頃<br>3)42號越堤路段_蓄水池20公頃                                          | 1) 51號越堤路段A區_蓄水池30公頃<br>2) 51號越堤路段B區_蓄水池30公頃<br>3) 51號越堤路段第三階段_蓄水池10公頃<br>4) 39號越堤路段_蓄水池30公頃                                                                                                        | 1)94號越堤路段_蓄水池塘30公頃<br>2)94號越堤路段第二階段_蓄水池塘20公頃<br>3)96號越堤路_蓄水池塘40公頃                                                                                                                                       | 1) 高鐵橋下_蓄水池塘20公頃<br>2) 溪州大橋上游_蓄水池塘30公頃<br>3) 溪州大橋下游_蓄水池15公頃                                                                                         |
| 河道整理                                                                                                                        | 河道整理                                                                                                   | 河道整理                                                                                                                                                                                                | 河道整理                                                                                                                                                                                                    | 河道整理                                                                                                                                                |
| 1) 西濱大橋下游北岸_河道整理0.6公里                                                                                                       |                                                                                                        | 1) 跨河電塔北岸_河道整理1.2公里<br>2) 跨河電塔下游段_河中灘地H區0.5公里                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                     |
| 綠覆蓋                                                                                                                         | 綠覆蓋                                                                                                    | 綠覆蓋                                                                                                                                                                                                 | 綠覆蓋                                                                                                                                                                                                     | 綠覆蓋                                                                                                                                                 |
| 1) 西濱大橋下游南北岸_空灑草籽29公頃                                                                                                       | 1) 西濱大橋上游南岸_空灑草籽119公頃                                                                                  | 1) 68-44號越堤路段_空灑草籽142公頃<br>2) 51號越堤路段河中灘地_空灑草籽200公頃                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                         | 1) 西螺大橋上游南岸_空灑草籽55公頃<br>2) 溪州大橋上游南岸_空灑草籽55公頃                                                                                                        |
| 防洪植栽                                                                                                                        | 防洪植栽                                                                                                   | 防洪植栽                                                                                                                                                                                                | 防洪植栽                                                                                                                                                                                                    | 防洪植栽                                                                                                                                                |
| 1) 5號越堤路段_培厚區_防洪林帶0.6公里<br>2) 12號越堤路段_水防道路植栽2公里                                                                             |                                                                                                        | 1) 51號越堤路段_培厚區_防洪林帶1.2公里<br>2) 49號越堤路段_培厚區_防洪林帶2.2公里                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                     |
| 其他覆蓋                                                                                                                        | 其他覆蓋                                                                                                   | 其他覆蓋                                                                                                                                                                                                | 其他覆蓋                                                                                                                                                                                                    | 其他覆蓋                                                                                                                                                |
| 1) 西濱大橋下游北岸_簡易灑水3公頃<br>2) 5-7號越堤高灘地_稻草蓆鋪設28公頃<br>3) 10號越堤路段高灘地_稻草蓆鋪設3公頃<br>4) 西濱大橋下游河中灘地_稻草蓆鋪11公頃<br>5) 7號越堤路段河道灘地_稻草蓆鋪42公頃 | 1) 44-40號越堤路段_稻草蓆覆蓋56公頃<br>2) 西濱大橋南岸灘地_稻草蓆鋪設20公頃<br>3) 西濱大橋上游南岸灘地_稻草蓆鋪設24公頃<br>4) 西濱大橋上下游低灘地_稻草蓆25.5公頃 | 1) 51號越堤路_培厚區_簡易灑水6公頃<br>2) 大義崙排水_稻草蓆鋪設47公頃<br>3) 跨河電塔上游_稻草蓆覆蓋32公頃<br>4) 跨河電塔下游河中灘地E區_稻草蓆鋪設27公頃<br>5) 跨河電塔下游河道灘地(2)_稻草蓆鋪15公頃<br>6) 49號越堤路段_簡易灑水系統11公頃<br>7) 39號越堤路段_防塵網9公頃<br>8) 64號越堤路段低灘地_稻草蓆13公頃 | 1)自橋大橋上游右岸_稻草蓆鋪設35公頃。<br>2)跨河電塔上游河道灘地(1)_防塵網鋪設37公頃。<br>3)跨河電塔上游河道灘地(1)_防塵網鋪設3公頃。<br>4)自強大橋上游北岸_稻草蓆10公頃<br>5)94號越堤路段低灘地_稻草蓆13公頃<br>6)63-67號越堤路段低灘地_稻草蓆20公頃<br>7)92號越堤路河中灘地_防塵網鋪設9公頃<br>8)自強大橋橋下_防塵網鋪設6公頃 | 1)西螺大橋上游南岸_稻草蓆鋪設16公頃<br>2)西螺大橋下游北岸_稻草蓆鋪設7公頃<br>3)中沙大橋上游河中灘地_稻草蓆鋪設10公頃<br>4)西螺大橋上游南岸_稻草蓆鋪設(第二次)14公頃<br>5)溪州大橋上游低灘地_防塵網鋪設8公頃<br>6)中沙大橋上游低灘地_稻草蓆鋪設21公頃 |

