

揚塵防治 週報表


114/03/10~114/03/16






2


9號越堤路_河道整理

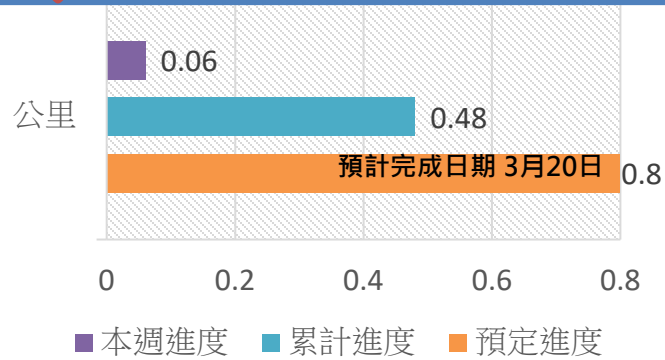

1

43-45號越堤_河道整理

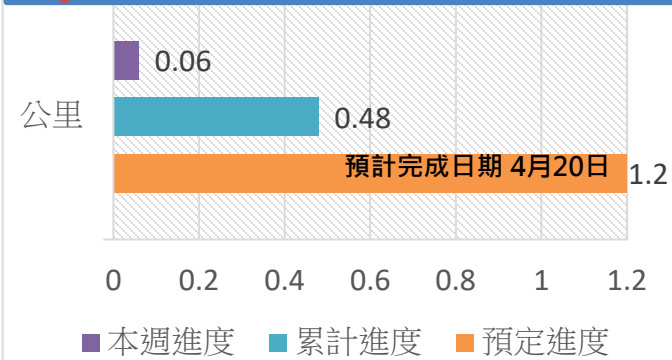

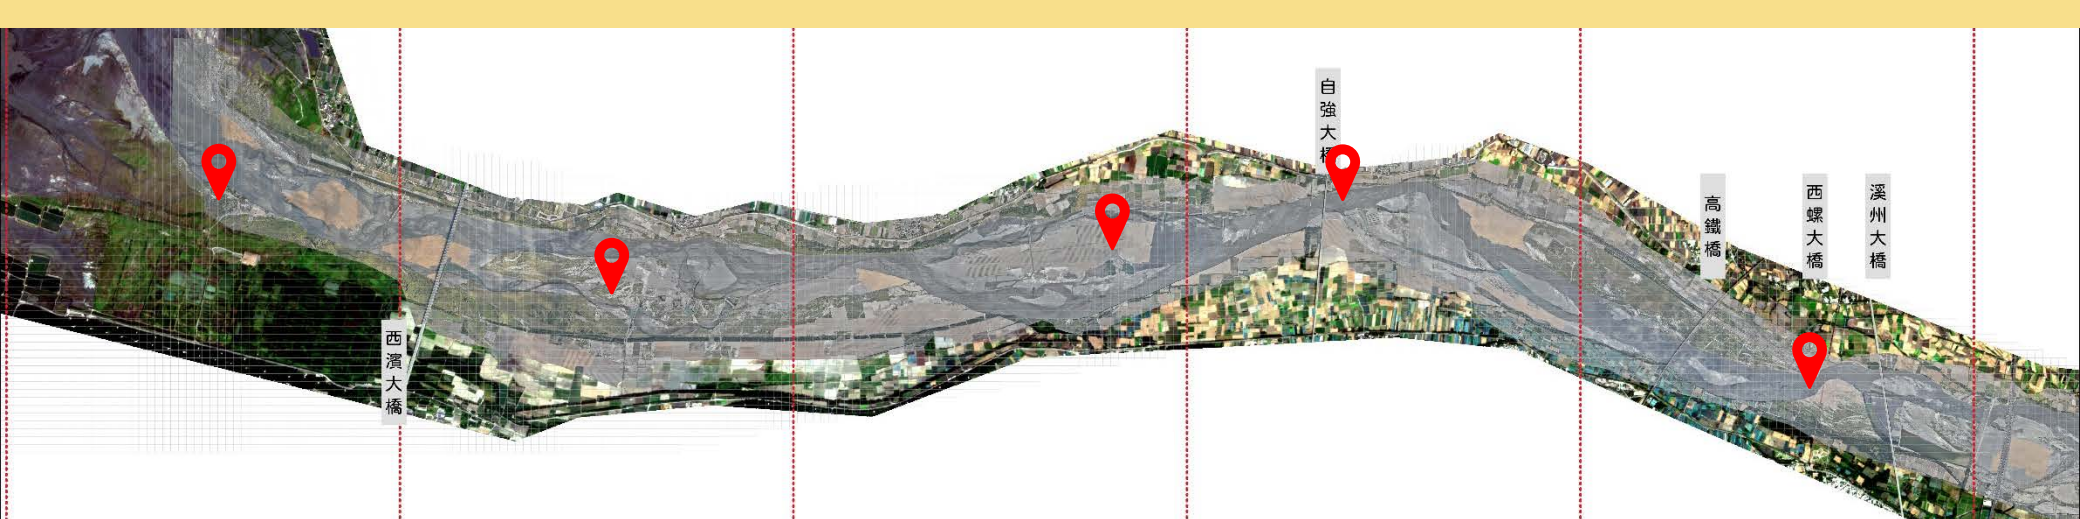

各區 空拍現況

第一區

麥寮出海口



第二區

40號越堤路 上下游



第三區

跨河電塔 下游



第四區

自強大橋 上游



第五區

西螺大橋 上下游



113年度

揚塵KPI進度管制

執行期程:113年5月至114年4月

- 抑制面積
- 進度



其他覆蓋

- 目標值：300 公頃
- 已完成：631 公頃
- 達成率：210.3%



水覆蓋

- 目標值：400 公頃
- 已完成：485 公頃
- 達成率：121.3 %



河道整理

- 目標值：4 公里
- 已完成：3.26公里
- 達成率：81.5%



防洪植栽

- 目標值：4 公里
- 已完成：6 公里
- 達成率：150%




綠覆蓋

- 目標值：250 公頃
- 已完成：600公頃
- 達成率：240%



揚塵抑制措施

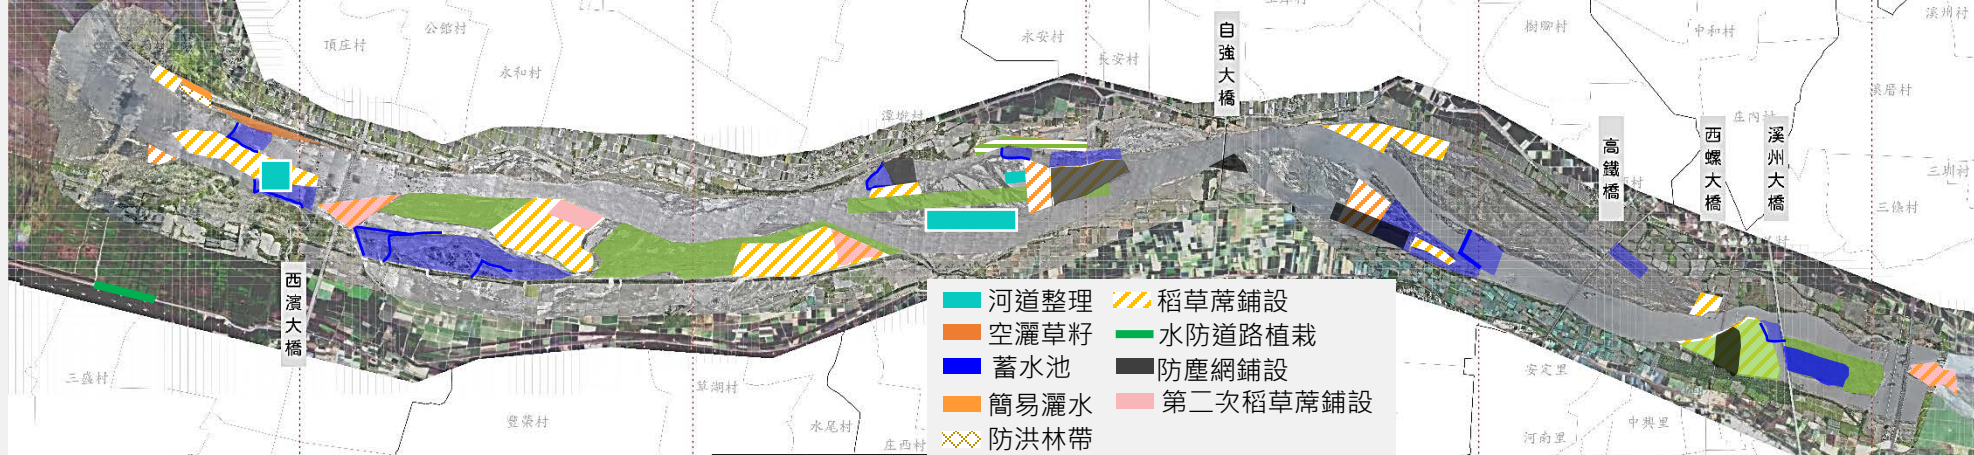

水覆蓋	水覆蓋	水覆蓋	水覆蓋	水覆蓋
1) 西濱下游南岸_蓄水池50公頃 2) 西濱大橋下游北岸(7號越堤)_蓄水池20公頃	1)西濱大橋上游南岸_蓄水池120公頃 2)20號越堤路段_蓄水池20公頃 3)42號越堤路段_蓄水池20公頃	1) 51號越堤路段A區_蓄水池30公頃 2) 51號越堤路段B區_蓄水池30公頃 3) 51號越堤路段第三階段_蓄水池10公頃 4) 39號越堤路段_蓄水池30公頃	1)94號越堤路段_蓄水池塘30公頃 2)94號越堤路段第二階段_蓄水池塘20公頃 3)96號越堤路_蓄水池塘40公頃	1) 高鐵橋下_蓄水池塘20公頃 2) 溪州大橋上游_蓄水池塘30公頃 3) 溪州大橋下游_蓄水池15公頃
河道整理	河道整理	河道整理	河道整理	河道整理
1) 西濱大橋下游北岸_河道整理0.6公里 2) 9號越堤_河道整理0.48公里		1) 跨河電塔北岸_河道整理1.2公里 2) 跨河電塔下游段_河中灘地H區0.5公里 3) 43-45號越堤_河道整理0.48公里		
綠覆蓋	綠覆蓋	綠覆蓋	綠覆蓋	綠覆蓋
1) 西濱大橋下游南北岸_空灑草籽29公頃	1) 西濱大橋上游南岸_空灑草籽119公頃	1) 68-44號越堤路段_空灑草籽142公頃 2) 51號越堤路段河中灘地_空灑草籽200公頃		1) 西螺大橋上游南岸_空灑草籽55公頃 2) 溪州大橋上游南岸_空灑草籽55公頃
防洪植栽	防洪植栽	防洪植栽	防洪植栽	防洪植栽
1) 5號越堤路段_培厚區_防洪林帶0.6公里 2) 12號越堤路段_水防道路植栽2公里		1) 51號越堤路段_培厚區_防洪林帶1.2公里 2) 49號越堤路段_培厚區_防洪林帶2.2公里		
其他覆蓋	其他覆蓋	其他覆蓋	其他覆蓋	其他覆蓋
1) 西濱大橋下游北岸_簡易灑水3公頃 2) 5-7號越堤高灘地_稻草蓆鋪設28公頃 3) 10號越堤路段高灘地_稻草蓆鋪設3公頃 4) 西濱大橋下游河中灘地_稻草蓆鋪11公頃 5) 7號越堤路段河道灘地_稻草蓆鋪42公頃	1) 44-40號越堤路段_稻草蓆覆蓋56公頃 2) 西濱大橋南岸灘地_稻草蓆鋪設20公頃 3) 西濱大橋上游南岸灘地_稻草蓆鋪設24公頃 4) 西濱大橋上下游低灘地_稻草蓆33公頃 5) 44號越堤路段低灘地_稻草蓆鋪9公頃	1) 51號越堤路_培厚區_簡易灑水6公頃 2) 大義崙排水_稻草蓆鋪設47公頃 3) 跨河電塔上游_稻草蓆覆蓋32公頃 4) 跨河電塔下游河中灘地E區_稻草蓆鋪設27公頃 5) 跨河電塔下游河道灘地(2)_稻草蓆鋪15公頃 6) 49號越堤路段_簡易灑水系統11公頃 7) 39號越堤路段_防塵網9公頃 8) 64號越堤路段低灘地_稻草蓆13公頃 9) 39號越堤路段河中灘地_稻草蓆13公頃	1)自橋大橋上游右岸_稻草蓆鋪設35公頃。 2)跨河電塔上游河道灘地(1)_防塵網鋪設37公頃。 3)跨河電塔上游河道灘地(1)_防塵網鋪設3公頃。 4)自強大橋上游北岸_稻草蓆10公頃 5)94號越堤路段低灘地_稻草蓆13公頃 6)63-67號越堤路段低灘地_稻草蓆20公頃 7)92號越堤路河中灘地_防塵網鋪設20公頃 8)自強大橋橋下_防塵網鋪設6公頃	1)西螺大橋上游南岸_稻草蓆鋪設16公頃 2)西螺大橋下游北岸_稻草蓆鋪設7公頃 3)中沙大橋上游河中灘地_稻草蓆鋪設10公頃 4)西螺大橋上游南岸_稻草蓆鋪設(第二次)14公頃 5)溪州大橋上游低灘地_防塵網鋪設8公頃 6)中沙大橋上游低灘地_稻草蓆鋪設30公頃
