

揚塵防治 週報表

113/04/15~113/04/21



各區 空拍現況


第一區

麥寮 出海口



第二區

西濱大橋 上游

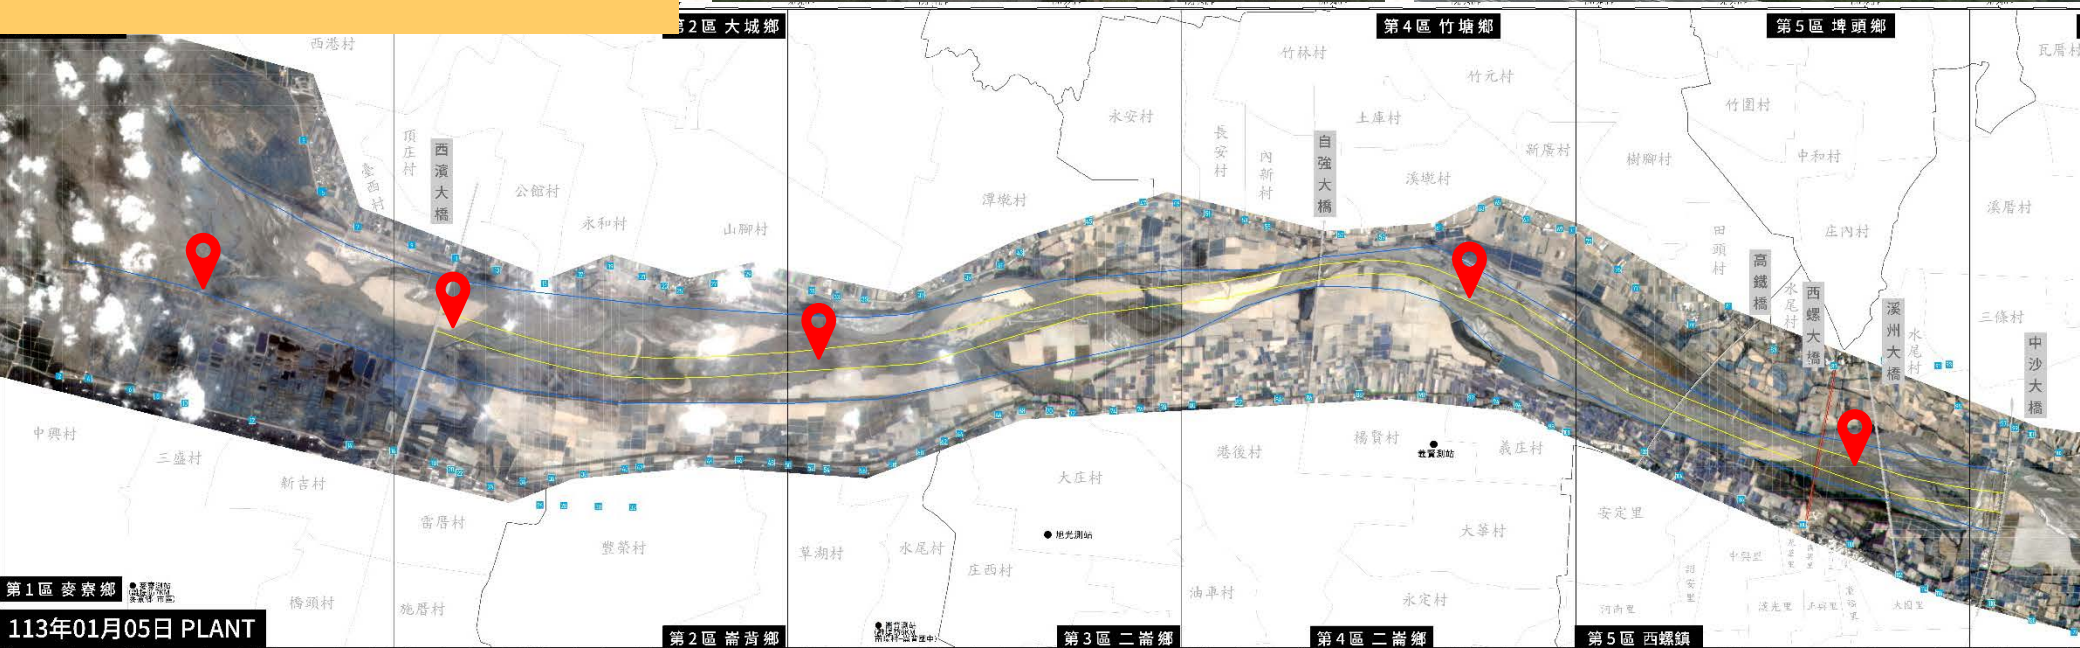

第三區

跨河電塔 上游



第四區

自強大橋 上游



第五區

溪州大橋 上下游



112年度

揚塵KPI進度管制

執行期程:112年5月至113年4月

- 抑制面積
- 進度



其他覆蓋

- 目標值 : 450 公頃
- 已完成 : 356.2 公頃
- 達成率 : 79.2 %



水覆蓋

- 目標值 : 400 公頃
- 已完成 : 370 公頃
- 達成率 : 92.5 %



河道整理

- 目標值 : 2.5 公里
- 已完成 : 4.4 公里
- 達成率 : 176%



防洪植栽

- 目標值 : 6 公里
- 已完成 : 8.05 公里
- 達成率 : 134.2 %



綠覆蓋

- 目標值 : 50 公頃
- 已完成 : 292公頃
- 達成率 : 584 %



營造複式斷面規劃圖

年度	107-109	110-112	113	114	115	合計
KPI(公里)	8	12	4	4	4	20
實際完成	8	12.23	-	-	-	20.23



113年營造複式斷面進度管控

KPI / 4公里

已完成 / 0 km


達成率 / 0 %

執行進度說明：

- 預計113年度案件執行期間為113年5月起，分署將俟相關契約簽訂後，再行擇期召開工作會議研商進場期程。
- 目前將持續辦理現場已完成複式斷面及相關揚塵措施巡查作業，並依河道內水位及裸露地現況，滾動調整因應及緊急應變作為。

水防道路植栽規劃圖

年度	110	111	112	113	114	115	合計
KPI(公里)	1	2	2	2	2	2	11
實際完成	1	2.3	2	-	-	-	5.3

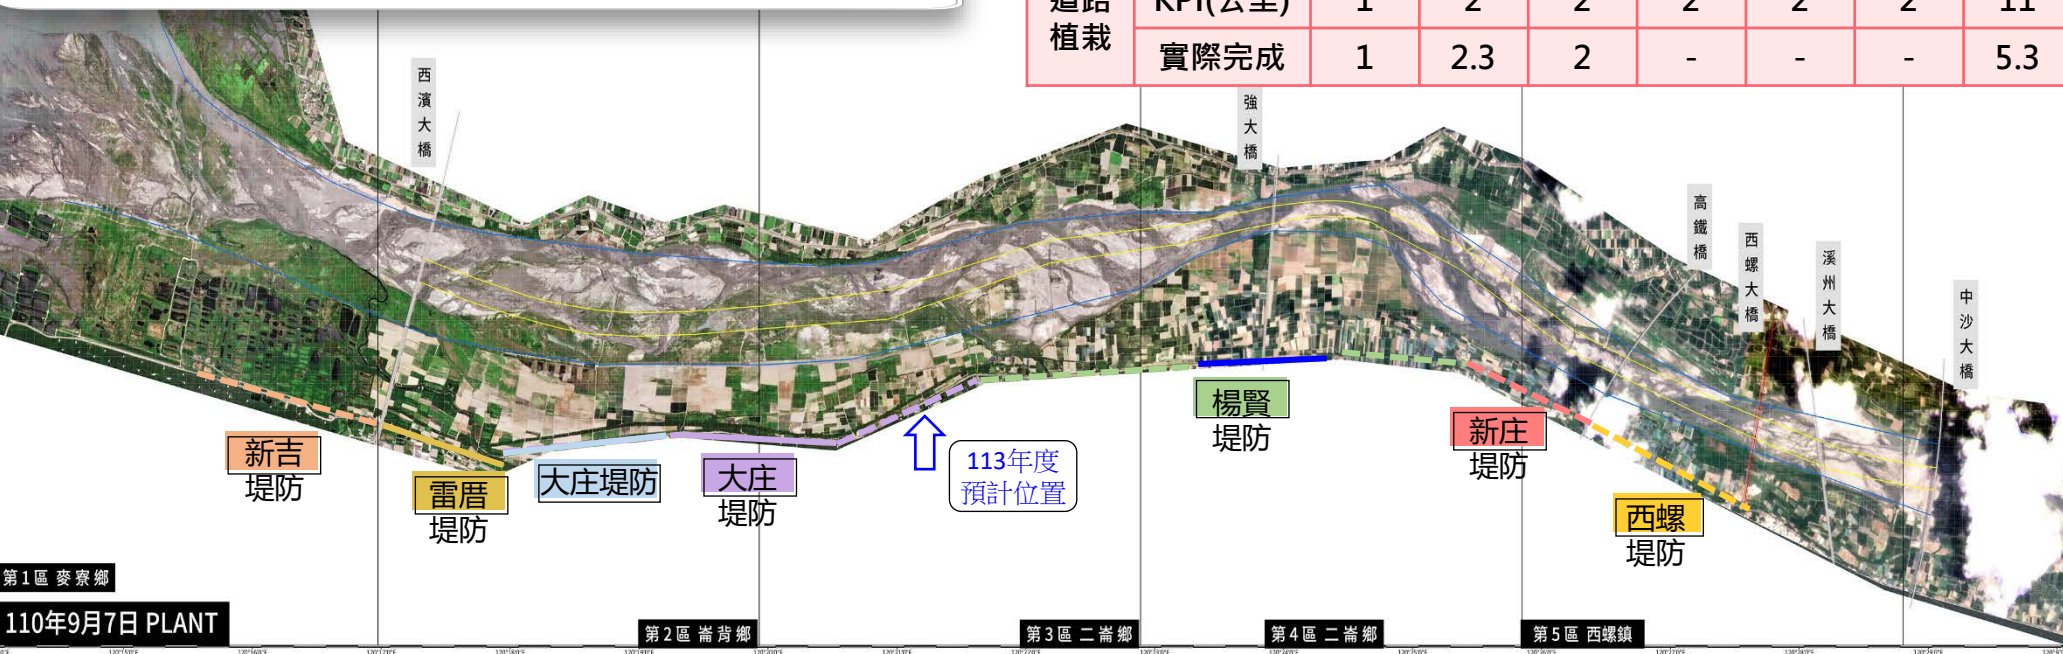

113年水防道路植栽進度管控

KPI / 2公里

已完成 / 0公里

達成率/ 0 %

➤ 執行進度說明：

預計113年度案件執行期間為113年5月起，分署將俟相關契約簽訂後，再行擇期召開工作會議研商進場期程。



[illegible]
