



揚塵防治 週報表

113/08/12~113/08/18




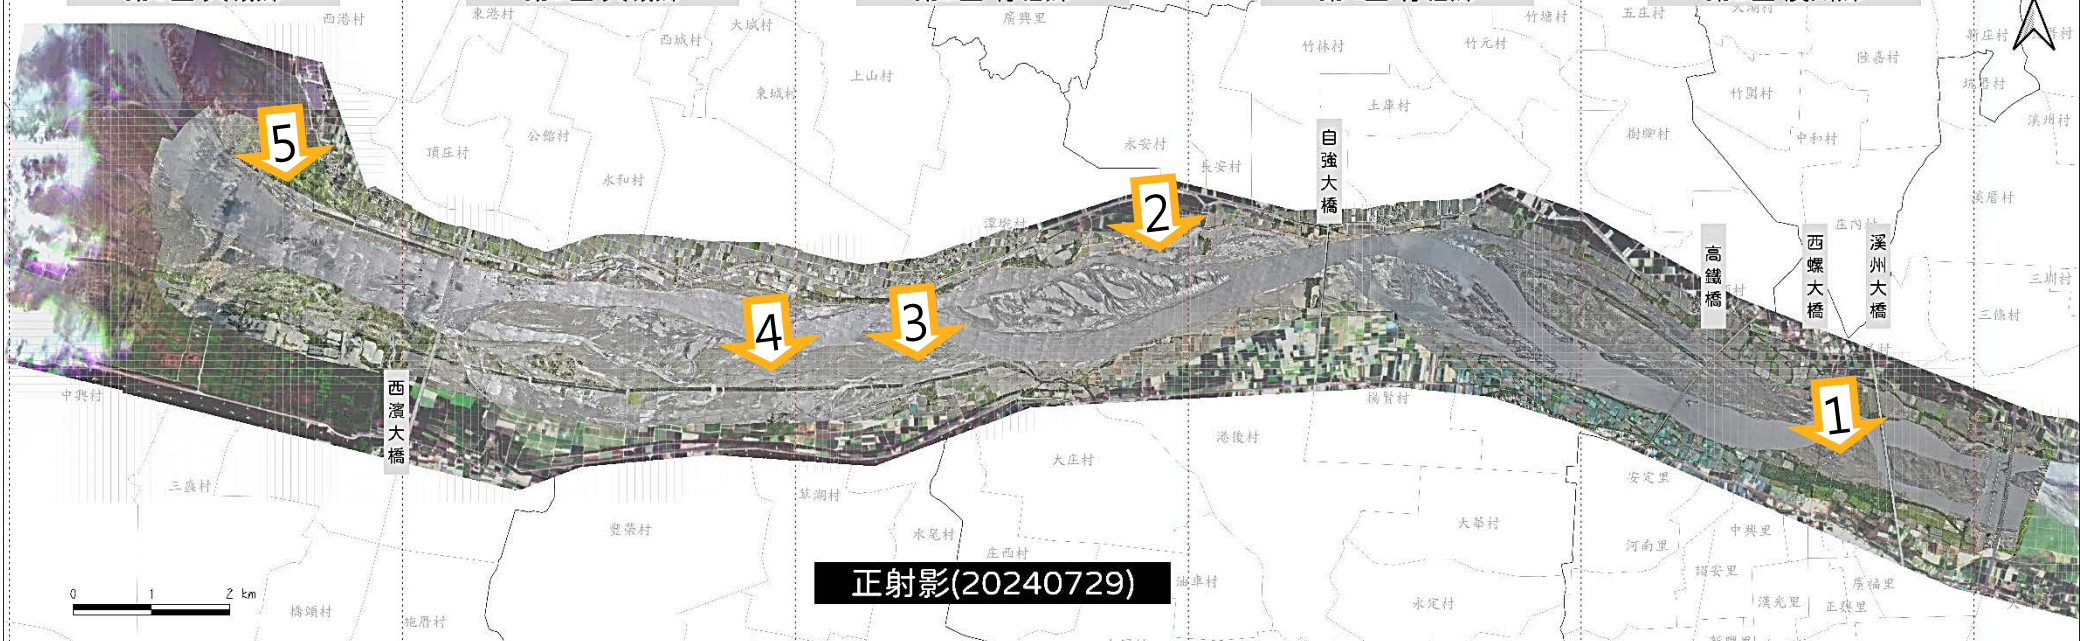


3 大義崙排水下游南岸A區_稻草蓆鋪設

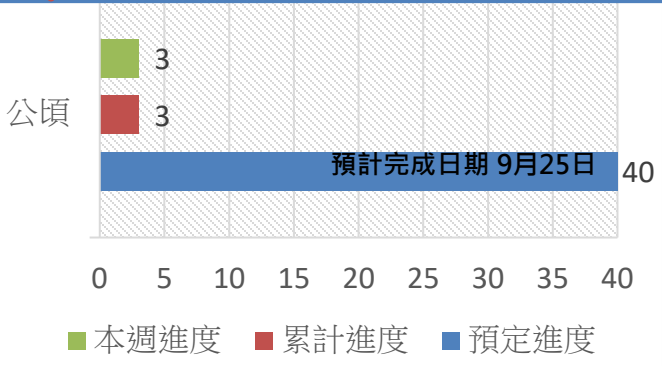


2 51號越堤路段_簡易灑水系統

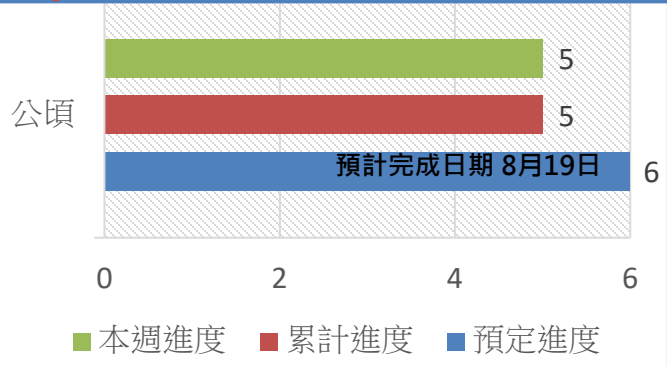


1 西螺大橋上游南岸_稻草蓆鋪設

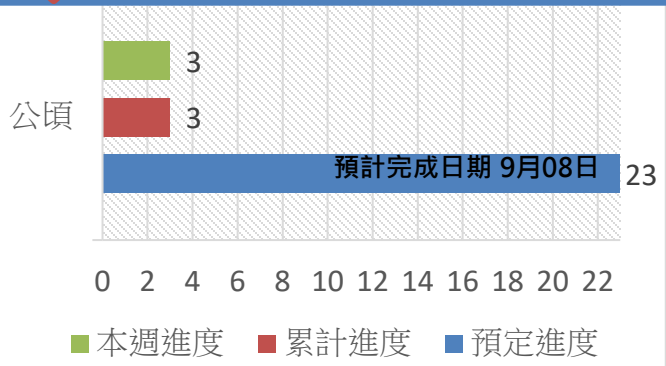


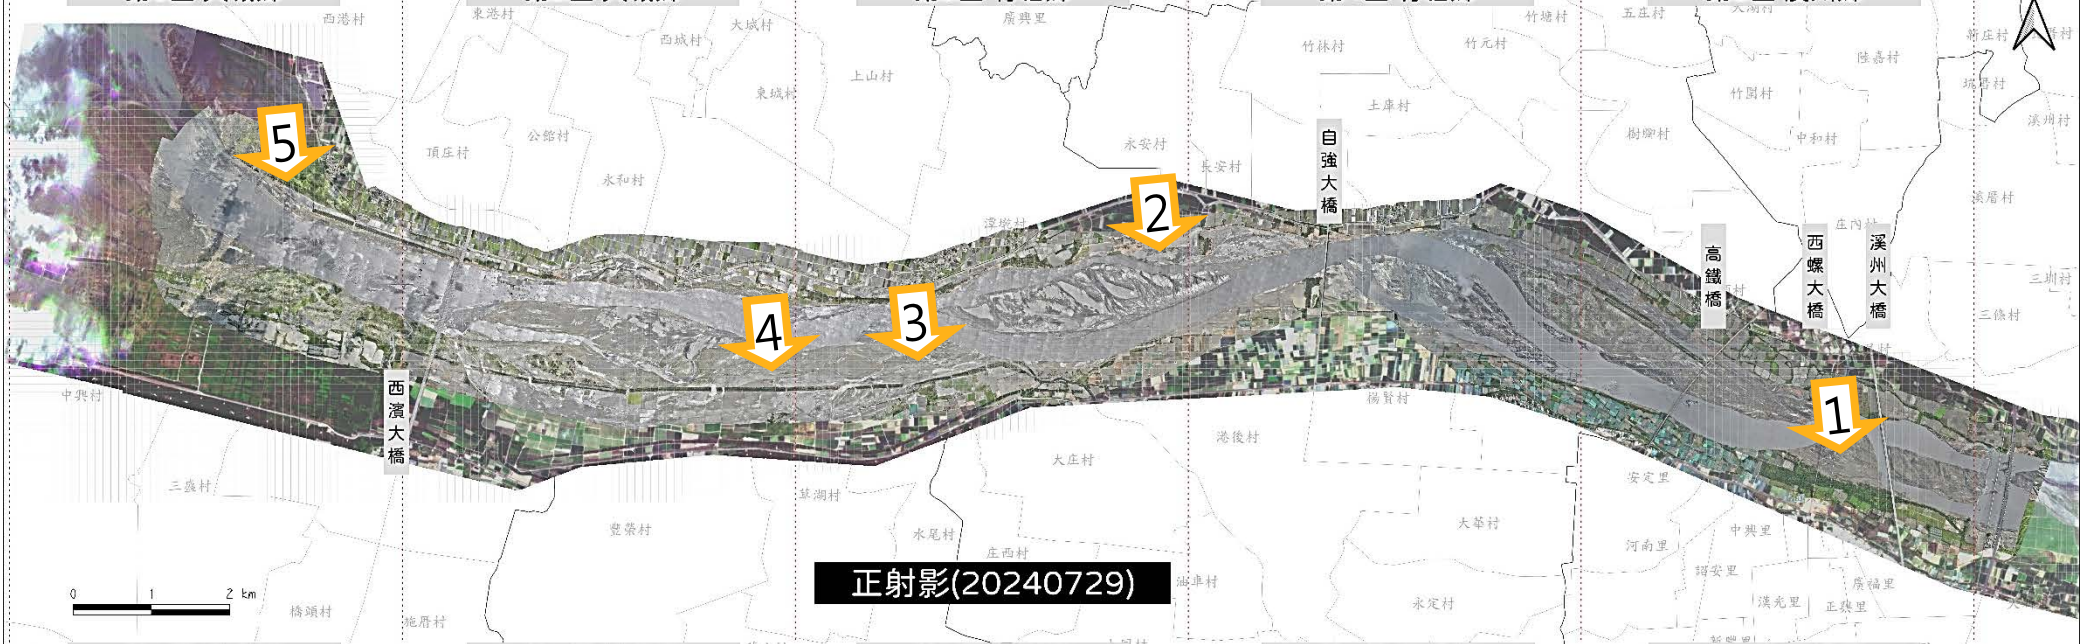


5 5號越堤路段_培厚區_防洪林帶

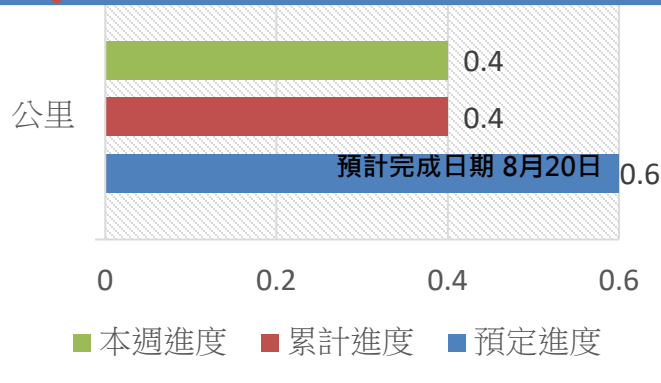

4 68-44號越堤路段_空灑草籽

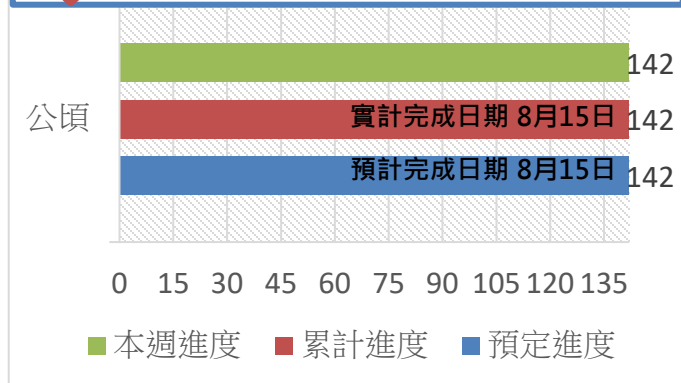

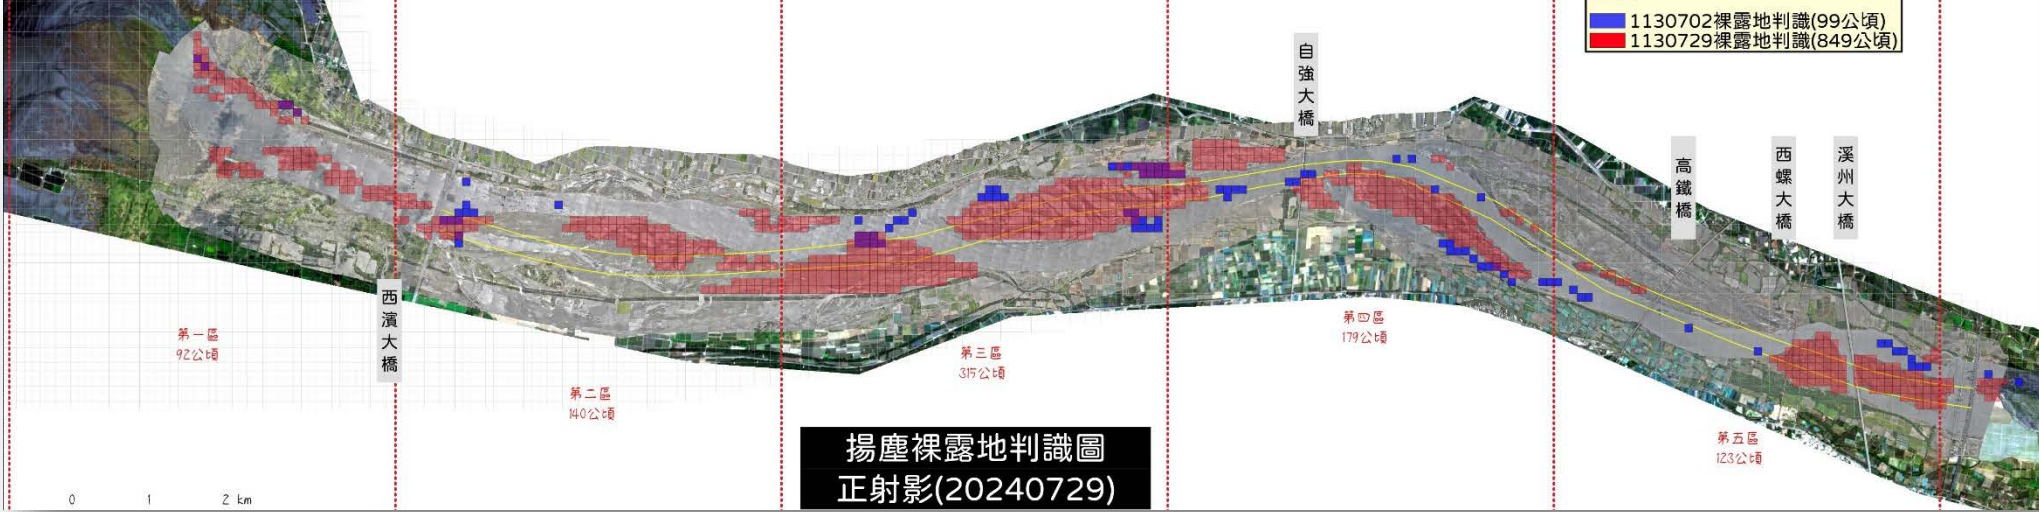

揚塵裸露地判識圖
正射影(20240729)

1區	55/54 公頃
綠覆蓋 完成進度100%	空灑草籽 實際 29 公頃 預計 29 公頃
其他覆蓋 完成進度 13%	稻草蓆鋪設 實際 3公頃 預計 23公頃
防洪林帶 完成進度 67%	培厚植栽 實際 0.4 公里 預計 0.6 公里

2區	222/119 公頃
綠覆蓋 完成進度100%	空灑草籽 實際 119 公頃 預計 119 公頃
其他覆蓋 完成進度 0%	稻草蓆鋪設 實際 預計 23 公頃
水覆蓋 完成進度 0%	蓄水池塘 實際 預計 80 公頃


3區	258/150 公頃
綠覆蓋 完成進度100%	空灑草籽 實際 142 公頃 預計 142 公頃
其他覆蓋 完成進度 10%	簡易灑水/稻草蓆鋪設 實際 8公頃 預計 80 公頃
水覆蓋 完成進度 0%	蓄水池塘 實際 預計 30 公頃
防洪林帶 完成進度 0%	培厚植栽 實際 預計 1.2 公里

4區	57/30 公頃
水覆蓋 完成進度100%	蓄水池塘 實際 30 公頃 預計 30 公頃
其他覆蓋 完成進度 0%	稻草蓆鋪設 實際 預計 27 公頃

5區	133/113 公頃
綠覆蓋 完成進度100%	空灑草籽 實際 110 公頃 預計 110 公頃
其他覆蓋 完成進度 13%	稻草蓆鋪設 實際 3公頃 預計 23公頃

揚塵抑制措施
9/17日中秋節 **725公頃**
截至8/18日 **466公頃**
已完成進度 **64%**

各區 空拍現況

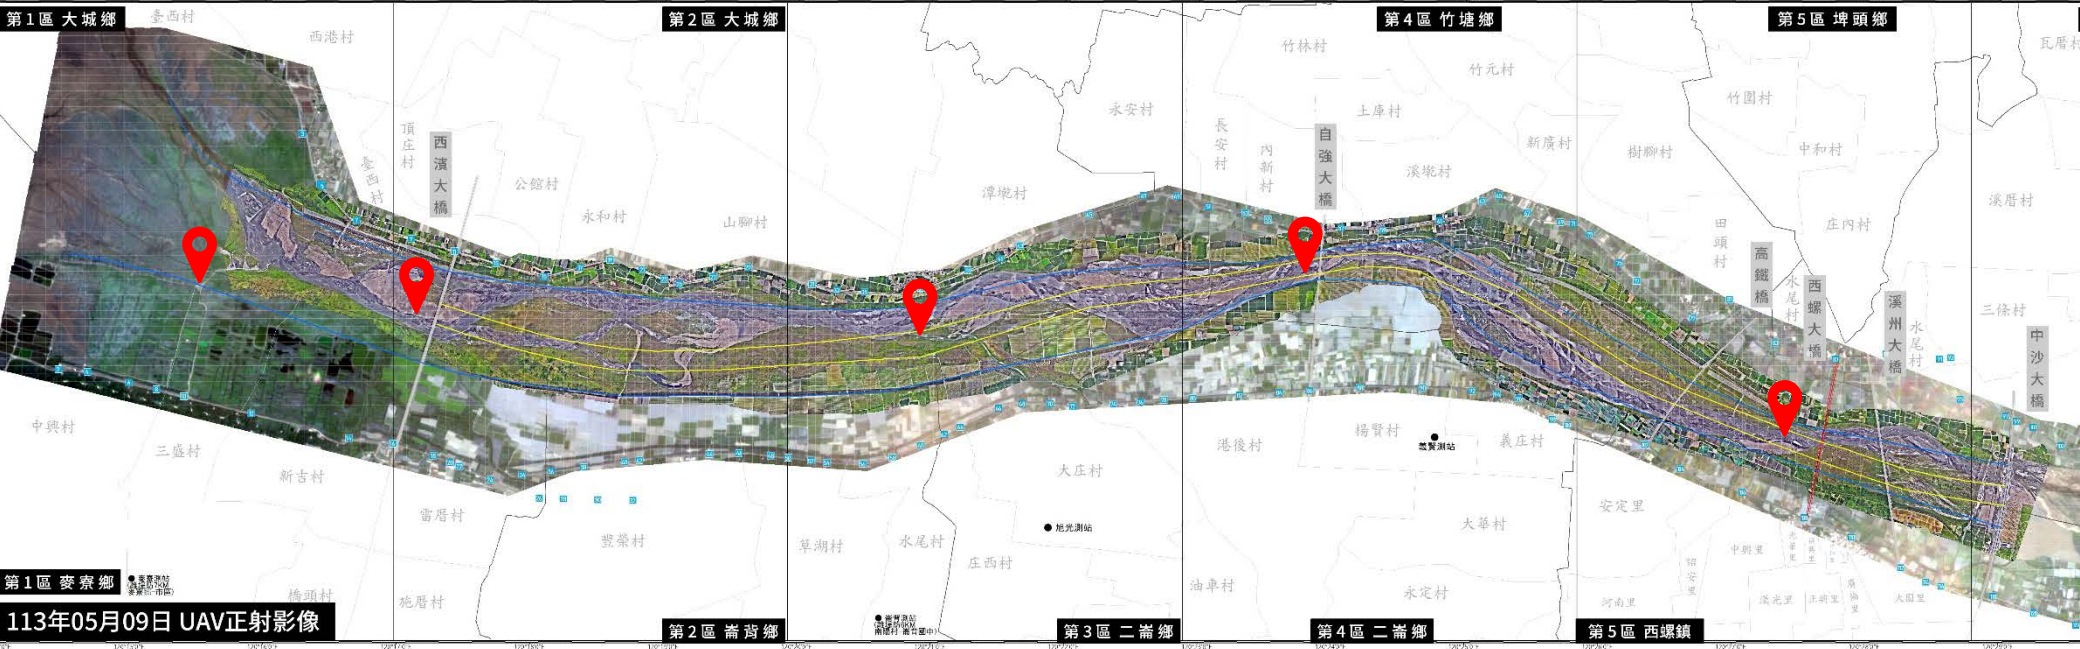

第1區 麥寮鄉
113年05月09日 UAV正射影像



113年度

揚塵KPI進度管制

執行期程:113年5月至114年4月

- 抑制面積
- 進度



其他覆蓋

- 目標值 : 300 公頃
- 已完成 : 14 公頃
- 達成率 : 4.7 %



水覆蓋

- 目標值 : 400 公頃
- 已完成 : 30 公頃
- 達成率 : 7.5 %



河道整理

- 目標值 : 4 公里
- 已完成 : 1.8公里
- 達成率 : 45%



防洪植栽

- 目標值 : 4 公里
- 已完成 : 0.4 公里
- 達成率 : 10%




綠覆蓋

- 目標值 : 250 公頃
- 已完成 : 400公頃
- 達成率 : 160%

營造複式斷面規劃圖

年度	107-109	110-112	113	114	115	合計
KPI(公里)	8	12	4	4	4	20
實際完成	8	12.23	-	-	-	20.23

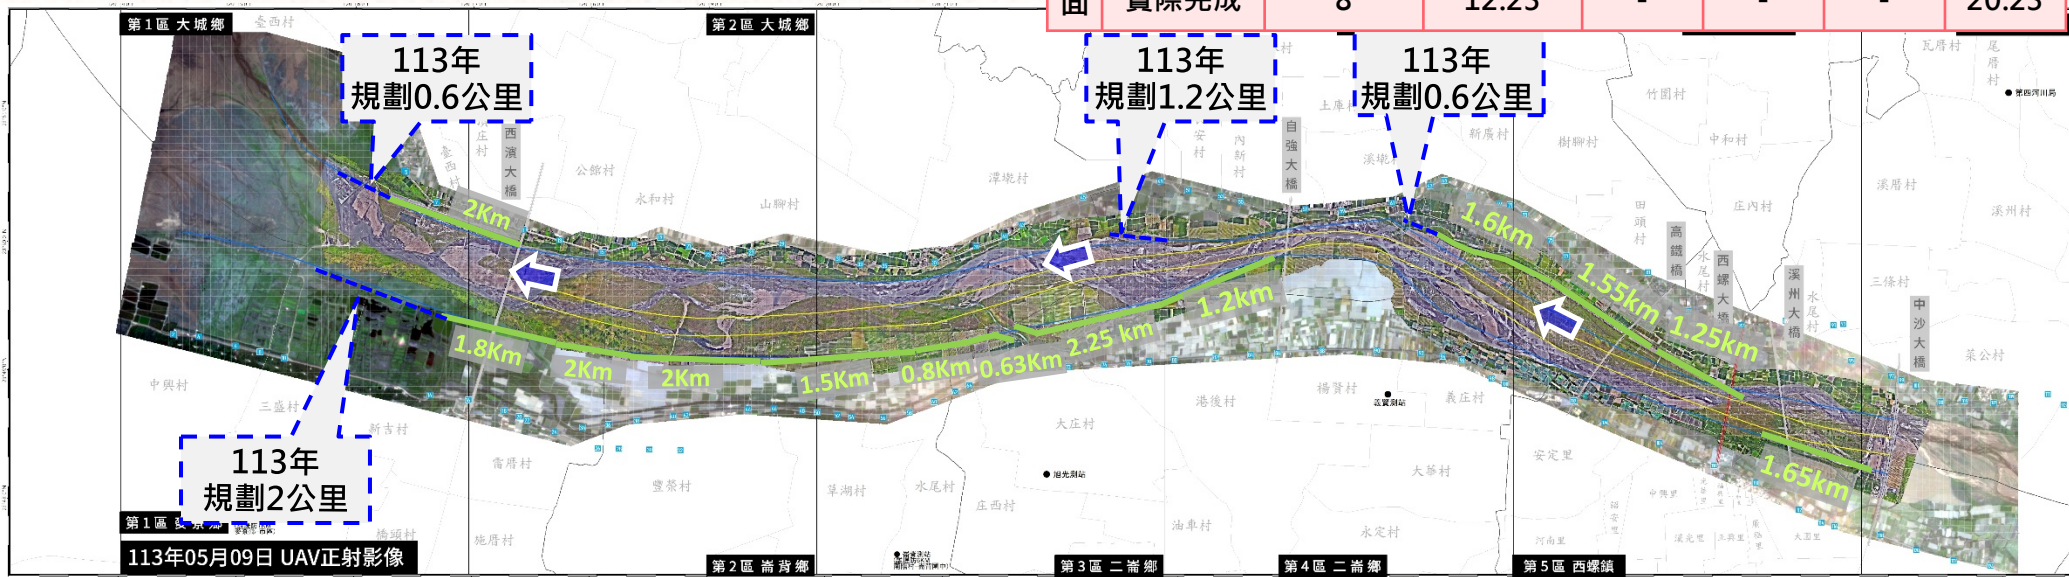

113年營造複式斷面進度管控

➤ 執行進度說明：

KPI / 4公里


已完成 / 0 km

達成率 / 0 %

- 1、第一區：西濱大橋下游北岸(規劃0.6公里)，本週已完成新植造林0.4公里，剩餘0.2公里預計8月20日完成。
- 2、第三區：電塔上游北岸(規劃1.2公里)，本週已完成1公里灑水線佈設，剩餘0.2公里預計08月19日完成，新植造林部分規劃於9月底前完成。

水防道路植栽規劃圖

年度	110	111	112	113	114	115	合計
KPI(公里)	1	2	2	2	2	2	11
實際完成	1	2.3	2	-	-	-	5.3

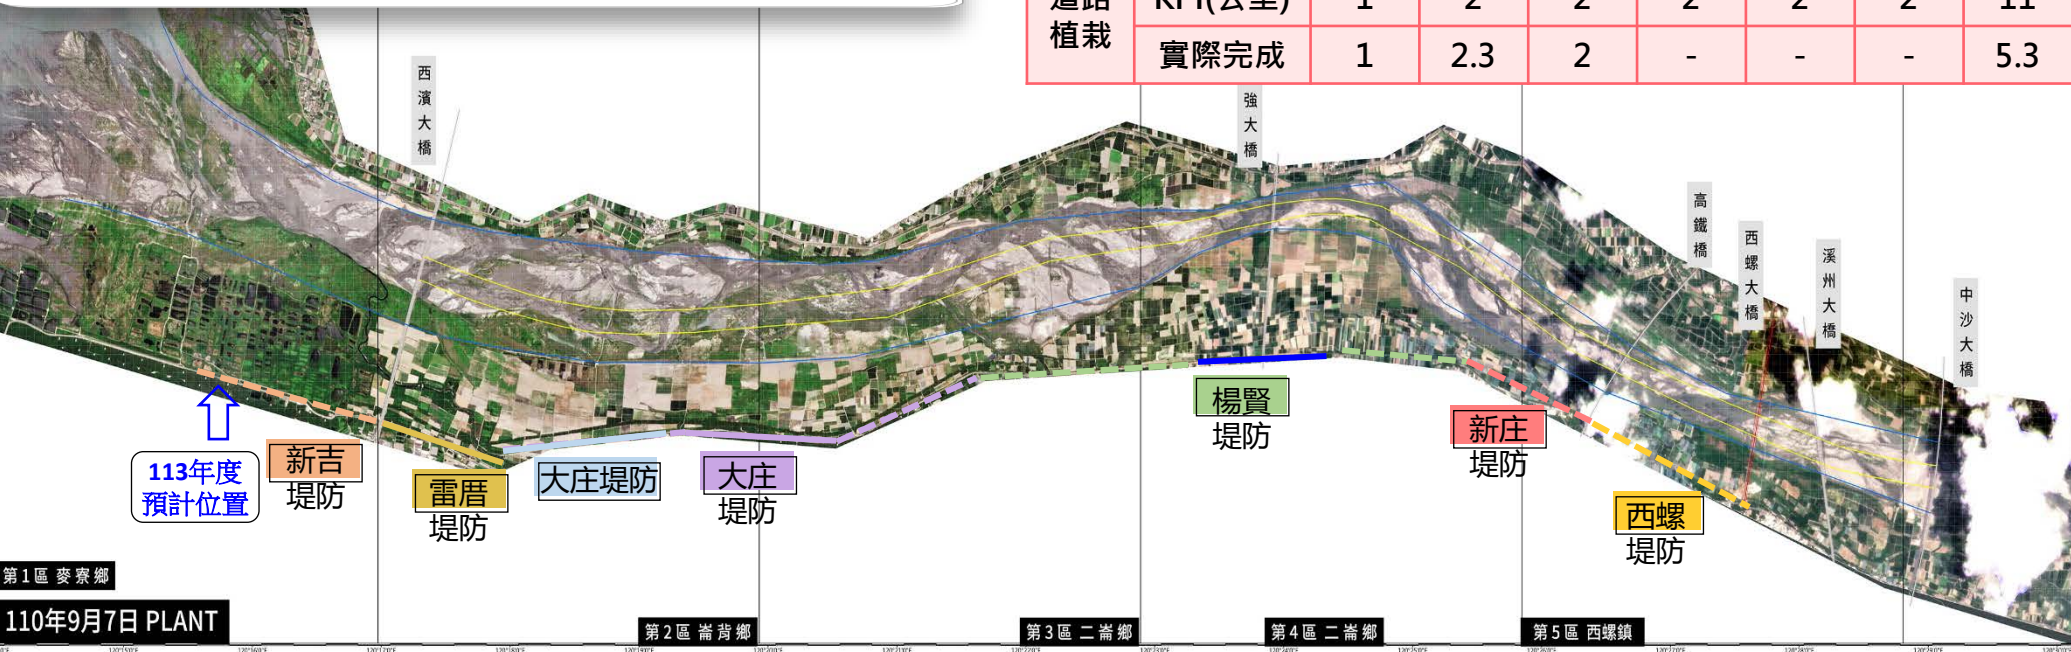

• 113年水防道路植栽進度管控


KPI / 2公里 ➤ 執行進度說明：

已完成 / 0公里

達成率 / 0 %

- 依7/16日分署工作會議討論，預計於第一區許厝寮堤防與新吉堤防辦理植樹長度為2公里，規劃於10月底前完成植樹作業。

揚塵抑制措施

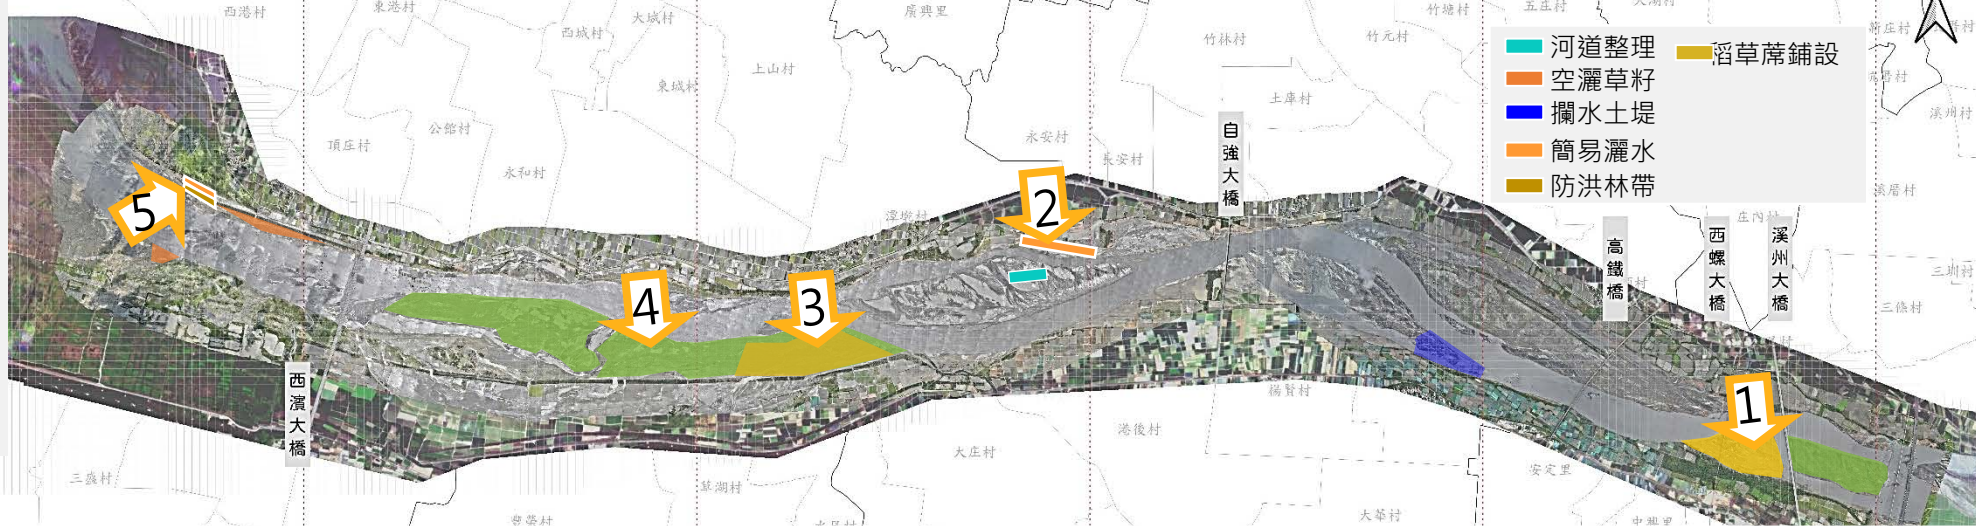

水覆蓋	水覆蓋	水覆蓋	水覆蓋	水覆蓋
			1)94號越堤路段_蓄水池塘30公頃	
河道整理	河道整理	河道整理	河道整理	河道整理
1) 西濱大橋下游北岸_河道整理0.6公里		1) 跨河電塔北岸_河道整理1.2公里		
綠覆蓋	綠覆蓋	綠覆蓋	綠覆蓋	綠覆蓋
1) 西濱大橋下游南北岸_空灑草籽29公頃	1) 西濱大橋上游南岸_空灑草籽119公頃	1) 68-44號越堤路段_空灑草籽142公頃		1) 西螺大橋上游南岸_空灑草籽55公頃 2) 溪州大橋上游南岸_空灑草籽55公頃
防洪植栽	防洪植栽	防洪植栽	防洪植栽	防洪植栽
1) 5號越堤路段_培厚區_防洪林帶0.4公里				
其他覆蓋	其他覆蓋	其他覆蓋	其他覆蓋	其他覆蓋
1) 西濱大橋下游北岸_簡易灑水3公頃		1) 51號越堤路_培厚區_簡易灑水5公頃 2) 大義耨排水_稻草蓆鋪設3公頃		1)西螺大橋上游南岸_稻草蓆鋪設3公頃
