



揚塵防治 週報表

113/08/26~113/09/01







3 51號越堤路段第一階段_攔水土堤

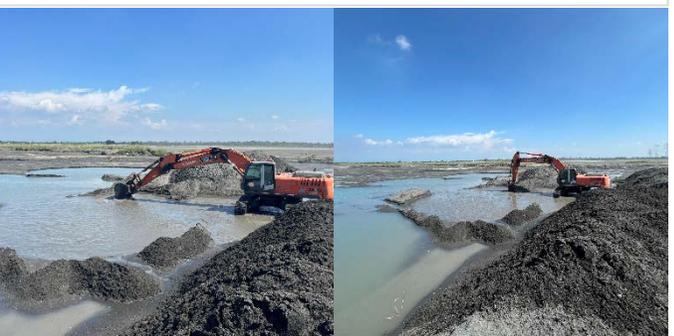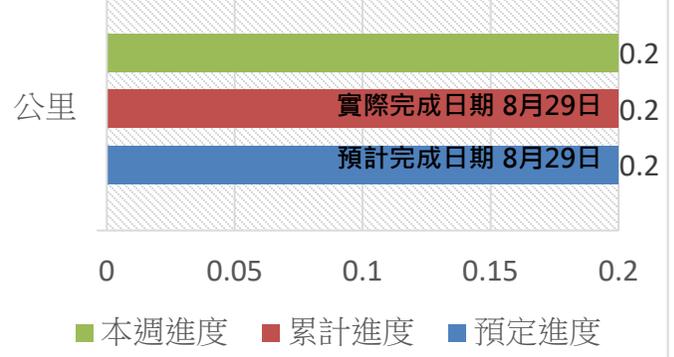

2 高鐵橋下_攔水土堤

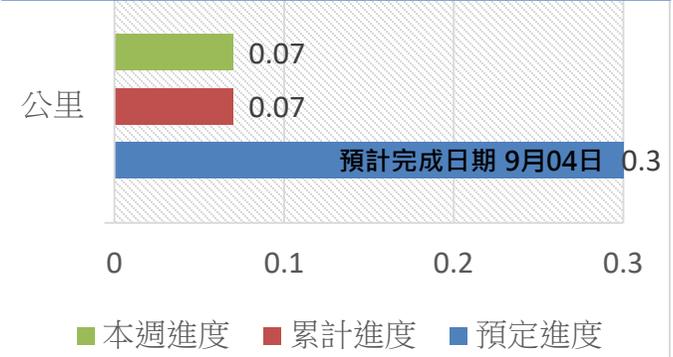


1 西螺大橋上游南岸_稻草蓆鋪設

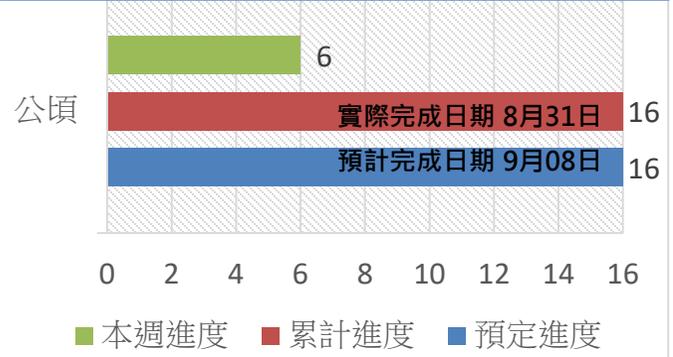


依實際現況調整施作數量




6 大義崙排水下游南岸A區_稻草蓆鋪設

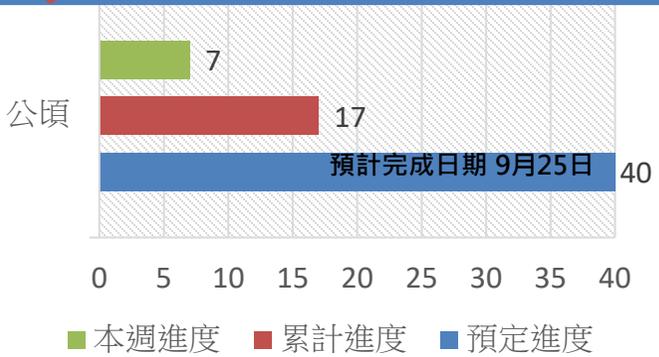


5 跨河電塔上游河中灘地_稻草蓆鋪設

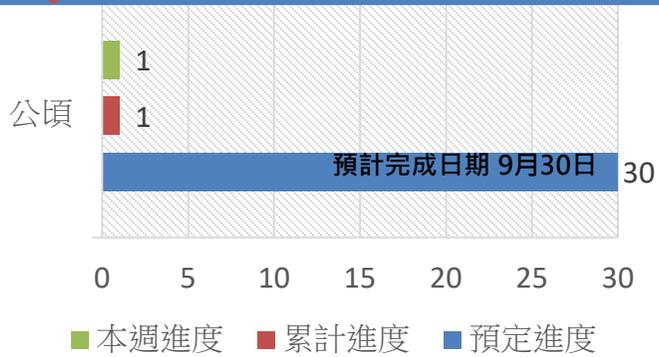

4 51號越堤路段B區_攔水土堤

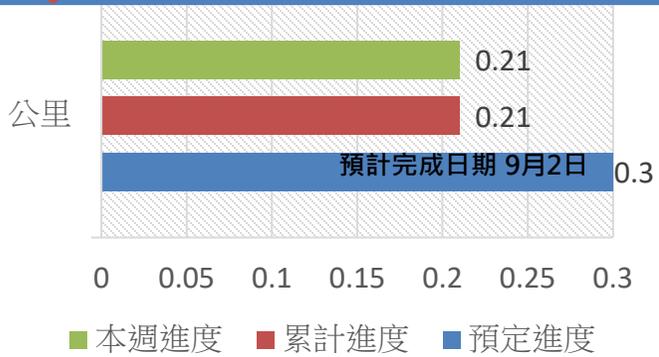

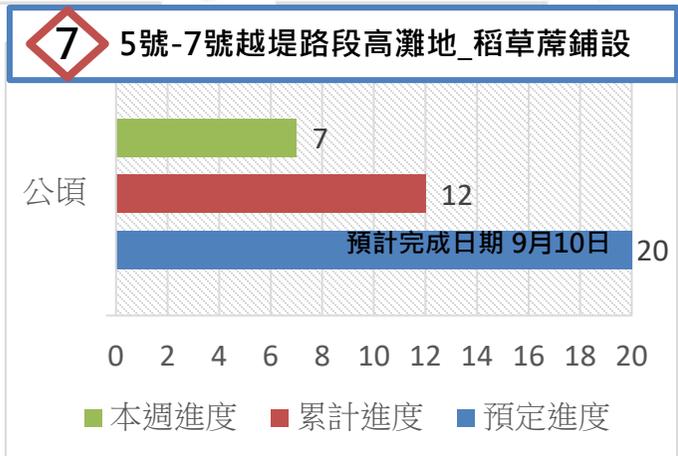

各區 空拍現況



113年度

揚塵KPI進度管制

執行期程:113年5月至114年4月

- 抑制面積
- 進度



其他覆蓋

- 目標值：300 公頃
- 已完成：55 公頃
- 達成率：18.3 %



水覆蓋

- 目標值：400 公頃
- 已完成：80 公頃
- 達成率：20 %



河道整理

- 目標值：4 公里
- 已完成：1.8公里
- 達成率：45%



防洪植栽

- 目標值：4 公里
- 已完成：0.6 公里
- 達成率：15%




綠覆蓋

- 目標值：250 公頃
- 已完成：600公頃
- 達成率：240%



揚塵抑制措施

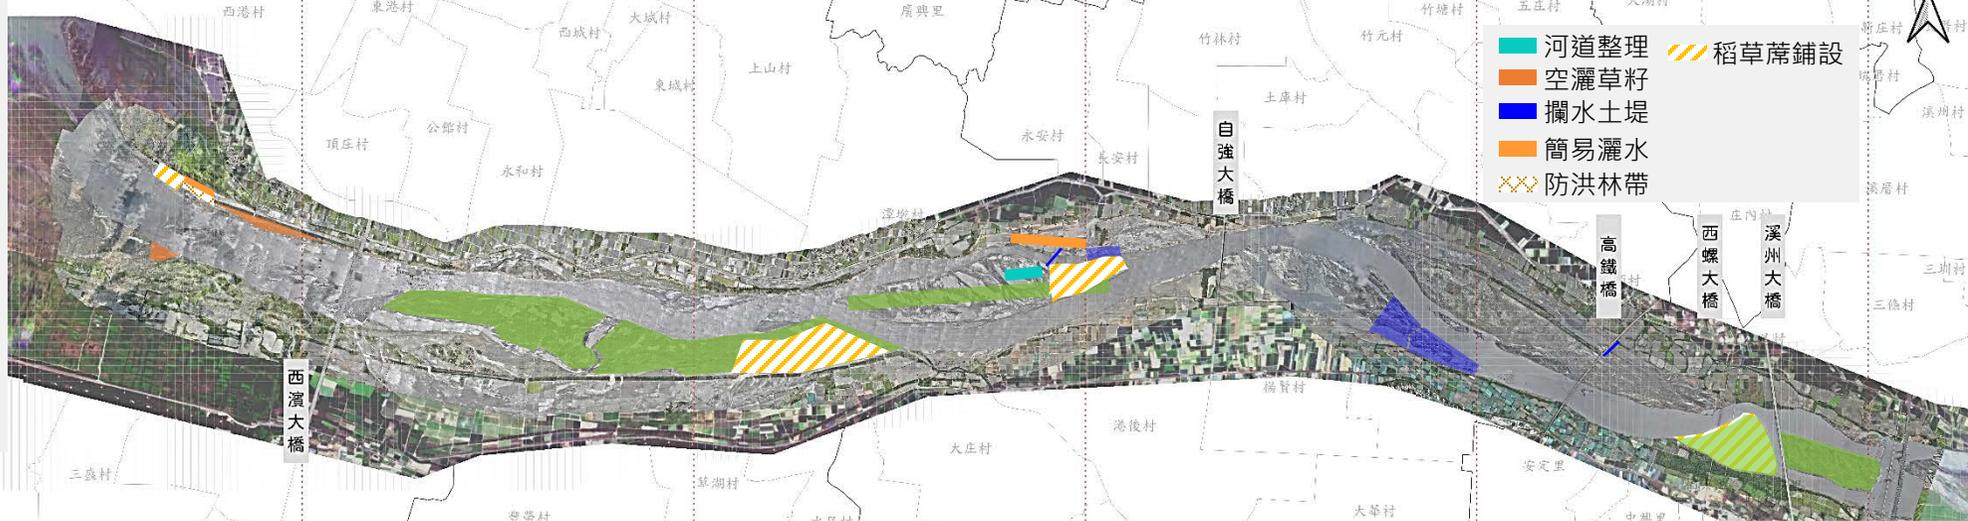

水覆蓋	水覆蓋	水覆蓋	水覆蓋	水覆蓋
		1) 51號越堤路段A區_蓄水池塘30公頃 2) 51號越堤路段B區_攔水土堤0.21公里	1) 94號越堤路段_蓄水池塘30公頃 2) 94號越堤路第二階段_蓄水池塘20公頃	1) 高鐵橋下_攔水土堤0.07公里
河道整理	河道整理	河道整理	河道整理	河道整理
1) 西濱大橋下游北岸_河道整理0.6公里		1) 跨河電塔北岸_河道整理1.2公里		
綠覆蓋	綠覆蓋	綠覆蓋	綠覆蓋	綠覆蓋
1) 西濱大橋下游南北岸_空灑草籽29公頃	1) 西濱大橋上游南岸_空灑草籽119公頃	1) 68-44號越堤路段_空灑草籽142公頃 2) 51號越堤路段河中灘地_空灑草籽200公頃		1) 西螺大橋上游南岸_空灑草籽55公頃 2) 溪州大橋上游南岸_空灑草籽55公頃
防洪植栽	防洪植栽	防洪植栽	防洪植栽	防洪植栽
1) 5號越堤路段_培厚區_防洪林帶0.6公里				
其他覆蓋	其他覆蓋	其他覆蓋	其他覆蓋	其他覆蓋
1) 西濱大橋下游北岸_簡易灑水3公頃 2) 5-7號越堤高灘地_稻草蓆鋪設12公頃		1) 51號越堤路_培厚區_簡易灑水6公頃 2) 大義崙排水_稻草蓆鋪設17公頃 3) 跨河電塔上游_稻草蓆覆蓋1公頃		1) 西螺大橋上游南岸_稻草蓆鋪設16公頃
