

計畫名稱	鹿港溪再現計畫		
工程名稱	鹿港溪再現計畫-彰化縣鹿港溪排水護岸及水岸景觀環境營造		
發包預算	383,388,290 元		
工程底價 (千元)	原契約:無底價 第一次變更:8,758 千元 第二次變更:60,460 千元 第三次變更:26,759 千元 第四次變更:12,574 千元	契約金額累計 (千元)	原契約:383,323 千元 第一次變更:392,081 千元 第二次變更:452,541 千元 第三次變更:479,300 千元 第四次變更:491,854 千元
工程位置 (二度分帶座標)	X 座標 191127.57792200 Y 座標 2661513.9879624		
開工日期	107 年 3 月 1 日(景觀營造部分) 109 年 1 月 30 日(新增抽水站部分)	完工日期	110 年 10 月 24 日(景觀營造部分) 110 年 10 月 22 日(新增抽水站部分)
工 期	1. 景觀營造:工期為 1104 日曆天(含展延)。 2. 新增抽水站:工期為 449 日曆天(含展延)。		
主管機關	經濟部水利署		
主辦機關	彰化縣政府	周先生	04-7532618
設計/監造單位	黎明工程顧問股份有限公司		04-23208051
承攬廠商	文健營造股份有限公司	工務所	04-7778078

## 1. 工程概要：

本工程串聯老街舊城區，改善舊鹿港溪排水護岸及周邊水岸環境景觀，營造的水岸環境，一是自然棲地營造，二是再造運河行船，三是文藝市集廊道，完成後將融合環境、休閒及人文意象，帶動河岸邊的市鎮發展與提升生活品質，搭配鄰近國小等公共設施與在地居民生活結合，增加當地居民及外來遊客休憩空間，將恢復昔日【母親之河】之榮光，再現昔日鹿港溪風華。

本工程辦理南興三號橋至青雲路間鹿港溪排水護岸改建、環境營造及沿線橋梁改建等，主要效益為排水路改善確保通洪能力，污水截流引進潔淨水源，營造優質生活環境，營造景觀綠帶、親水步道、藍帶遊憩、水中舞台、風帆廣場等，兼具生活、遊憩及觀光等多元空間，讓鹿港溪歷史印象再現，進而帶動鹿港地區發展。


另於 107 年 7 月 2 日豪大雨造成鹿港老街及公會堂附近嚴重淹水，經評估後於下水道丙幹線出口處(本工程工區範圍內)設置抽水站一處。

本工程景觀環境部分於 110 年 10 月 24 日完工；抽水站部分於 110 年 10 月 22 日完工。


## 2. 主要施工項目：

- |                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| 1. 護岸約 3,236m          | 2. 橋梁改建 7 座、新建人行橋 1 座 |
| 3. 截流箱涵 1,584m         | 4. 引水 HDPE 管 1,649m   |
| 5. 廣場 (風帆廣場、開源廣場、水中舞台) | 6. 步道、植栽、照明等休憩景觀      |
| 7. 新建抽水站 1 座           |                       |

### 施工前照片

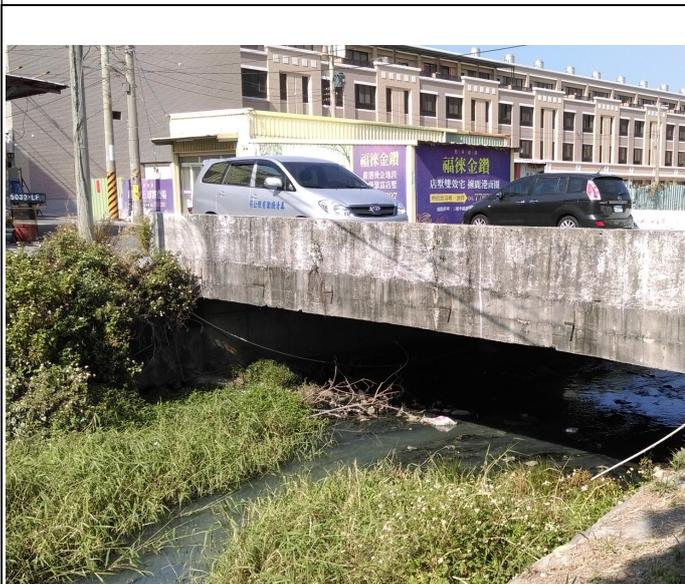

### 施工中照片

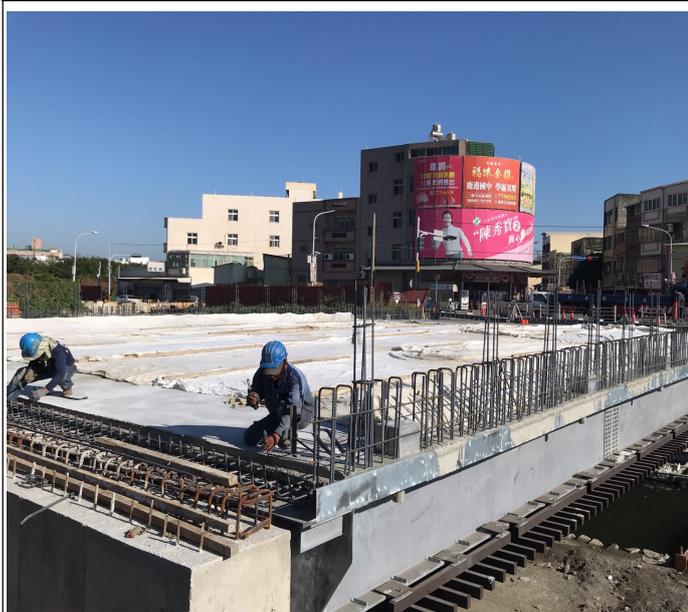

### 完工照片

