

計畫名稱	芳苑濕地紅樹林暨其週邊整體環境改善計畫		
工程名稱	芳苑濕地紅樹林暨其週邊整體環境改善		
核定金額(千元)	90,000 千元(補助款 70,380 千元、配合款 16,200 千元)		
發包預算(千元)	88,492,413 元		
工程底價(千元)	83,351.058	契約金額 (千元)	80,380 千元(決標金額) 第一次變更:87,801.380 千元
工程位置 (二度分帶座標)	X 坐標 179482.80590136 , Y 坐標 2647528.5628313		
開工日期	108 年 11 月 4 日	(預定) 完工日期	(110 年 5 月 13 日) 110 年 5 月 12 日
工 期	556 日曆天 (含展延 103 日+春節不計工期 7 日+停工不計工期 56 日)		
主管機關	經濟部水利署		
主辦機關	彰化縣政府	陳盈利	04-7532773
設計/監造單位	禾拓工程顧問有限公司	施宏霖	04-8950880
承攬廠商	佳翰營造有限公司	張進興	(02)2608-9355

1. 工程概要：

本案依芳苑濕地環境特性，訂定地區特有環境教育體驗功能架構，包含紅樹林的生態與服務功能，並依此架構，結合海牛體驗、觀光遊憩及維管動線，區分基地空間機能。


依濕地生態保育、提升紅樹林生態功能，同時作為生態旅遊、環境教育之用，配合擬定之環境教育架構與遊憩體驗，構思各區硬體設施，並期望藉由濕地公園帶動對於紅樹林環境認知外，也提供其他環境復育、產業文化、生態導覽解說等地區遊程綜覽。

以保留既有保安林內之紅樹林為原則，整體步道、平臺、環境教育體驗區、域多設置於保安林外，利用既有之潮溝加以整理，增加紅樹林地區的物種多樣性。

2. 主要施工項目：

施作內容包含：海牛廣場（高壓磚鋪面、休憩棚架、休憩座椅、植栽綠美化）、出海路廣場、海堤欄杆、無障礙坡道及越堤坡道，生態觀察設施含觀察棧道 A 型（寬 2M）490.8 公尺、B 型（寬 1.35M）560.2 公尺、觀察平台、賞鳥亭、生態導覽解說系統。

施工前照片

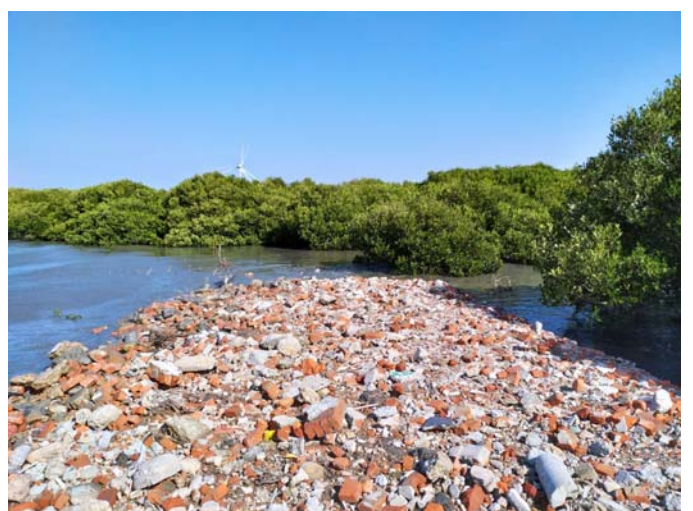

施工中照片



施工後照片



施工後照片

