

嘉義市「全國水環境改善計畫」

綠園道-道將圳水環境改善之八掌溪人行景觀橋周邊環境改善

一、工程點位座標

計畫名稱	分項計畫名稱	工程點位座標
綠園道-道將圳水環境改善計畫	綠園道-道將圳水環境改善之八掌溪人行景觀橋周邊環境改善	TWD97 座標 X：195494 Y：8595683

二、主要工項：詳見細部設計圖說及八掌溪人行景觀橋周邊環境改善二期基設規劃報告。

三、核定金額：

中央補助：70,200 千元，地方自籌：19,800 千元，合計 90,000 千元。

四、預算金額：84,239,994 元

五、決標金額：73,000,000 元


六、施工廠商：伍興營造有限公司

七、開工日期：107 年 8 月 31 日

八、完工日期：尚未完工

九、按月施工進度：詳表 1 所示。

表 1 施工進度管理表

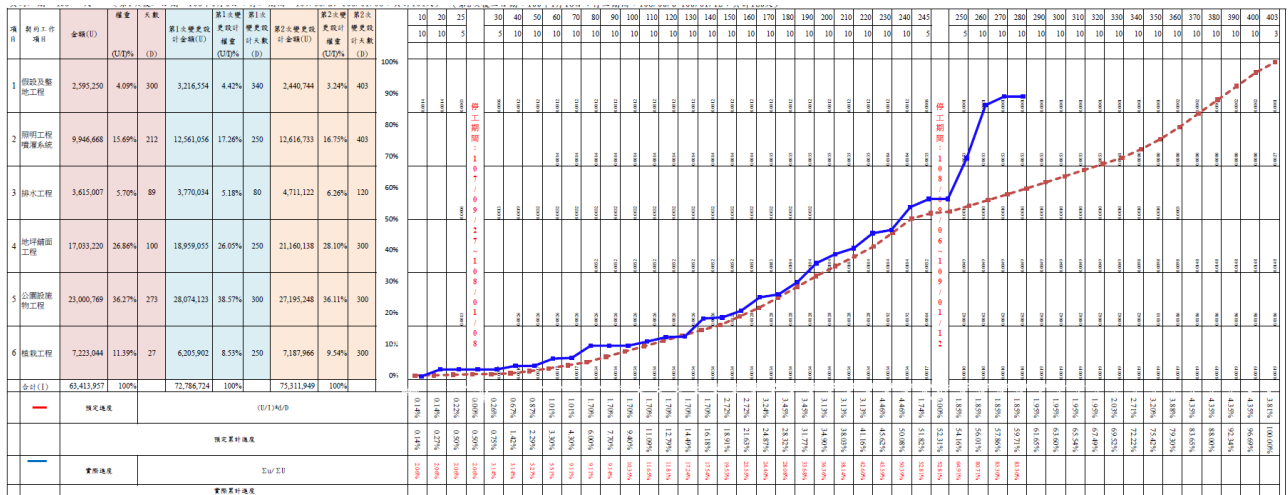

十、 異常事件處置概況：無異常事件。

十一、 生態保育措施執行情形：詳見八掌溪人行景觀橋周邊環境改善施工階段生態檢核成果報告書。

十二、 施工前中後照片

施工前



施工中



施工後

