

檔 號：

保存年限：

南投縣政府 函

台中市西屯區大墩十九街186號12樓

地址：54001南投市中興路660號

承辦人：技士 吳崇岳

電話：049-2222729

傳真：049-2244805

電子信箱：qsxdr69@nantou.gov.tw

受文者：台灣世曦工程顧問股份有限公司

發文日期：中華民國107年12月3日

發文字號：府工水字第1070271813號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：檢送本府107年8月20日「南投縣貓羅溪水環境改善計畫(第一期)」工程督導紀錄表乙份，請確實依據督導意見辦理，請查照

正本：松聯營造股份有限公司、台灣世曦工程顧問股份有限公司

副本：本府工務處

縣長 林明濤

本案依分層負責規定授權主管科長決行




台灣世曦工程顧問(股)
總收文號：107TA00618
收文日期：107/12/06
附 件：隨表單附送

工程督導紀錄表

日期：107 年 11 月 13 日

主辦單位： 南投縣政府工務處水利工程科		承包廠商： 松聯營造股份有限公司		監造單位： 台灣世曦工程顧問股份有限公司	
工程名稱：南投縣貓羅溪水環境改善計畫(第一期)				工程地點： 九二一紀念公園旁	
預算金額：49,467,889 (發包工作費：)		契約金額：33,630,000		工程期限：210 日曆天	
開工日期	107 年 07 月 17 日	停、復工日期		預定進度： 22.45%	實際進度： 16.38%
督 導 紀 要	<ol style="list-style-type: none"> 承上次督導紀錄延續辦理相關安全因素考量設施調整施當位置，盡速辦理相關變更程序。 自行車道標案工程已完成之上橋引道銜接至本工程入口鋪面處，鋪面銜接及安全因素考量，請設計單位評估上開鋪面高差銜接順平方案。 工區現況植栽過多恐影響日後生長情形，將影響日後植栽撫育狀況。 				
綜 合 意 見	<ol style="list-style-type: none"> 相關設施考量結構安全與使用年限因素，經現勘與設計單位重新檢討上開設施配置必要性，將朝向進行減量設計或取消設施並可解省公帑。盡速辦理變更程序壁面影響工進落後甚多。 自行車道標案工程尚未完工，請工地隨時掌握該工程變化狀況，並請設計單位調整鋪面高程與線形以利緩和銜接及入口美化，避免廠商按圖無法施作及造成工程進度落後狀況。 請設計監造及承商告知會館中心人員，爾後相關設施位於會館中心(工區旁)如何綠美化及日後接管維護等事宜。 請設計監造單位參照水利署督導建議適當調整植栽配置及生態性質調整，評估是否減量設計節省公帑並達到生態景觀用意。 <p style="text-align: right;">呈第二層決行</p>				
監 造 單 位	承 包 廠 商	承 辦 單 位	承 辦 單 位	單 位 主 管	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">技士吳崇岳</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">水利工務科 吳志浩</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">代</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">工務處 陳錫梧(乙)</div>

工程名稱：南投縣貓羅溪水環境改善計畫(第一期)

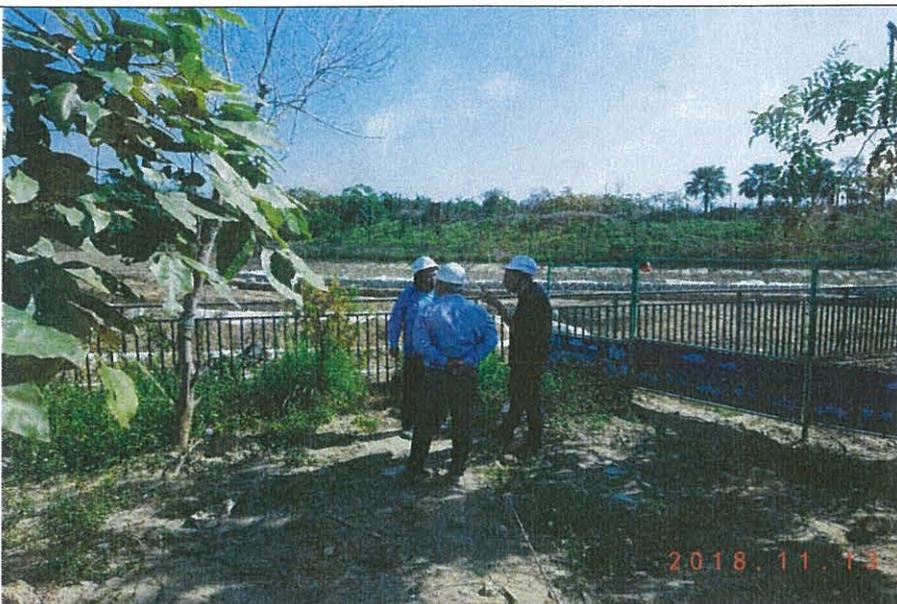

說明：
工程督導
及他案工
程銜接事
宜討論



說明：
工程督導
及他案工
程銜接事
宜討論



說明：
工程督導
及他案工
程銜接事
宜討論
