

計畫名稱	鹿港溪再現計畫		
工程名稱	鹿港溪再現計畫-彰化縣鹿港溪排水護岸及水岸景觀環境營造		
發包預算(千元)	383,388,290 元		
工程底價(千元)	383,323,000 元	契約金額 (千元)	383,323,000 元 452,541,867 元 (第2次契約變更)
工程位置 (二度分帶座標)	X 座標 191127.57792200 Y 座標 2661513.9879624		
開工日期	107年3月1日(景觀營造部分) 109年1月30日(新增抽水站部分)	(預定) 完工日期	109年10月10日(景觀營造部分) 110年1月24日(新增抽水站部分)
施工(預定)進度	75.65%	實際進度	64.17%
工 期	1. 景觀營造：工期為954日曆天(含展延)。 2. 新增抽水站：工期為360日曆天。		
主管機關	經濟部水利署		
主辦機關	彰化縣政府	周承辦	04-7532618
設計/監造單位	黎明工程顧問股份有限公司	監造所	04-7774626
承攬廠商	文健營造股份有限公司	工務所	04-7778078

## 1. 工程概要：

本工程串聯老街舊城區，改善舊鹿港溪排水護岸及周邊水岸環境景觀，營造的水岸環境，一是自然棲地營造，二是再造運河行船，三是文藝市集廊道，完成後將融合環境、休閒及人文意象，帶動河岸邊的市鎮發展與提升生活品質，搭配鄰近國小等公共設施與在地居民生活結合，增加當地居民及外來遊客休憩空間，將恢復昔日【母親之河】之榮光，再現昔日鹿港溪風華。

本工程辦理南興三號橋至青雲路間鹿港溪排水護岸改建、環境營造及沿線橋梁改建等，主要效益為排水路改善確保通洪能力，污水截流引進潔淨水源，營造優質生活環境，營造景觀綠帶、親水步道、藍帶遊憩、水中舞台、風帆廣場等，兼具生活、遊憩及觀光等多元空間，讓鹿港溪歷史印象再現，進而帶動鹿港地區發展。

另於107年7月2日豪大雨造成鹿港老街及公會堂附近嚴重淹水，經評估後於下水道丙幹線出口處(本工程工區範圍內)設置抽水站一處。


## 2. 主要施工項目：

1. 護岸約3,236m
2. 橋梁改建7座、新建人行橋1座
3. 截流箱涵1,584m
4. 引水HDPE管1,649m
5. 廣場(風帆廣場、開源廣場、水中舞台)

6. 步道、植栽、照明等休憩景觀

7. 新建抽水站1座

施工前照片

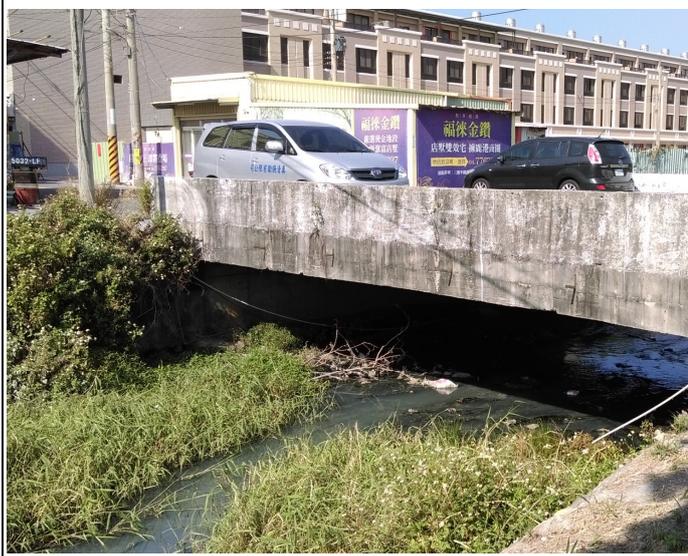

### 施工中照片

