


濁水溪揚塵抑制1090615~1090621周報表



碎石級配鋪設




稻草蓆鋪設



去化土砂培厚



本周施作項目及位置

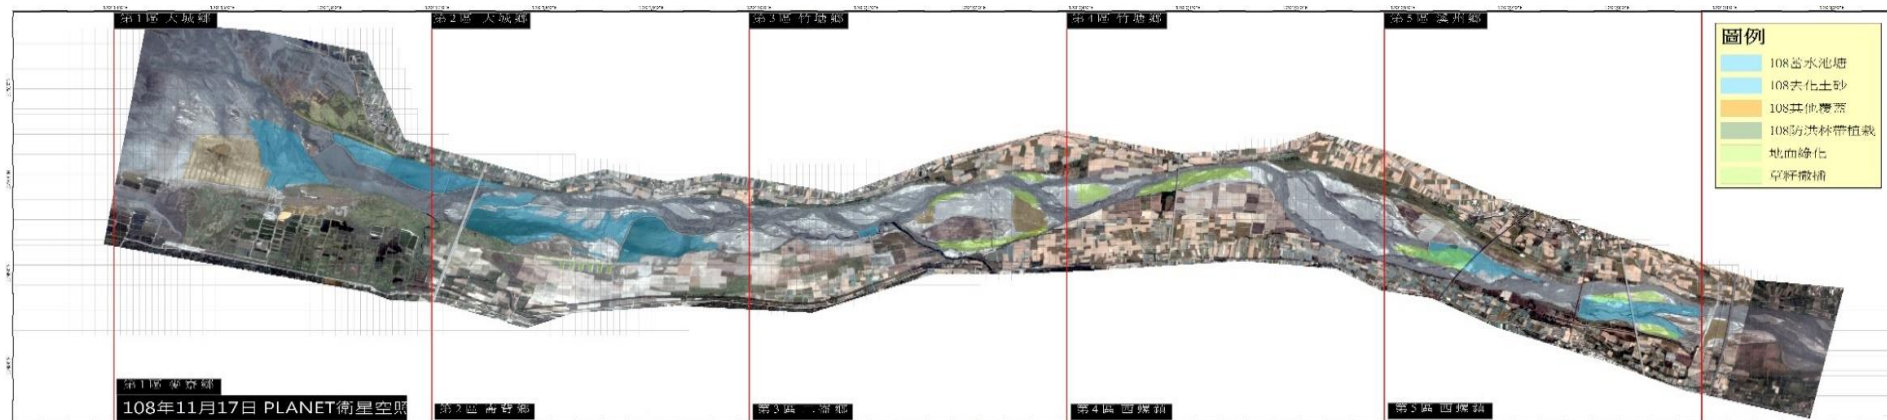

區域	施工位置	施工內容	目前進度
二	40號越堤路	碎石級配鋪設(1.3公頃)	1.3公頃(100%)
二	40號越堤路	稻草蓆鋪設	0.1公頃(100%)
五	高鐵上下游	去化土砂培厚(24萬方)	0.4萬方(1.6%)

各區空拍現況(更新至0518)

第一區

大沙丘多半濕潤



第二區

40號越堤河道濕潤



第三區

74號越堤河道濕潤



第四區


高鐵上下游河道濕潤



第五區

西螺橋上游蓄水濕潤



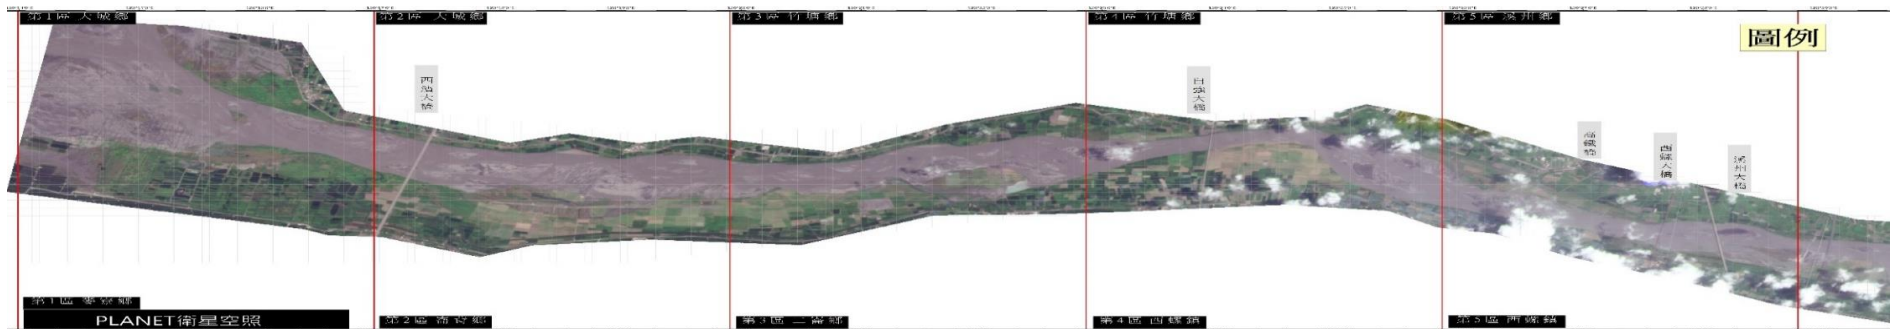

第一區		第二區		第三區		第四區		第五區	
水覆蓋		水覆蓋		水覆蓋		水覆蓋		水覆蓋	
蓄水池塘(公頃)		蓄水池塘(公頃)		蓄水池塘(公頃)		蓄水池塘(公頃)		蓄水池塘(公頃)	
綠覆蓋		綠覆蓋		綠覆蓋		綠覆蓋		綠覆蓋	
林帶植栽(公里)	2	防洪植栽(公里)	14	草籽撒播(公頃)		草籽撒播(公頃)		防洪植栽(公里)	
大沙丘植栽(公里)		綠覆蓋(公頃)	10					草籽撒播(公頃)	
疏濬填池綠覆(公頃)									
大沙丘綠覆(公頃)									
林帶植栽(公頃)									
其他覆蓋		其他覆蓋		其他覆蓋		其他覆蓋		其他覆蓋	
去化土砂(萬方)	26.68	去化土砂(萬方)		去化土砂(萬方)	40.14	三仙膠(公頃)		去化土砂(萬方)	0.4
灑水線(公頃)	2	河道整理(公里)		河道整理(公里)	1.2	稻草鋪設(農民)公頃		灑水系統(公頃)	
200公頃灑水系統(公頃)		灑水系統(公頃)	10	平鋪防塵網				便道鋪設級配(公頃)	
		牡蠣殼鋪灑(公頃)		便道鋪設級配				平鋪防塵網(公頃)	
三仙膠(公頃)		三仙膠(公頃)		三仙膠(公頃)				稻草鋪設(農民)公頃	
稻草鋪設(公頃)		稻草鋪設(公頃)	0.1	稻草鋪設(農民)公頃					
便道鋪設級配(公頃)	1.3	碎石級配鋪設(NO.40越堤路下)	1.3						
疏濬簡易灑水佈設(公頃)									
平鋪防塵網(公頃)	3								
直立式防塵網(公頃)									
三仙膠(公頃)									
牡蠣殼鋪灑(公頃)									
碎石級配(公頃)									
其他覆蓋總計	6.3	其他覆蓋總計	11.4	其他覆蓋總計	0	其他覆蓋總計	0	其他覆蓋總計	0
