


# 濁水溪揚塵抑制1090629~1090705周報表



去化土砂培厚



## 本周施作項目及位置

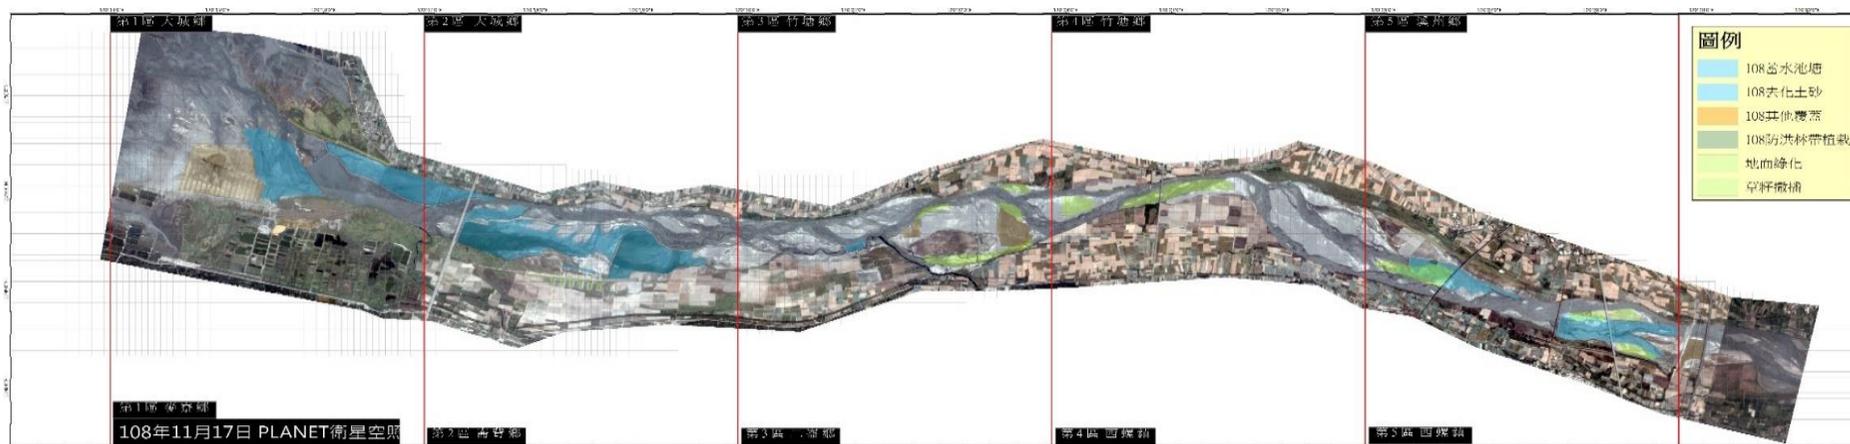

區域	施工位置	施工內容	目前進度
五	高鐵上下游	去化土砂培厚(24萬方)	3.0萬方(12.5%)

## 各區空拍現況(更新至0518)

第一區

大沙丘多半濕潤



第二區

40號越堤河道濕潤



第三區

74號越堤河道濕潤



第四區

高鐵上下游河道濕潤



第五區

西螺橋上游蓄水濕潤





## 109年度改善措施分區項目及進度達成率

改善措施		區域					進度達成率	109年7月預定進度	備註
		第一區	第二區	第三區	第四區	第五區			
水利 防制工 法	水覆蓋 (300公 頃)	0.0 公頃	0.0 公頃	0.0 公頃	0.0 公頃	0.0 公頃	0.0%	5%	
						0			
	河道整 理 (2.5KM)		0.0 KM	1.2 KM			48.0%	5%	
						1.2			
	河道疏濬及去 化土砂 (85萬方)(視 實際情形檢 討)	26.7 萬	0.0 萬	40.1 萬		3.0 萬	82.1%	88%	
							69.82		
防災應 變	其他覆 蓋(500 公頃)	6.3 公頃	11.4 公頃	0.0 公頃	0.0 公頃	0.0 公頃	3.5%	0%	
							17.7		
造林新 植與撫 育	灘地綠 覆蓋(50 公頃)	0.0 公頃	10.0 公頃	0.0 公頃	0.0 公頃	0.0 公頃	20%	0%	
							10		
	防洪林帶 及行道樹 (15公里)	2.0 公里	14.0 公里			0.0 公里	107%	100%	
						16.0			



第一區		第二區		第三區		第四區		第五區	
水覆蓋		水覆蓋		水覆蓋		水覆蓋		水覆蓋	
蓄水池塘(公頃)		蓄水池塘(公頃)		蓄水池塘(公頃)		蓄水池塘(公頃)		蓄水池塘(公頃)	
綠覆蓋		綠覆蓋		綠覆蓋		綠覆蓋		綠覆蓋	
林帶植栽(公里)	2	防洪植栽(公里)	14	草籽撒播(公頃)		草籽撒播(公頃)		防洪植栽(公里)	
大沙丘植栽(公里)		綠覆蓋(公頃)	10					草籽撒播(公頃)	
疏濬填池綠覆(公頃)									
大沙丘綠覆(公頃)									
林帶植栽(公頃)									
其他覆蓋		其他覆蓋		其他覆蓋		其他覆蓋		其他覆蓋	
去化土砂(萬方)	26.68	去化土砂(萬方)		去化土砂(萬方)	40.14	三仙膠(公頃)		去化土砂(萬方)	3
灑水線(公頃)	2	河道整理(公里)		河道整理(公里)	1.2	稻草鋪設(農民)公頃		灑水系統(公頃)	
200公頃灑水系統(公頃)		灑水系統(公頃)	10	平鋪防塵網				便道鋪設級配(公頃)	
		牡蠣殼鋪灑(公頃)		便道鋪設級配				平鋪防塵網(公頃)	
三仙膠(公頃)		三仙膠(公頃)		三仙膠(公頃)				稻草鋪設(農民)公頃	
稻草鋪設(公頃)		稻草鋪設(公頃)	0.1	稻草鋪設(農民)公頃					
便道鋪設級配(公頃)	1.3	碎石級配鋪設(NO.40越堤路下)	1.3						
疏濬簡易灑水佈設(公頃)									
平鋪防塵網(公頃)	3								
直立式防塵網(公頃)									
三仙膠(公頃)									
牡蠣殼鋪灑(公頃)									
碎石級配(公頃)									
其他覆蓋總計	6.3	其他覆蓋總計	11.4	其他覆蓋總計	0	其他覆蓋總計	0	其他覆蓋總計	0
