


濁水溪揚塵抑制1091019~1091025周報表



防洪林帶植栽



本周施作项目及位置

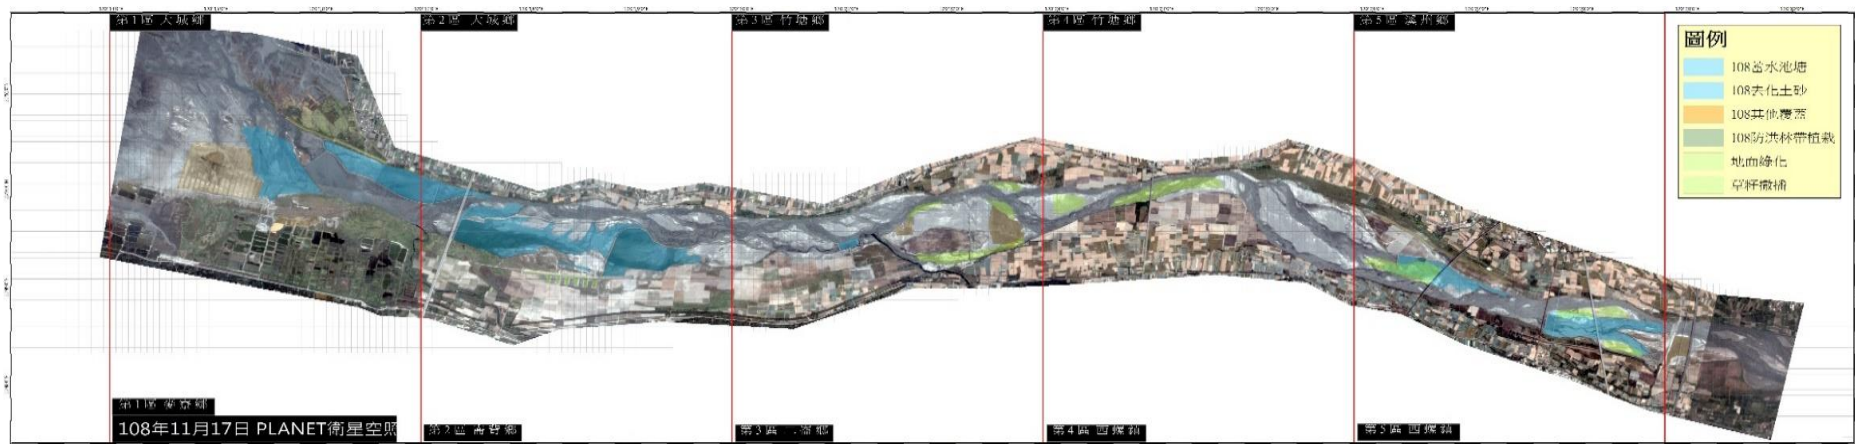

區域	施工位置	施工內容	目前進度
五	高鐵下	防洪林帶植栽(7.5公里)	7.5公里(100%)

各區空拍現況(更新至0904)

第一區

裸露地濕潤，稻草覆蓋無沖失



第二區

40號越堤蓄水池塘



第三區

74號越堤河道現況



第四區

高鐵上下游河道複式斷面營造



第五區













西螺橋上游綠覆良好



濁水溪揚塵改善措施執行期程

預定進度

實際進度

改善措施		109年							110年				實際完成
		5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
水利 防制工 法	水覆蓋 (300公 頃)												226公頃
													
	河道整 理 (2.5KM)												1.2公里
													
	河道疏濬及去 化土砂 (85萬方)(視 實際情形檢 討)												117.81萬 方
													
防災應 變	其他覆 蓋(500 公頃)												94.8公頃
													
造林新 植與撫 育	灘地綠 覆蓋(50 公頃)												78公頃
													
	防洪林帶 及行道樹 (15公里)												27.5公里
													

109年度改善措施分區項目及進度達成率

改善措施		區域					進度達成率	109年10月預定進度	備註
		第一區	第二區	第三區	第四區	第五區			
水利防制工法	水覆蓋(300公頃)	50.0 公頃	100.0 公頃	0.0 公頃	0.0 公頃	76.0 公頃	75.3%	30%	
							226		
	河道整理(2.5KM)		0.0 KM	1.2 KM			48.0%	20%	
						1.2			
	河道疏濬及去化土砂(85萬方)(視實際情形檢討)	47.8 萬	0.0 萬	51.4 萬		18.6 萬	138.6%	94%	
							117.81		
防災應變	其他覆蓋(500公頃)	17.4 公頃	11.4 公頃	45.0 公頃	0.0 公頃	21.0 公頃	19.0%	20%	
							94.8		
造林新植與撫育	灘地綠覆蓋(50公頃)	0.0 公頃	10.0 公頃	60.0 公頃	0.0 公頃	8.0 公頃	156%	10%	
							78		
	防洪林帶及行道樹(15公里)	2.0 公里	18.0 公里			7.5 公里	183%	100%	
						27.5			



第一區		第二區		第三區		第四區		第五區	
水覆蓋		水覆蓋		水覆蓋		水覆蓋		水覆蓋	
蓄水池塘(公頃)	50	蓄水池塘(公頃)	100	蓄水池塘(公頃)		蓄水池塘(公頃)		蓄水池塘(公頃)	76
綠覆蓋		綠覆蓋		綠覆蓋		綠覆蓋		綠覆蓋	
防洪植栽(公里)	2	防洪植栽(公里)	18	草籽撒播(公頃)	60	草籽撒播(公頃)		防洪植栽(公里)	7.5
大沙丘植栽(公里)		綠覆蓋(公頃)	10			防洪植栽(公里)		草籽撒播(公頃)	8
疏濬填池綠覆(公頃)									
大沙丘綠覆(公頃)									
林帶植栽(公頃)									
其他覆蓋		其他覆蓋		其他覆蓋		其他覆蓋		其他覆蓋	
去化土砂(萬方)	44.54	去化土砂(萬方)		去化土砂(萬方)	51.37	三仙膠(公頃)		去化土砂(萬方)	16
灑水線(公頃)	2	河道整理(公里)		河道整理(公里)	1.2	稻草鋪設(農民)公頃		灑水系統(公頃)	6
200公頃灑水系統(公頃)		灑水系統(公頃)	10	稻草蓆鋪設	42			便道鋪設級配(公頃)	
		牡蠣殼鋪灑(公頃)		便道鋪設級配				稻草蓆鋪設(公頃)	15
三仙膠(公頃)		三仙膠(公頃)		灑水線佈設(公頃)	3			稻草鋪設(農民)公頃	
稻草鋪設(公頃)	11.1	稻草鋪設(公頃)	0.1	稻草鋪設(農民)公頃					
便道鋪設級配(公頃)	1.3	碎石級配鋪設(NO.40越堤路下)	1.3						
疏濬簡易灑水佈設(公頃)									
平鋪防塵網(公頃)	3								
直立式防塵網(公頃)									
三仙膠(公頃)									
牡蠣殼鋪灑(公頃)									
碎石級配(公頃)									
其他覆蓋總計	17.4	其他覆蓋總計	11.4	其他覆蓋總計	45	其他覆蓋總計	0	其他覆蓋總計	21
