

濁水溪揚塵抑制1100531~1100606周報表



西濱橋下游稻草蓆鋪設



自強橋上游河道整理作業




200公頃防洪林帶植栽



大庄堤段河道整理作業



本周施作項目及位置

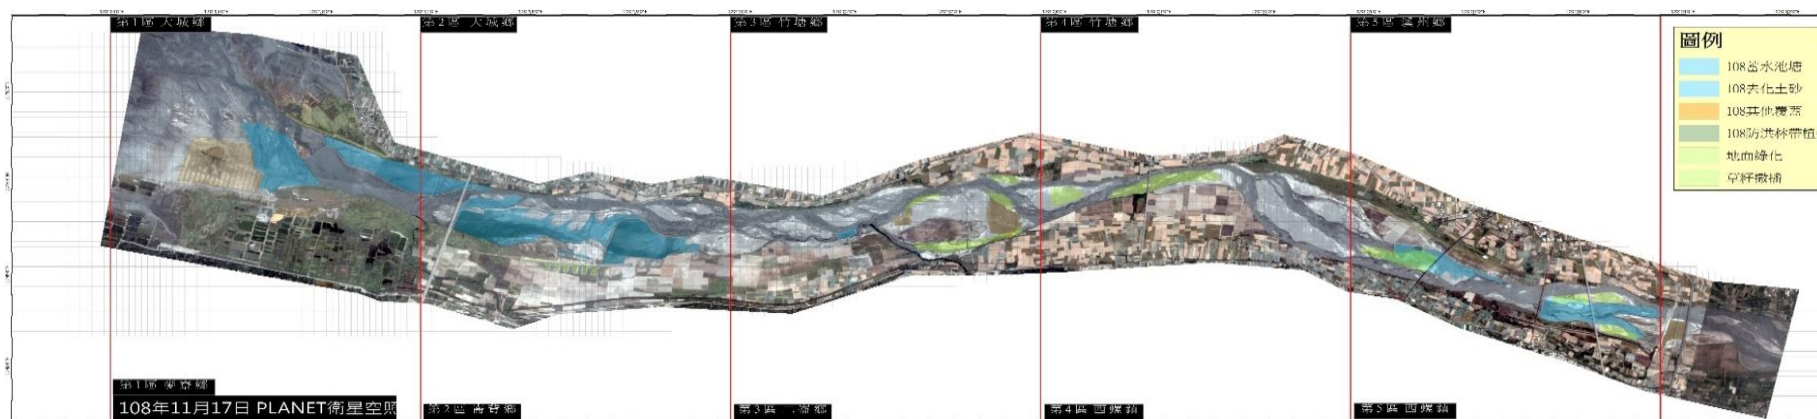

區域	施工位置	施工內容	目前進度
一	西濱橋下裸露地	稻草蓆鋪設	65公頃(100.0%)
一	200公頃	稻草蓆鋪設	6公頃(30.0%)
一	200公頃	便道級配鋪設	1.5公頃(100.0%)
一	200公頃	防洪林帶植栽	0.6公里(100.0%)
三	大庄堤防58號越堤	河道整理	0.04公里(4.4%)
四	自強橋上游裸露地	河道整理	0.162公里(16.2%)

各區空拍現況(更新至0531)

第一區

西濱大橋下游稻草席鋪設



第二區

40號越堤路蓄水池塘



第三區

自強大橋下稻草席鋪設



第四區

高鐵橋下游疏濬作業



第五區

西螺橋下水覆蓋、綠覆蓋




濁水溪揚塵改善措施執行期程

預定進度

實際進度

改善措施		110年							111年				實際完成	
		5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3		4
裸露地改善	水覆蓋 (400公頃)			5%		10%	30%	50%	60%	70%	80%	90%	100%	0公頃
	河道整理 (2.5KM)			5%		10%	30%	50%	60%	80%	80%	90%	100%	0.202公里
	灘地綠覆蓋 (50公頃)						15%	30%	60%	70%	80%	90%	100%	0公頃
	其他覆蓋 (450公頃)					10%	30%	50%	60%	70%	80%	90%	100%	72.5公頃
造林新植與撫育	防洪林帶及行道樹 (4公里)	80%	100%											0.6公里
應變	灑水	20%			25%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%	0公頃

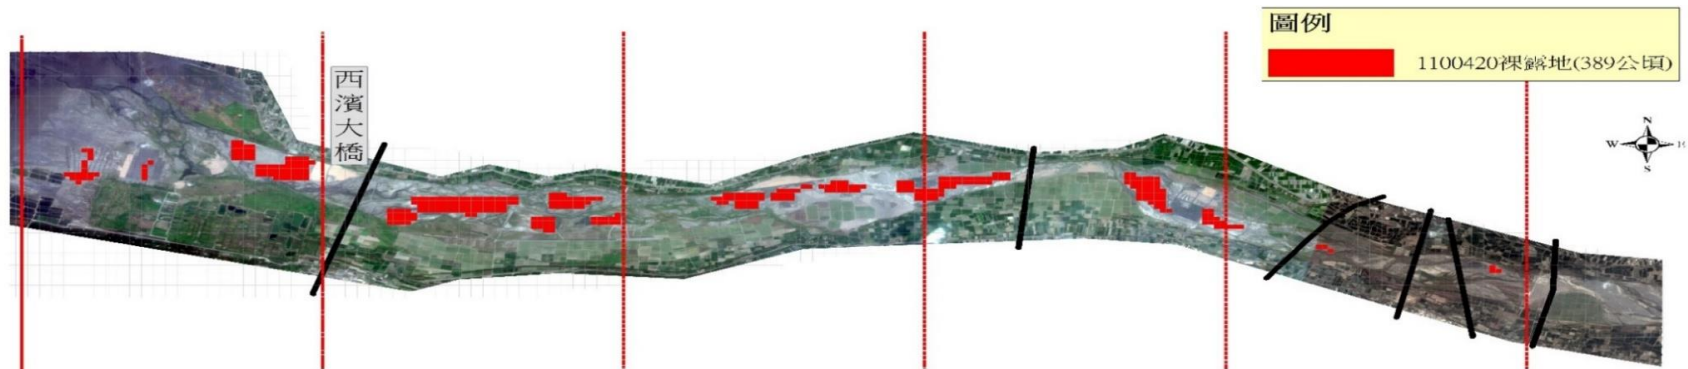

第一區		第二區		第三區		第四區		第五區	
水覆蓋									
蓄水池塘(公頃)		蓄水池塘(公頃)		蓄水池塘(公頃)		蓄水池塘(公頃)		蓄水池塘(公頃)	
綠覆蓋									
防洪植栽(公里) 0.6		防洪植栽(公里)		防洪植栽(公里)		防洪植栽(公里)		防洪植栽(公里)	
綠覆蓋(公頃)		綠覆蓋(公頃)		綠覆蓋(公頃)		綠覆蓋(公頃)		綠覆蓋(公頃)	
河道整理									
河道整理(公里)		河道整理(公里)		河道整理(公里) 0.04		河道整理(公里) 0.162		河道整理(公里)	
其他覆蓋									
200公頃灑水系統(公頃)		稻草蓆鋪設(公頃)		稻草蓆鋪設(公頃)		稻草蓆鋪設		稻草蓆鋪設(公頃)	
		灑水系統(公頃)		灑水系統(公頃)		灑水系統(公頃)		稻草蓆鋪設(公頃)	
稻草蓆鋪設(公頃) 71		便道鋪設級配(公頃)		便道鋪設級配(公頃)		便道鋪設級配(公頃)		灑水系統(公頃)	
灑水系統(公頃)		平鋪防塵網(公頃)		平鋪防塵網(公頃)		平鋪防塵網(公頃)		平鋪防塵網(公頃)	
便道鋪設級配(公頃) 1.5									
平鋪防塵網(公頃)									
小計 72.5		小計 0		小計 0		小計 0		小計 0	
緊急應變措施									
小計 0		小計 0		小計 0		小計 0		小計 0	
