

揚塵防治 週報表

110/06/21~110/06/27


本週揚塵抑制施作工項

110/06/21~110/06/27

本週因大雨影響
現地無法施工



本週工項進度及位置

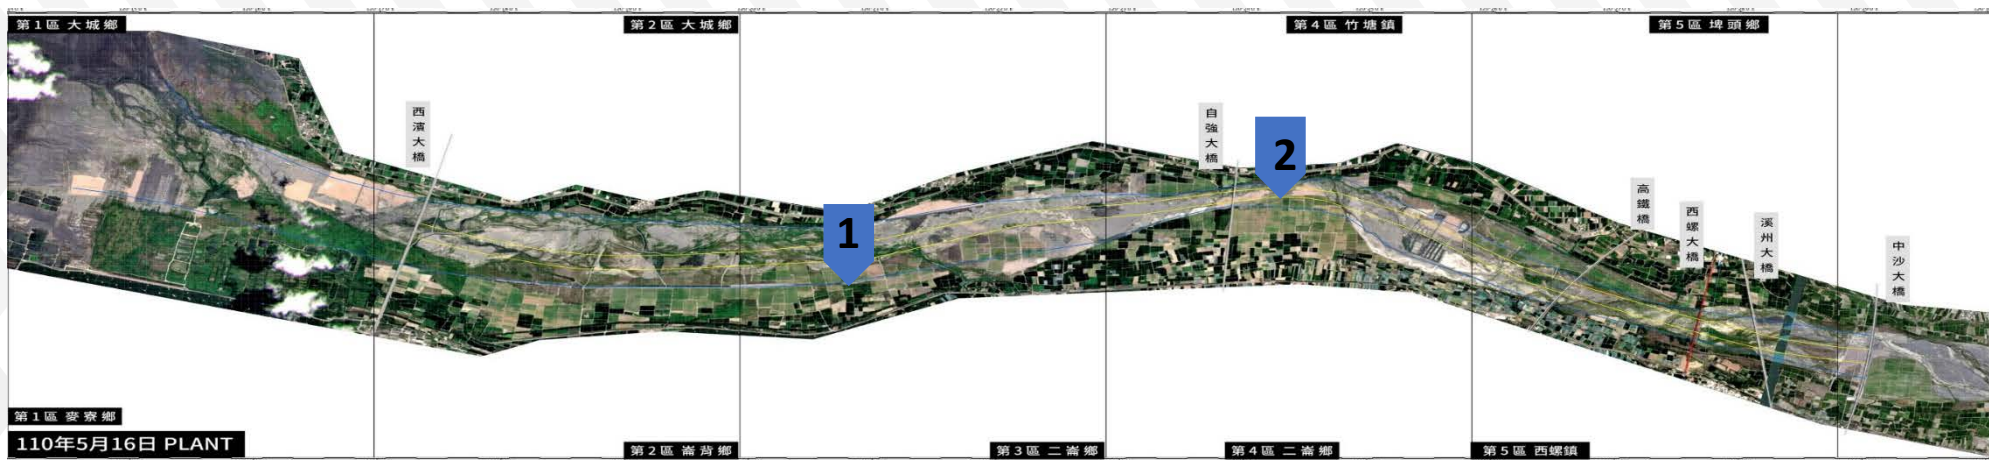

第三區 河道整理


1) 58號越堤河道整理(複式斷面) 0.04公里 進度4.4%

第四區 河道整理

2) 自強大橋上游河道整理 0.162公里 進度16.2%



各區空拍現況



第一區

200公頃



第二區

40號越堤路



第三區

自橋大橋下游



第四區

高鐵橋下游疏濬作業



第五區

西螺大橋上游



110年辦理情形：抑制面積及進度



水覆蓋

達成率 **%**

KPI	已完成
400 公頃	公頃



河道整理

達成率 **8%**

KPI	已完成
2.5 公里	0.202公里



綠覆蓋

達成率 **%**

KPI	已完成
50 公頃	公頃



其他覆蓋

達成率 **19.6%**

KPI	已完成
450公頃	88.3公頃




防洪植栽

達成率 **15%**

KPI	已完成
4 公里	0.6公里

辦理情形：全區各項揚塵抑制措施

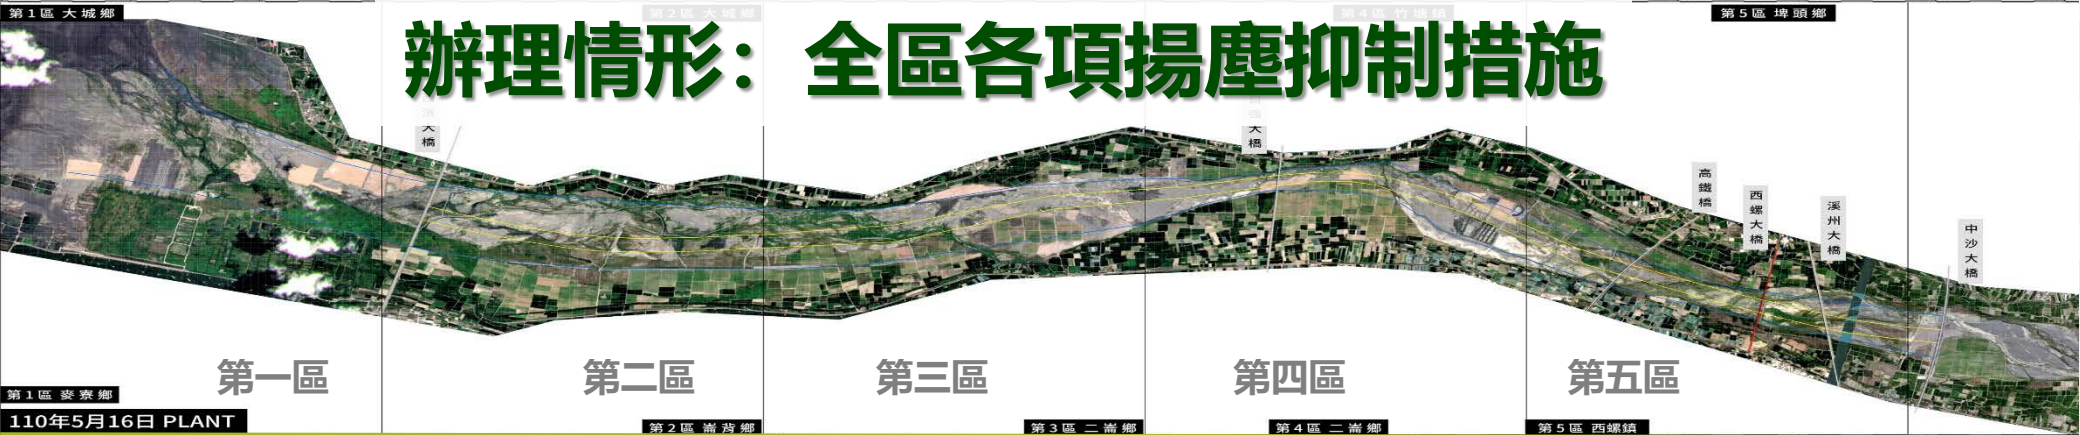

水覆蓋

河道整理

綠覆蓋

其他覆蓋

1) 防洪林帶0.6公里

- 1) 稻草蓆鋪設86.5公頃
- 2) 簡易灑水設施0.9公頃
- 3) 碎石級配0.9公頃

1) 河道整理培厚0.04公里

1) 河道整理0.162公里
