

揚塵防治 週報表

110/06/07~110/06/13

本週揚塵抑制施作工項

110/06/07~110/06/13

200公頃
稻草蓆鋪設

預定完成數量 25公頃



58號堤防培厚
河道整理

預定完成數量 0.9公里



自強橋上游
河道整理

預定完成數量 1公里



本週工項進度及位置



第一區 其他覆蓋

1) 200公頃水井稻草蓆鋪設 25公頃 進度100%

第三區 河道整理


2) 58號越堤河道整理(複式斷面) 0.04公里 進度4.4%

第四區 河道整理

3) 自強大橋上游河道整理 0.162公里 進度16.2%



各區空拍現況



第一區

200公頃



第二區

40號越堤路



第三區

自橋大橋下稻草蓆沖失



第四區

高鐵橋下游疏濬作業



第五區

西螺大橋攔水土堤沖失



110年辦理情形：抑制面積及進度



水覆蓋

達成率 **%**

KPI	已完成
400 公頃	公頃



河道整理

達成率 **8%**

KPI	已完成
2.5 公里	0.202公里



綠覆蓋

達成率 **%**

KPI	已完成
50 公頃	公頃



其他覆蓋

達成率 **19.6%**

KPI	已完成
450公頃	88.3公頃




防洪植栽

達成率 **15%**

KPI	已完成
4 公里	0.6公里

辦理情形：全區各項揚塵抑制措施

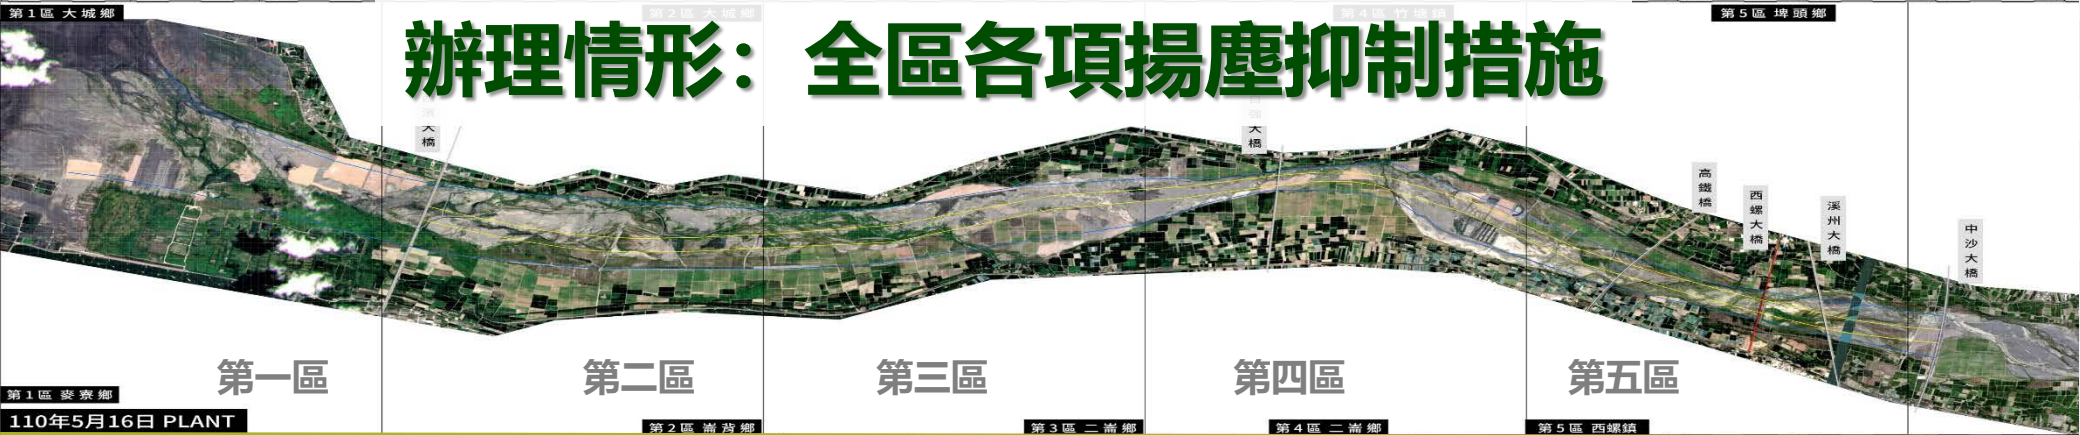

水
覆
蓋

河
道
整
理

綠
覆
蓋

其
他
覆
蓋

1) 防洪林帶0.6公里

- 1) 稻草蓆鋪設86.5公頃
- 2) 簡易灑水設施0.9公頃
- 3) 碎石級配0.9公頃

1) 河道整理培厚0.04公里

1) 河道整理0.162公里
