



揚塵防治 週報表

110/09/06~110/09/12


本週工項進度及位置 110/09/06~110/09/12

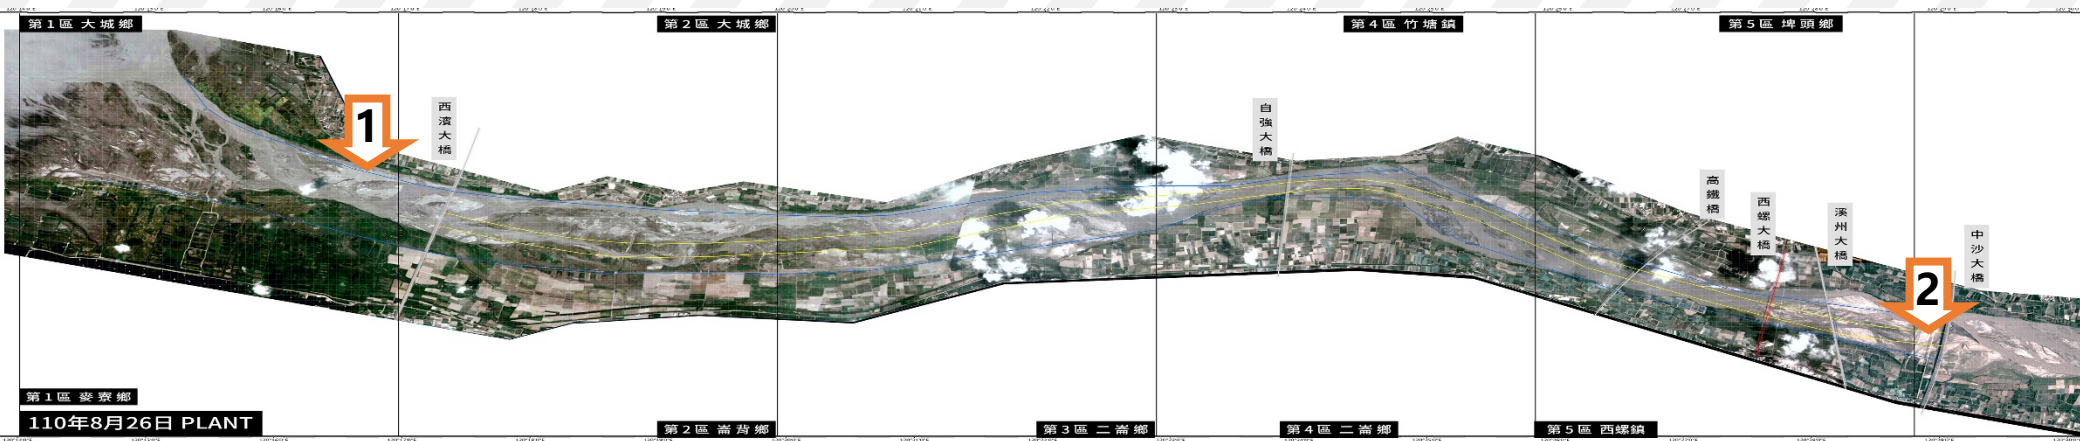

西濱大橋下游裸露地_稻草蓆鋪設

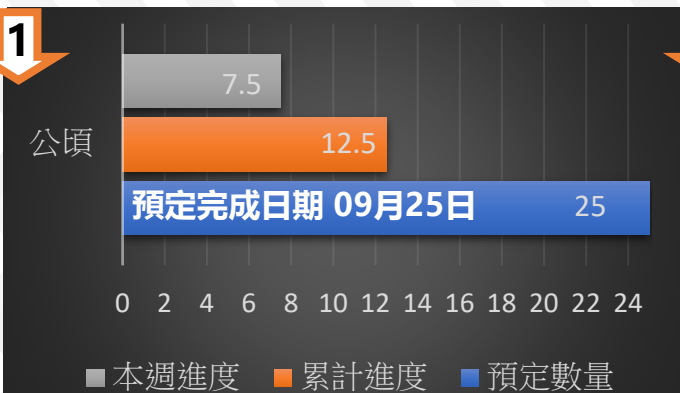

油管橋下游_稻草蓆鋪設

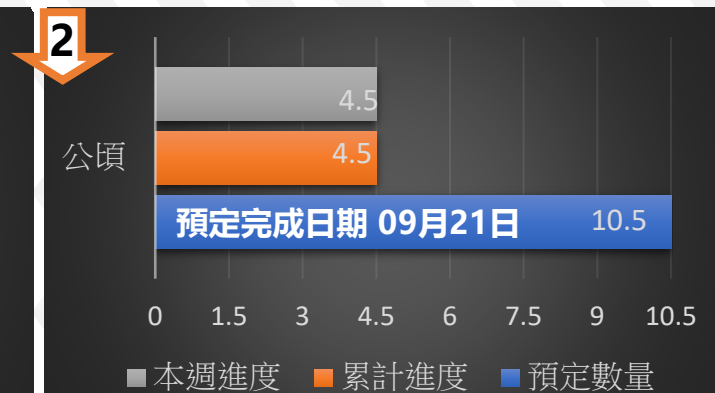



各區空拍現況



第一區

西濱大橋下游



第二區

40號越堤路



第三區

大義崙排水下游



第四區

高鐵橋下游



第五區

西螺大橋下游



110年辦理情形：抑制面積及進度



水覆蓋

達成率 **%**

KPI	已完成
400 公頃	公頃



河道整理

達成率 **67.2%**

KPI	已完成
2.5 公里	1.68公里



綠覆蓋

達成率 **474%**

KPI	已完成
50 公頃	237公頃



其他覆蓋

達成率 **27.9%**

KPI	已完成
450公頃	125.40公頃



防洪植栽

達成率 **77.5%**

KPI	已完成
4公里	3.1公里

營造複式斷面規圖

107-109 完成複式斷面

110 執行中複式斷面

111-112 規劃複式斷面



複式斷面

達成率

75%

KPI
2公里


已完成
1.5公里

➤ 未完成數量及期程：

- 1) 110年待完成0.5公里，
預計110年12月底完成




營造複式斷面規圖

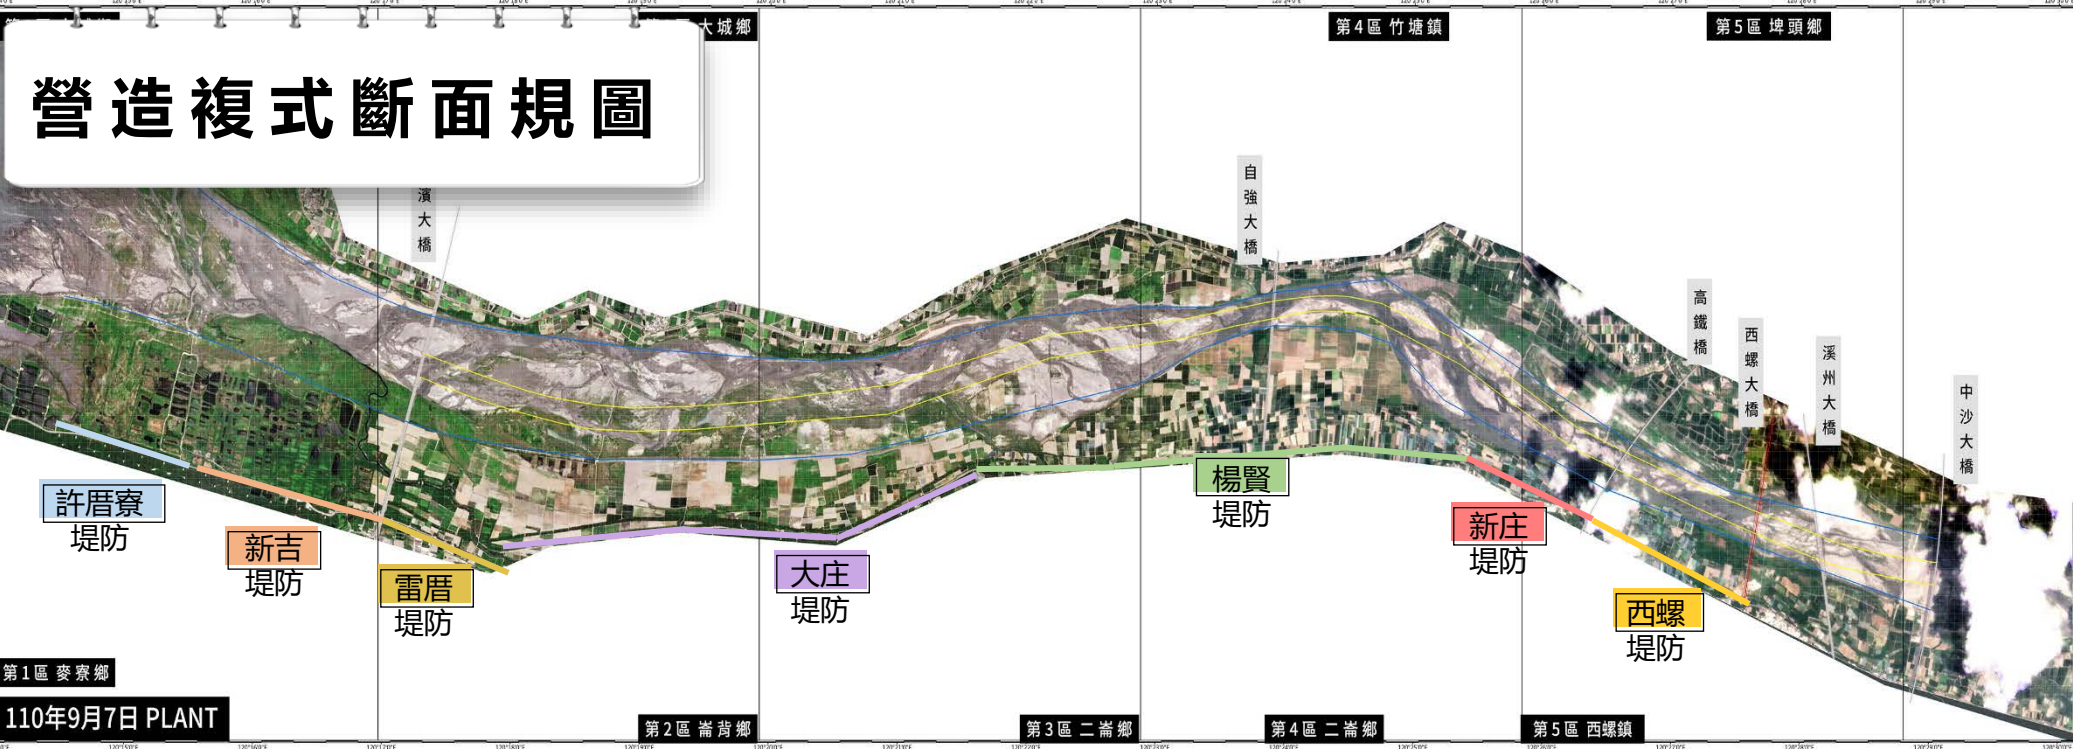

- ✓ 110年度辦理自強大橋上游1公里改善，並於堤後坡施設擋土牆，提供林務局於111年度協助種植。



揚塵抑制措施

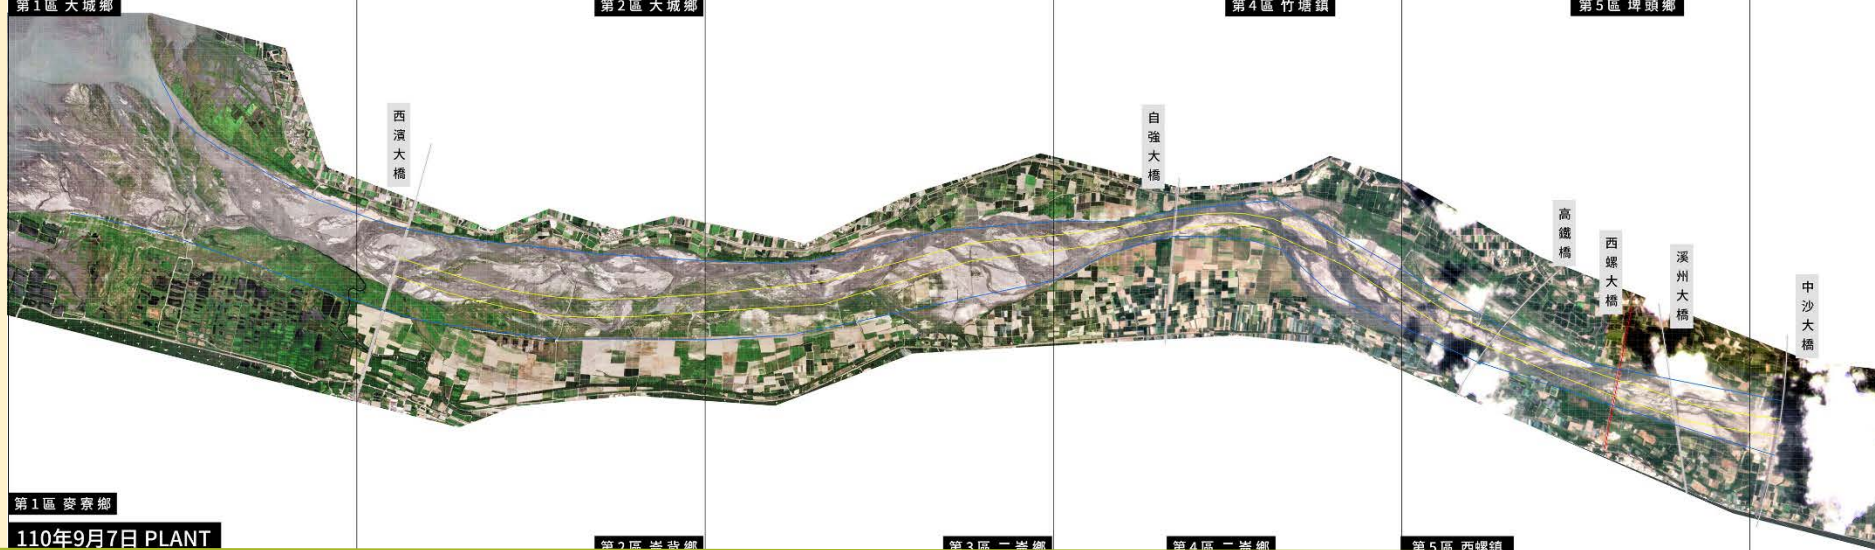

水覆蓋

河道整理

綠覆蓋

其他覆蓋

- 1) 防洪林帶0.6公里
- 2) 200公頃空灑草籽53公頃
- 3) 200公頃15-18水井空灑草籽18公頃

- 1) 西濱上下游空灑草籽23公頃
- 2) 44號越堤路空灑草籽33公頃
- 1) 防洪林帶1.5公里
- 2) 自強大橋上下游空灑草籽60公頃
- 3) 39號灘地林地植生1公里

- 1) 稻草蓆鋪設86.5公頃
- 2) 簡易灑水設施0.9公頃
- 3) 碎石級配0.9公頃
- 4) 防塵網鋪設1.5公頃
- 5) 西濱下游北岸稻草蓆鋪設12.5公頃

- 1) 58號複式斷面水線12公頃
- 2) 39號灘地植生灑水線1.6公頃
- 3) 39號低灘地鋪設稻草蓆5公頃

- 1) 中沙大橋上游空灑草籽50公頃

- 1) 油管橋下游_稻草蓆4.5公頃
