


揚塵防治 週報表

110/09/20~110/09/26

每日施工項目及位置

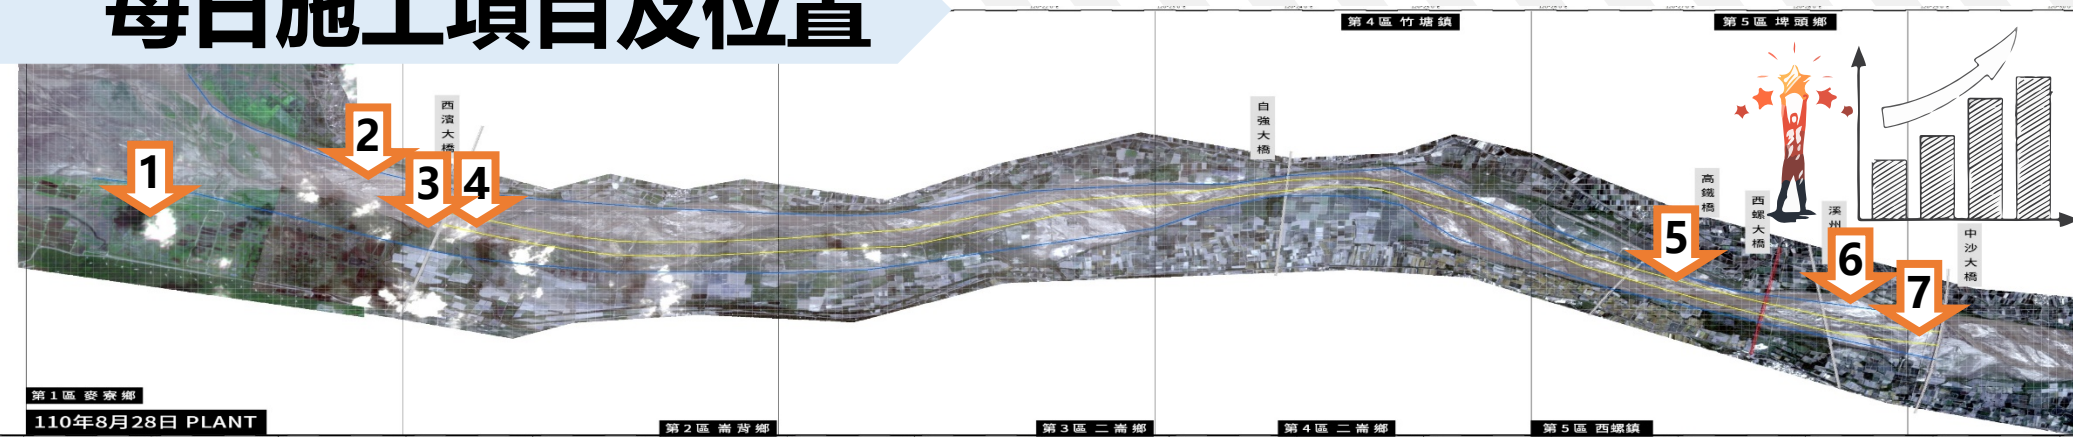



200公頃4-10號井北側_防塵網鋪設




西濱大橋下游北岸裸露地_稻草蓆鋪設



西濱大橋下方裸露地_稻草蓆鋪設

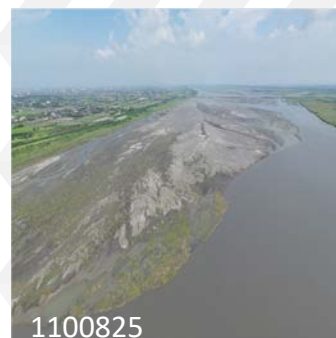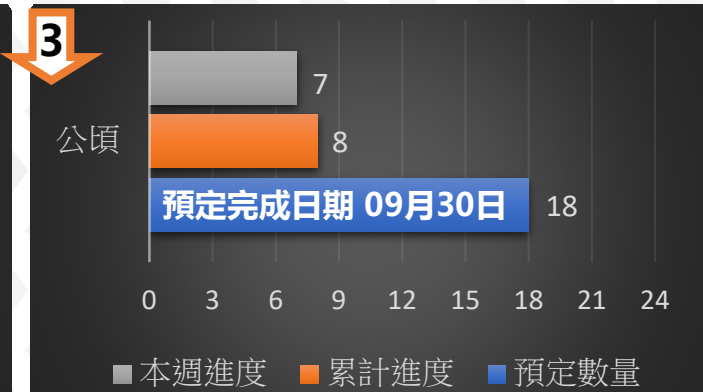


每日施工項目及位置

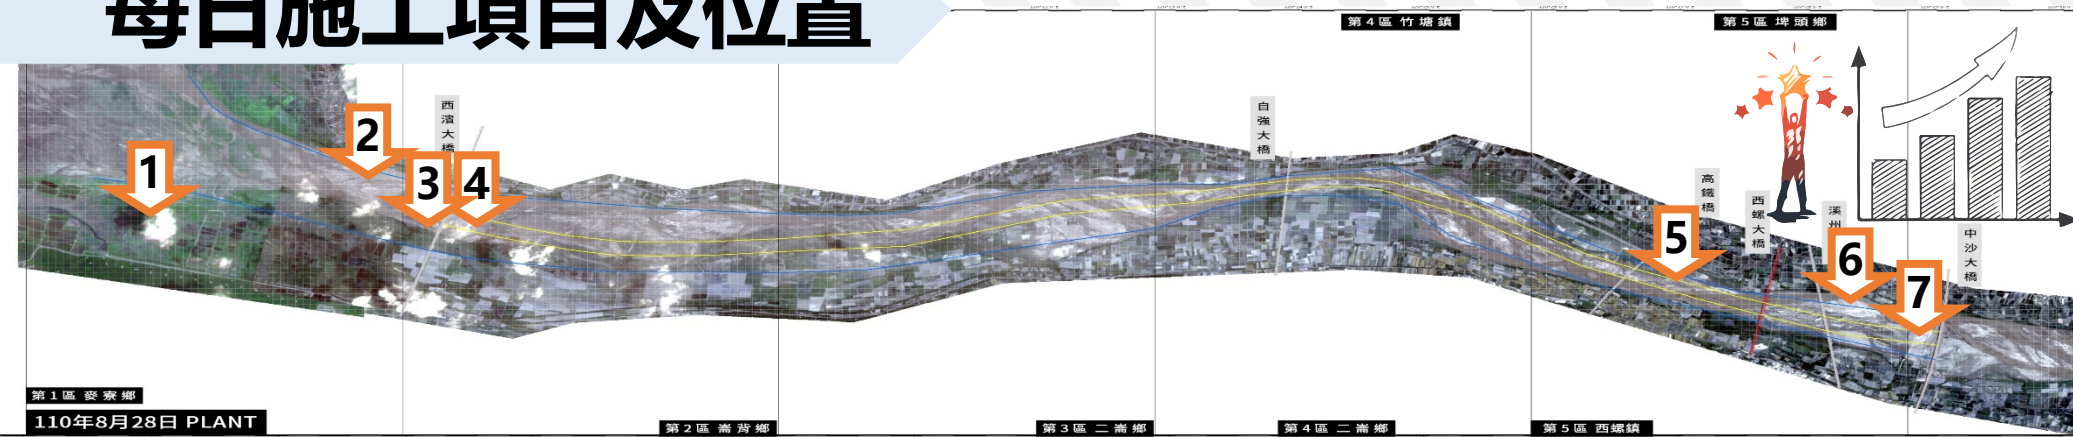

西濱大橋上游裸露地_攔水土堤




西螺大橋下游_空灑草籽

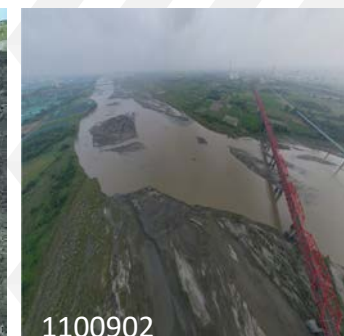



溪洲大橋上游北岸裸露地_稻草蓆鋪設



每日施工項目及位置

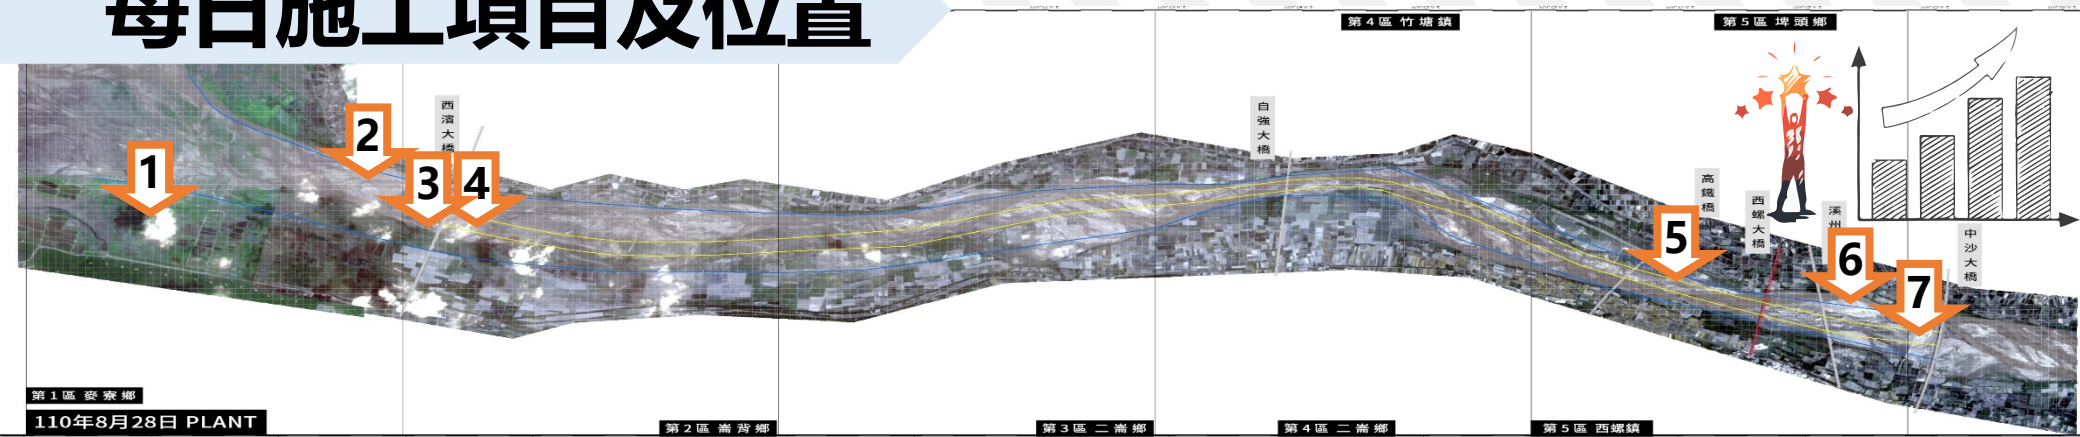

油管橋下游裸露地_稻草蓆鋪設

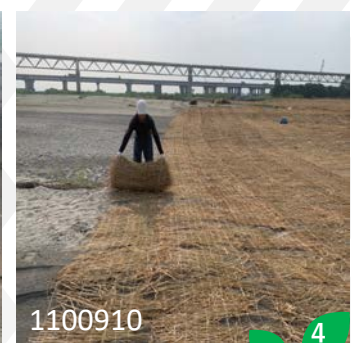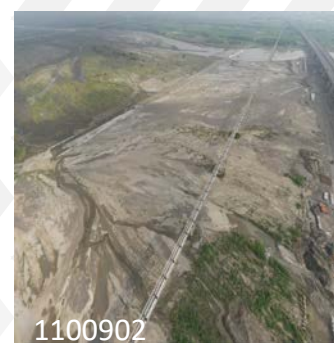



各區空拍現況



第一區

西濱大橋下游



第二區

40號越堤路



第三區

電塔下游



第四區

高鐵橋下游



第五區

中沙大橋下游



110年辦理情形：抑制面積及進度



水覆蓋

達成率 **37.5%**

KPI	已完成
400 公頃	150公頃



河道整理

達成率 **67.2%**

KPI	已完成
2.5 公里	1.68公里



綠覆蓋

達成率 **539%**

KPI	已完成
50 公頃	269.5公頃



其他覆蓋

達成率 **36.2%**

KPI	已完成
450公頃	162.9公頃




防洪植栽

達成率 **77.5%**

KPI	已完成
4公里	3.1公里

堤防兩岸植樹

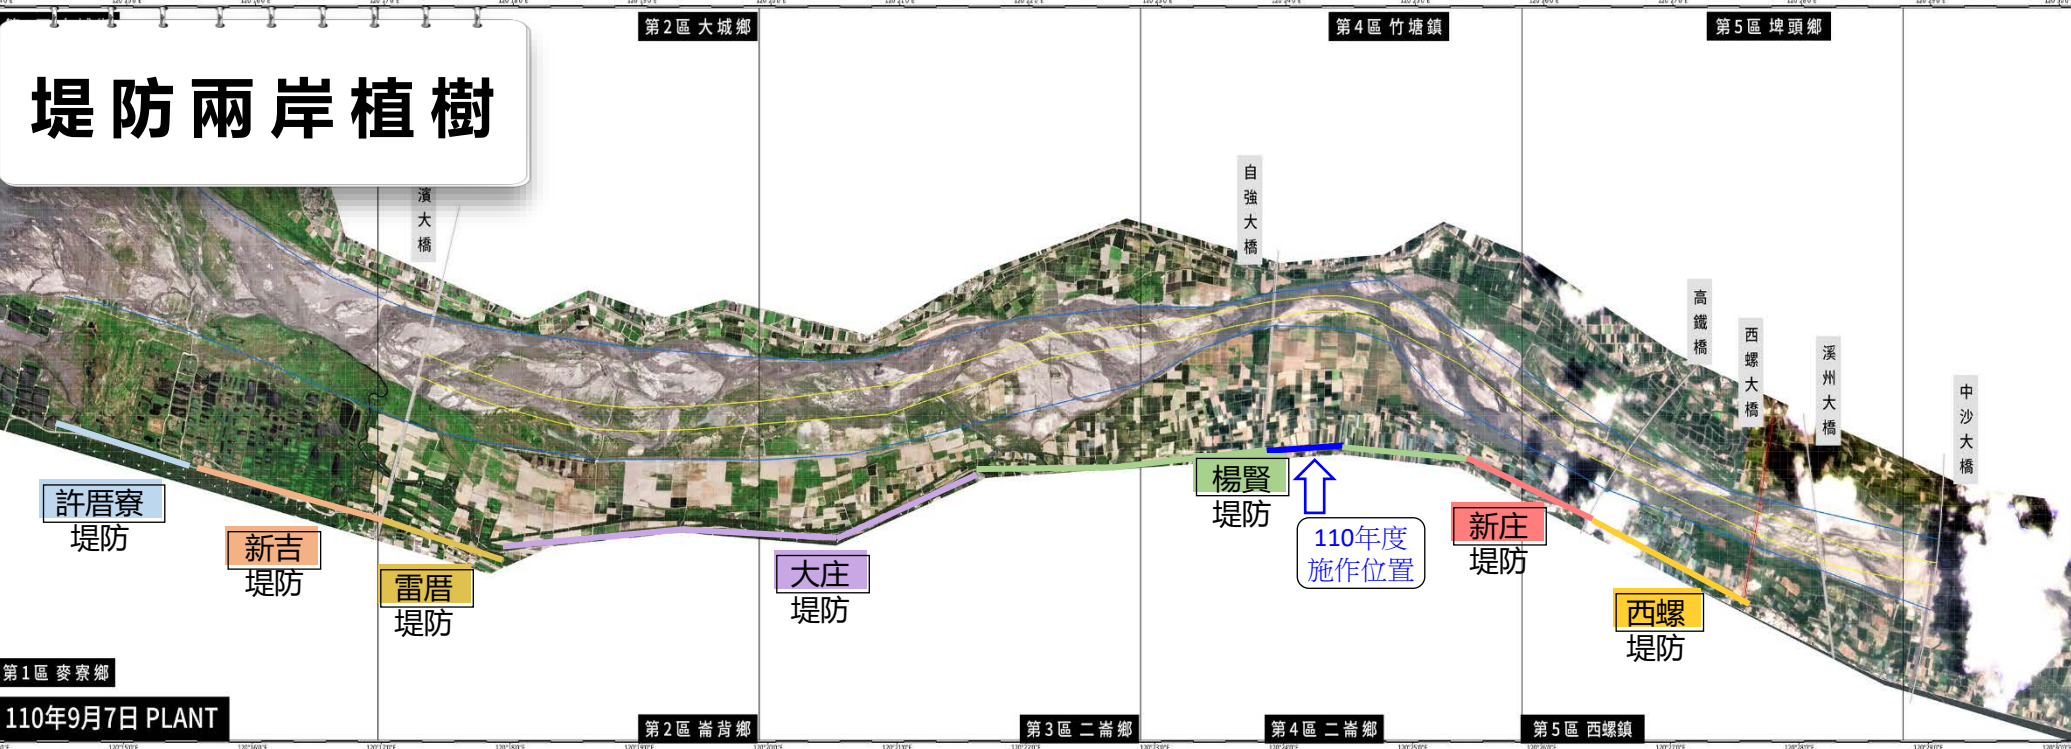

堤防兩岸植樹

達成率 **57%**

KPI
2公里

已完成
1.3公里


➤ 未完成數量及期程:

1) 110年10月底完成植栽1公里。

09/22已確認苗木數量

預計10/13進場整地, 10/15領苗種植, 10月底完成水防道路植栽1公里。

揚塵抑制措施

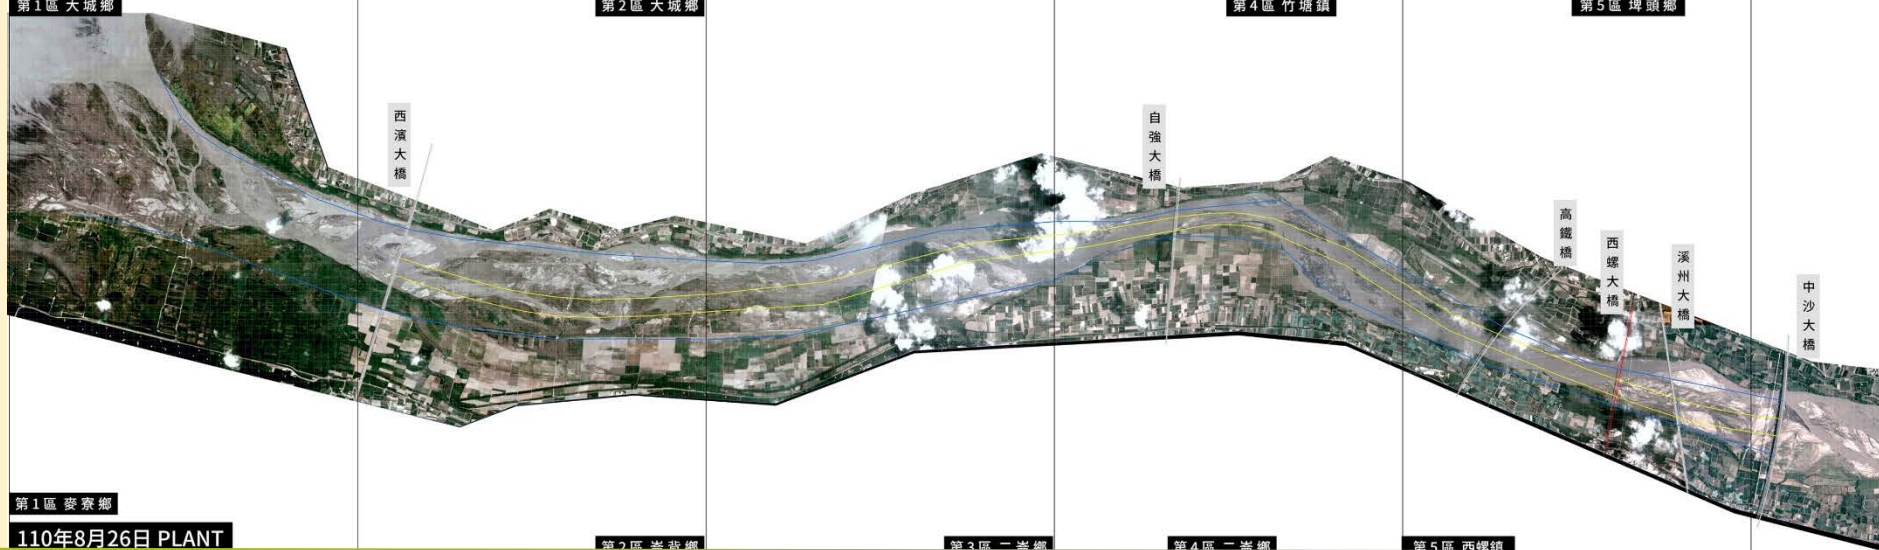

第1區 寮寮鄉

110年8月26日 PLANT

第2區 大城鄉

第3區 一崙鄉

第4區 竹塹鎮

第5區 西螺鎮

第5區 埤頭鄉

水覆蓋

1) 水覆蓋100公頃

1) 水覆蓋30公頃

1) 水覆蓋20公頃

河道整理

1) 河道整理培厚0.9公里

1) 河道整理0.78公里

綠覆蓋

- 1) 防洪林帶0.6公里
- 2) 200公頃空灑草籽53公頃
- 3) 200公頃15-18水井空灑草籽18公頃

- 1) 西濱上下游空灑草籽23公頃
- 2) 44號越堤路空灑草籽33公頃
- 1) 防洪林帶1.5公里
- 2) 自強大橋上下游空灑草籽60公頃
- 3) 39號灘地林地植生1公里

- 1) 中沙大橋上游空灑草籽50公頃
- 2) 西螺大橋下游空灑草籽32.5公頃

其他覆蓋

- 1) 稻草蓆鋪設86.5公頃
- 2) 簡易灑水設施0.9公頃
- 3) 碎石級配0.9公頃
- 4) 防塵網鋪設1.5公頃
- 5) 西濱下游北岸稻草蓆鋪設20公頃
- 6) 防塵網鋪設10公頃

1) 西濱下方_稻草蓆鋪設8公頃

- 1) 58號複式斷面水線12公頃
- 2) 39號灘地植生灑水線1.6公頃
- 3) 39號低灘地鋪設稻草蓆5公頃

- 1) 油管橋下游_稻草蓆10.5公頃
- 2) 溪州大橋上游北岸_稻草蓆6公頃
