
揚塵防治 週報表 110/09/27~110/10/03



出海口攔水土堤面 簡易灑水系統及草籽

西濱大橋下游北岸裸露地_稻草蓆鋪設


西濱大橋下方裸露地_稻草蓆鋪設

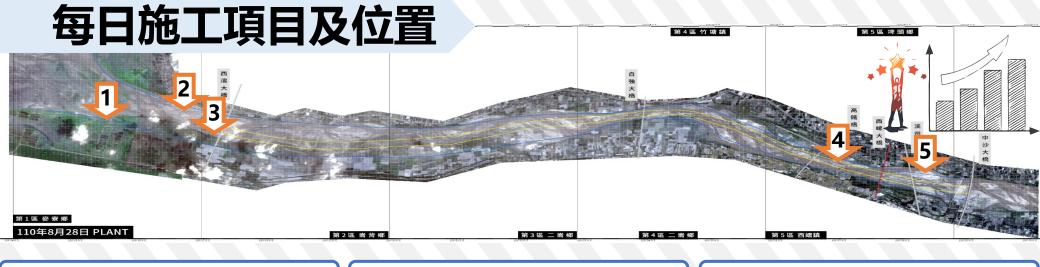


















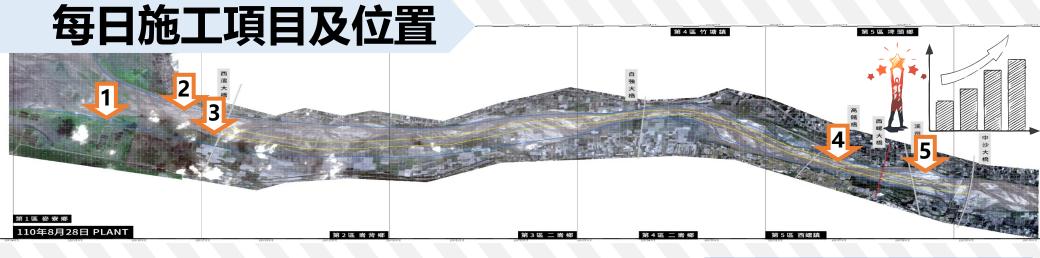







第一區 西濱大橋下游



第二區

40號越堤路



第三區

電塔下游



第四區

高鐵橋下游



第五區 中沙大橋下游



110年辦理情形:抑制面積及進度



水覆蓋

達成率

37.5%

KPI 400 公頃 已完成 150公頃



河道整理

達成率

67.2%

KPI

已完成

2.5 公里

1.68公里



綠覆蓋

達成率

541.4%

KPI

已完成

50 公頃

270.7公頃



其他覆蓋

達成率

41.2%

KPI

已完成

450公頃

185.6公頃



防洪植栽

達成率


77.5%

KPI

已完成

4公里

3.1公里

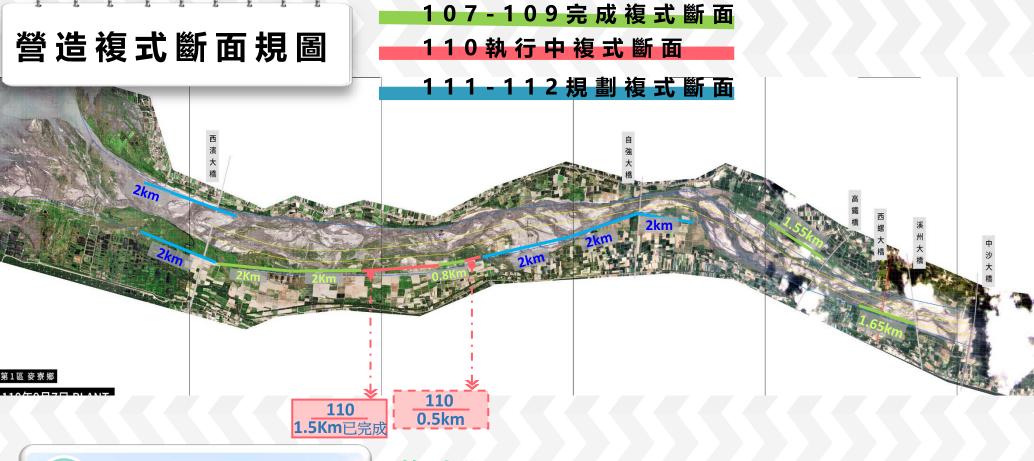



複式斷面

達成率 75%

KPI己完成2公里1.5公里

> 未完成數量及期程:

 目前尚未完成0.5公里, 預計10/15開始培厚, 12/15開始植栽,12月 底完成0.5公里複式斷面。





堤防兩岸植樹

達成率

0%

KPI 2公里 已完成 0公里 > 未完成數量及期程:

1) 110年10月底完成植栽1公里。

09/22已確認苗木數量

預計10/13進場整地, 10/15領苗種

植,10月底完成水防道路植栽1公里。



