

揚塵防治 週報表

110/10/18~110/10/24

本週配合揚塵預警辦理應變措施

➤ 揚塵預警辦理應變措施10/21

➤ 揚塵應變作為

(一)第一區(西濱大橋至出海口)

- 1.200公頃大沙洲既有水線噴灑。
- 2.200公頃大沙洲高灘裸露地水線加密2道水線噴灑。
- 3.200公頃大沙洲低灘裸露地水線加密5道水線噴灑。
- 4.200公頃大沙洲堤前便道1台灑水車灑水。
- 5.下海墘堤防7號越堤段堤前便道1台灑水車灑水。
- 6.下海墘堤防7號越堤段堤前高灘裸露地2台高揚程泵浦噴水及2台挖土機施作引水渠道。

(二)第二區(崙背草湖地區)

- 1.大庄堤防第44號至58號越堤段培厚植栽區水線灑水。
- 2.大庄堤防第40號至58號越堤段堤前便道1台灑水車灑水。

(三)第三區(二崙清潔隊前區域)

- 1.楊賢堤防第74號越堤段堤前便道1台灑水車灑水。
- 2.楊賢堤防第74號越堤段高灘裸露地1台高揚程泵浦噴水。
- 3.九塊厝堤防第39號越堤段培厚植栽區水線灑水。



每日施工項目及位置




西濱大橋下游北岸裸露地_稻草蓆鋪設



西濱大橋下方裸露地_稻草蓆鋪設



40-44號便道_木屑鋪設

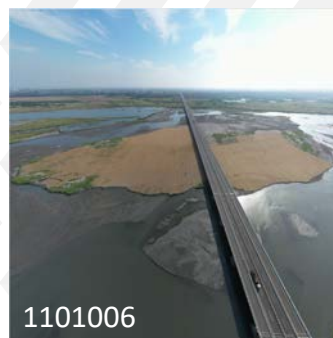

每日施工項目及位置





74號越堤路高灘地裸露地_防塵網鋪設



楊賢堤防_防汛道路植栽



溪洲大橋上游北岸裸露地_稻草蓆鋪設

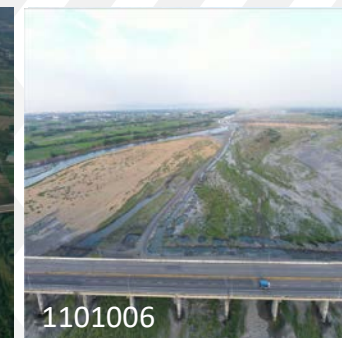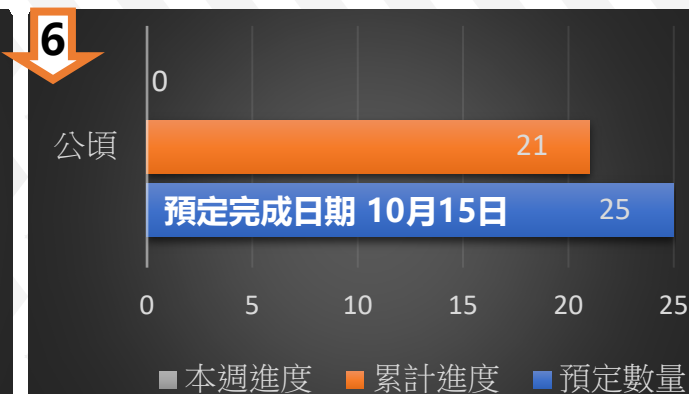

每日施工項目及位置



二水鐵路橋上游北岸灘地防洪林帶



依列管事項陳素月委員建議，於二水鐵路橋上游北岸疏濬培厚灘地栽植防洪林帶(五工區上游)





各區空拍現況



第一區

200公頃大沙洲



第二區

西濱大橋上下游



第三區

電塔下游



第四區

高鐵橋下游



第五區

西螺大橋上游



110年 揚塵KPI進度管控

- 抑制面積
- 進度

水覆蓋



KPI / 400公頃
已完成 / 168公頃
達成率 / 42%

河道整理



KPI / 2.5公里
已完成 / 1.68公里
達成率 / 67.2%

綠覆蓋



KPI / 50公頃
已完成 / 270.7公頃
達成率 / 541.4%

防洪植栽



KPI / 4公里
已完成 / 4.515公里
達成率 / 112.9%

其他覆蓋



KPI / 450公頃
已完成 / 211.1公頃
達成率 / 46.9%

營造複式斷面規圖

107-109 完成複式斷面

110 執行中複式斷面

111-112 規劃複式斷面



110
1.5Km 已完成

110
0.5km


複式斷面

達成率 75%


KPI	已完成
2公里	1.5公里

➤ 未完成數量及期程:

- 1) 因近日集集堰放水因素(10/20 預計放500CMS), 河道水位上漲導致取土區便道施作不易, 預計進場培厚期程修正於10/27。12月底完成0.5公里複式斷面。

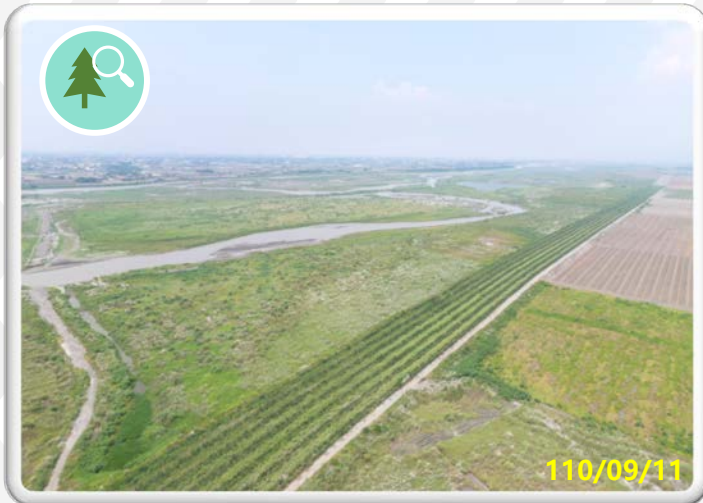

堤防兩岸植樹

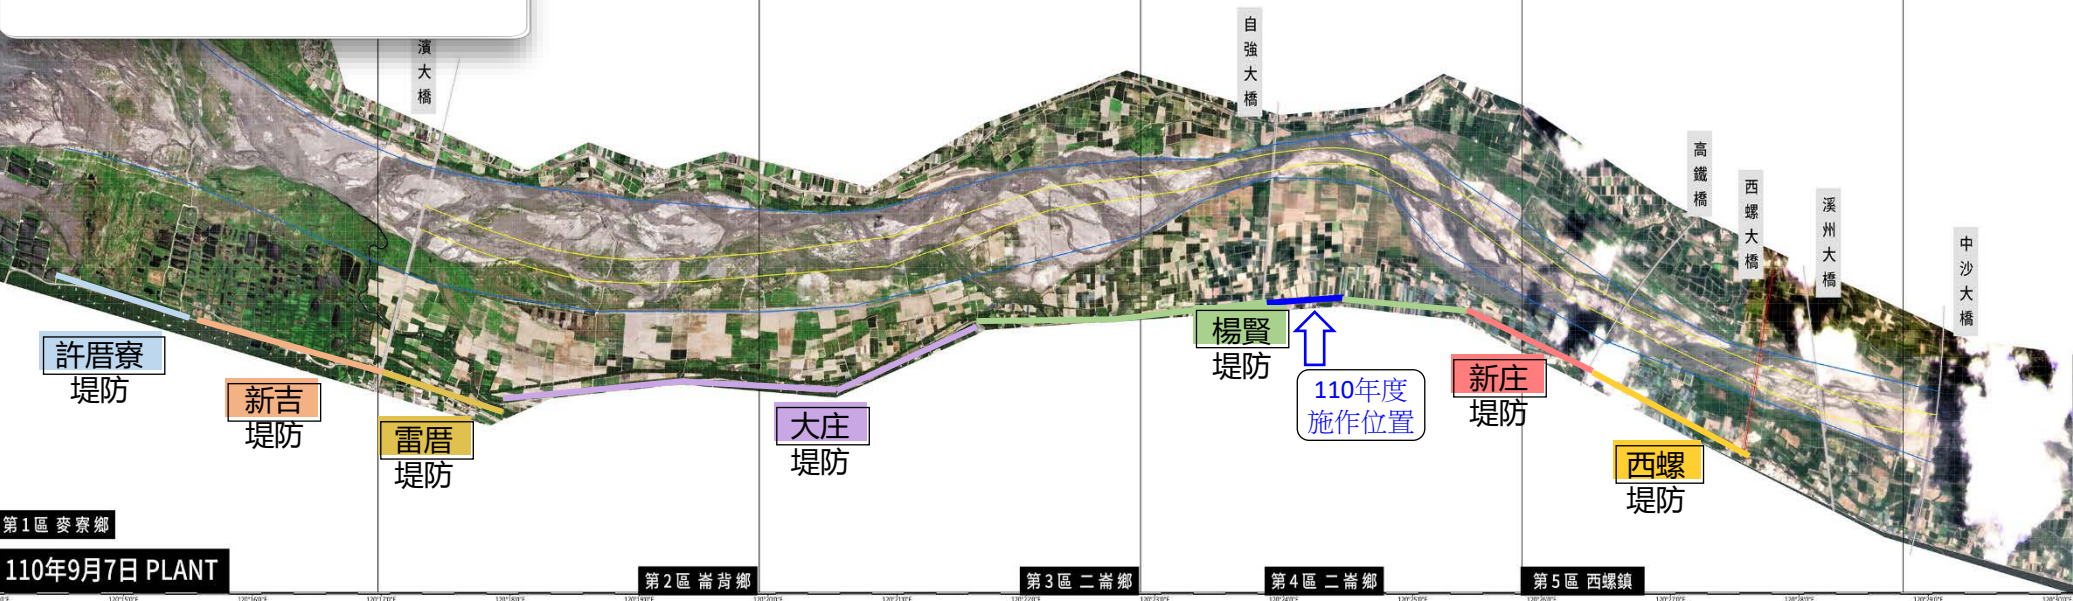

堤防兩岸植樹

達成率 **50%**

KPI
2公里

已完成
1公里

➤ 已完成數量及期程:

- 1) 10月21日完成楊賢堤防道路植栽
1公里。

揚塵抑制措施



水覆蓋

1) 水覆蓋100公頃

1) 水覆蓋30公頃

1) 水覆蓋20公頃
2) 水覆蓋18公頃

河道整理

1) 河道整理培厚0.9公里

1) 河道整理0.78公里

綠覆蓋

- 1) 防洪林帶0.6公里
- 2) 200公頃空灑草籽53公頃
- 3) 200公頃15-18水井空灑草籽18公頃
- 4) 綠覆蓋1.2公頃

- 1) 西濱上下游空灑草籽23公頃
- 2) 44號越堤路空灑草籽33公頃
- 1) 防洪林帶1.5公里
- 2) 自強大橋上下游空灑草籽60公頃
- 3) 39號灘地林地植生1公里

1) 楊賢堤防_防汛道路植栽1公里

- 1) 中沙大橋上游空灑草籽50公頃
- 2) 西螺大橋下游空灑草籽32.5公頃
- 3) 二水鐵路橋上游北岸灘地植生林帶0.415公里

其他覆蓋

- 1) 稻草蓆鋪設86.5公頃
- 2) 簡易灑水設施0.9公頃
- 3) 碎石級配0.9公頃
- 4) 防塵網鋪設1.5公頃
- 5) 西濱下游北岸稻草蓆鋪設31公頃
- 6) 防塵網鋪設10公頃
- 7) 簡易灑水1.7公頃
- 8) 22號井防塵網鋪設6公頃

- 1) 西濱下方_稻草蓆鋪設19公頃
- 2) 40-44號施工便道木屑鋪設0.5公頃
- 1) 58號複式斷面水線12公頃
- 2) 39號灘地植生灑水線1.6公頃
- 3) 39號低灘地鋪設稻草蓆5公頃
- 4) 74號越堤路高灘平鋪式防塵網2公頃

- 1) 油管橋下游_稻草蓆10.5公頃
- 2) 溪州大橋上游北岸_稻草蓆21公頃
