


揚塵防治 週報表

110/10/25~110/10/31

每日施工項目及位置

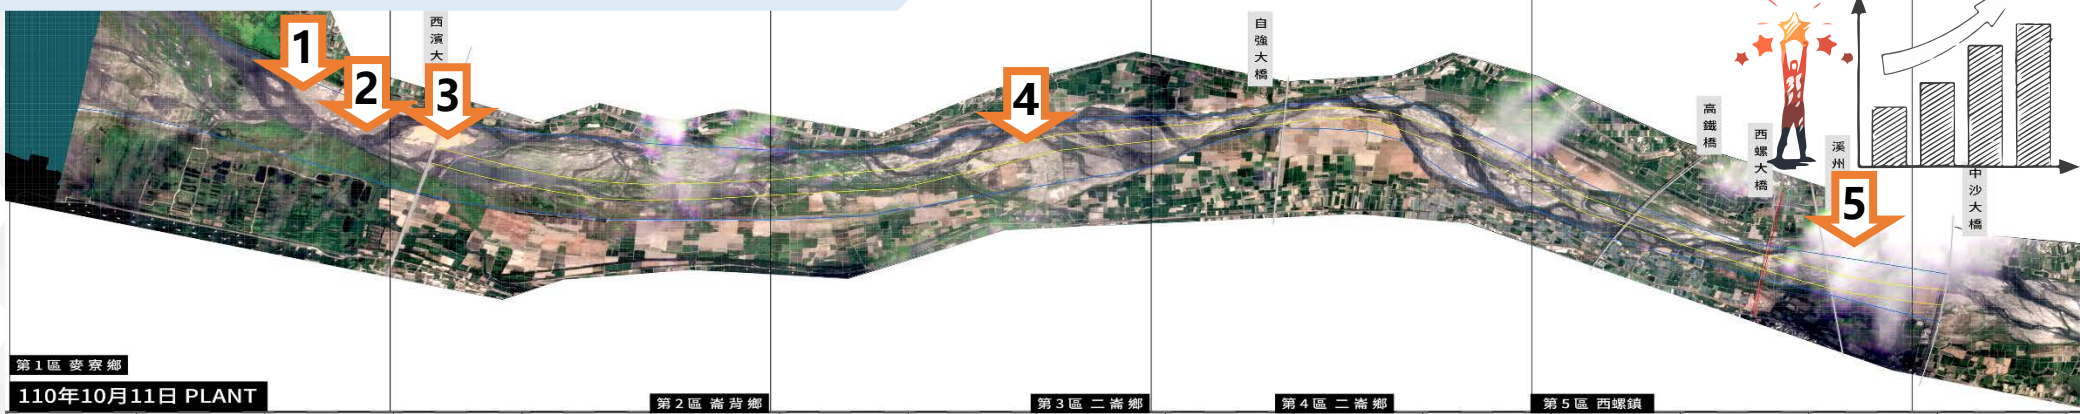



西濱大橋下游北岸裸露地_稻草蓆鋪設




西濱大橋下游北岸河中島_防塵網鋪設



西濱大橋下方裸露地_稻草蓆鋪設

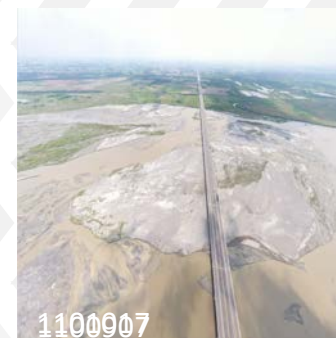
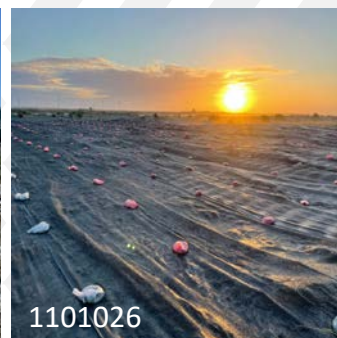


每日施工項目及位置

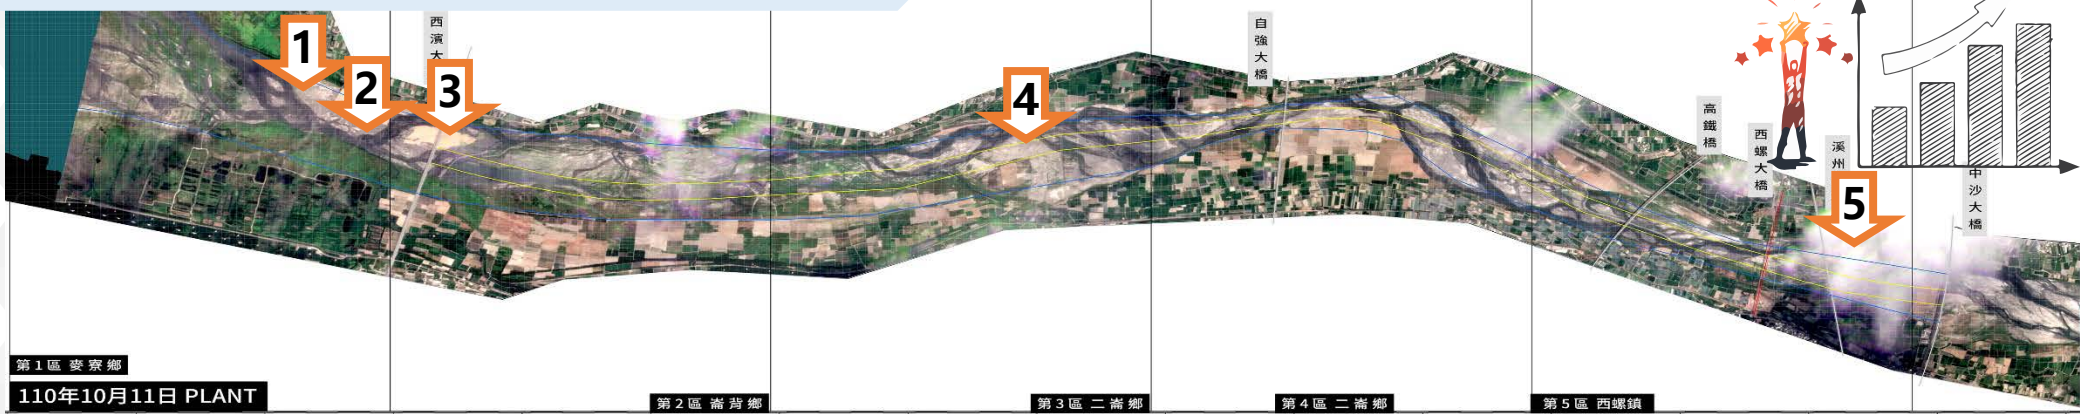

74號越堤路高灘地裸露地_防塵網鋪設

溪洲大橋上游北岸裸露地_稻草蓆鋪設

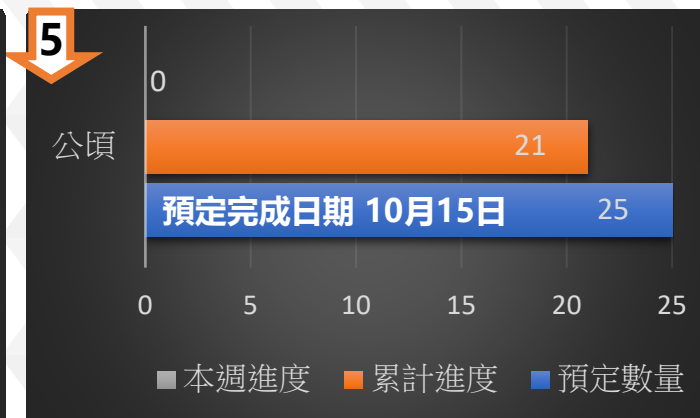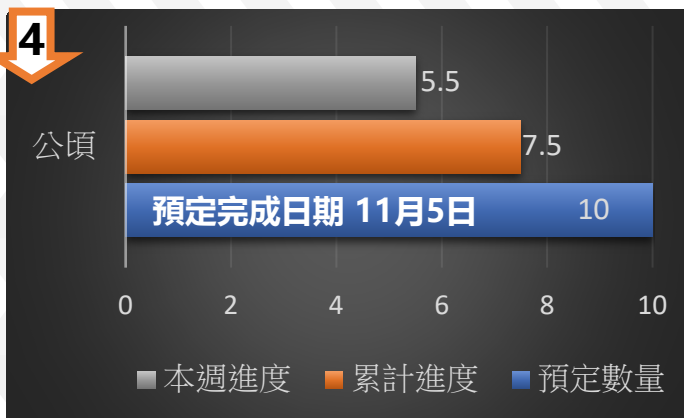



各區空拍現況



第一區
200公頃大沙洲



第二區
西濱大橋上游



第三區
電塔上游



第四區
高鐵橋下游



第五區
西螺大橋上游



110年 揚塵KPI進度管控

- 抑制面積
- 進度

水覆蓋



KPI / 400公頃
已完成 / 168公頃
達成率/ 42%

河道整理



KPI / 2.5公里
已完成 / 1.68公里
達成率/ 67.2%

綠覆蓋



KPI / 50公頃
已完成 / 270.7公頃
達成率/ 541.4%

防洪植栽



KPI / 4公里
已完成 / 4.515公里
達成率/ 112.9%

其他覆蓋



KPI / 450公頃
已完成 / 228.1公頃
達成率/ 50.7%

營造複式斷面規圖

107-109 完成複式斷面

110 執行中複式斷面

111-112 規劃複式斷面



110
1.5Km 已完成

110
0.5km

複式斷面

達成率

75%

KPI
2公里


已完成
1.5公里

➤ 未完成數量及期程：

- 1) 11/1日進場施作便道作業中，預計12月底完成0.5公里複式斷面。



堤防兩岸植樹

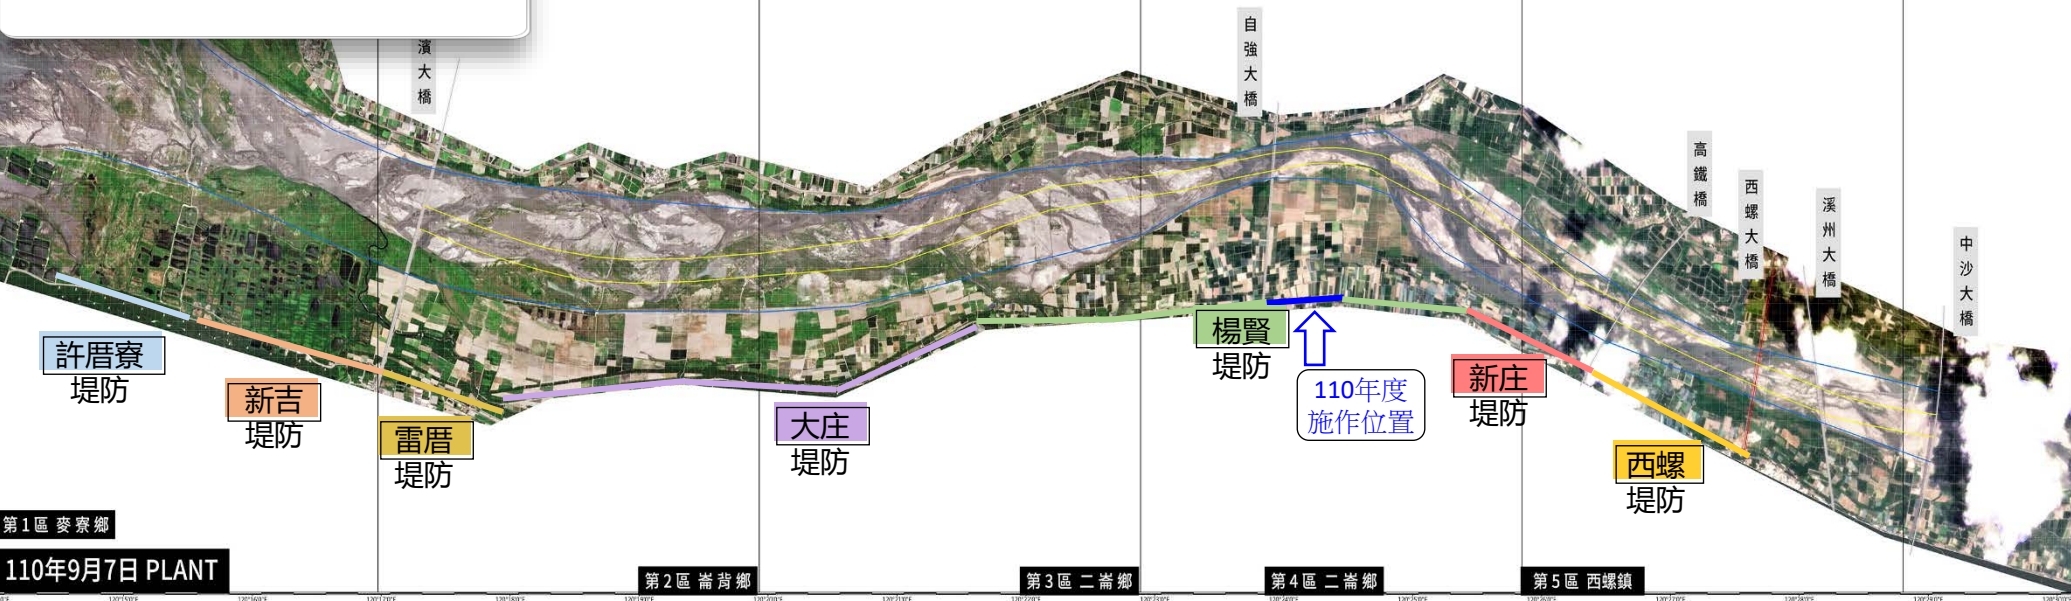

堤防兩岸植樹

達成率 50%

KPI
2公里


已完成
1公里

➤ 已完成數量及期程:

- 1) 10月21日完成楊賢堤防道路植栽1公里。



揚塵抑制措施

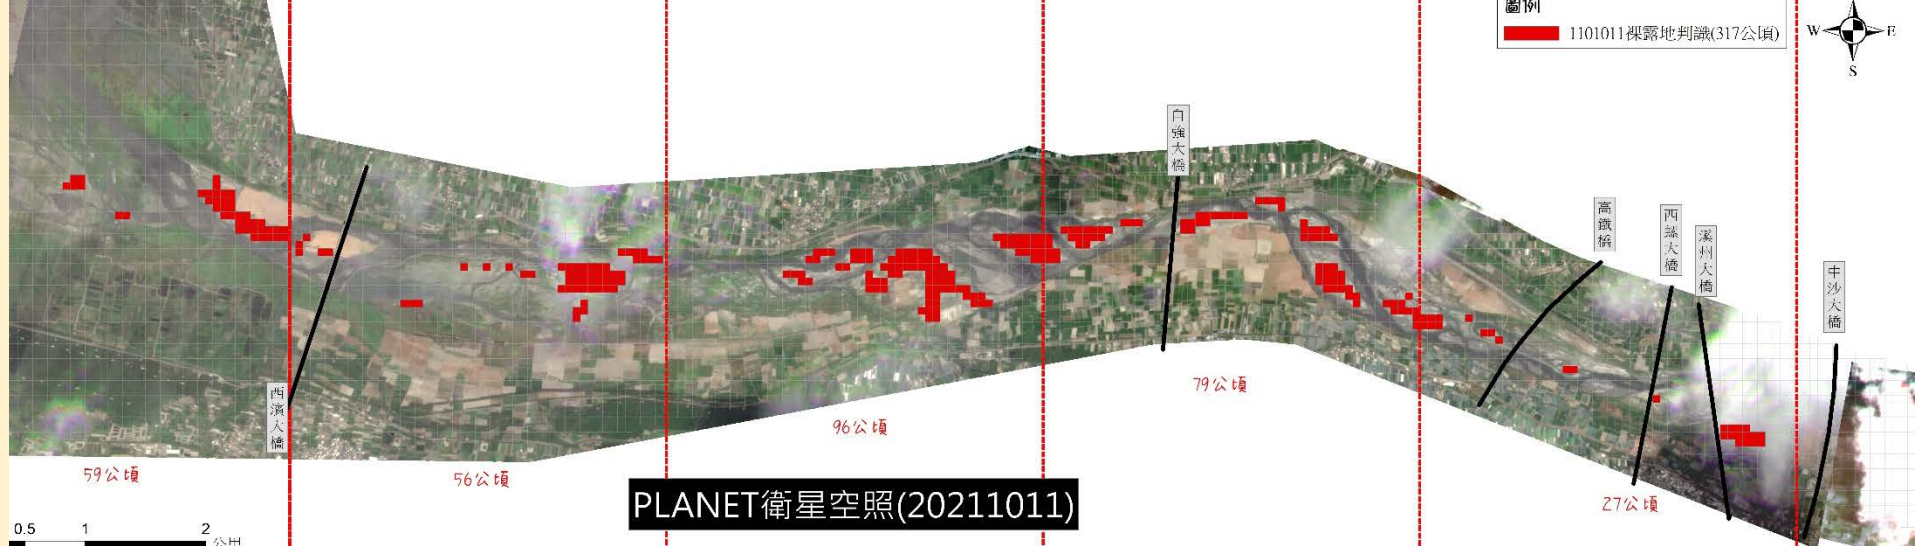

水覆蓋河道整理

綠覆蓋

其他覆蓋

1) 水覆蓋100公頃

1) 水覆蓋30公頃

1) 水覆蓋20公頃
2) 水覆蓋18公頃

1) 河道整理培厚0.9公里

1) 河道整理0.78公里

- 1) 防洪林帶0.6公里
- 2) 200公頃空灑草籽53公頃
- 3) 200公頃15-18水井空灑草籽18公頃
- 4) 綠覆蓋1.2公頃

- 1) 西濱上下游空灑草籽23公頃
- 2) 44號越堤路空灑草籽33公頃
- 1) 防洪林帶1.5公里
- 2) 白強大橋上下游空灑草籽60公頃
- 3) 39號灘地林地植生1公里

- 1) 楊賢堤防_防汛道路植栽1公里

- 1) 中沙大橋上游空灑草籽50公頃
- 2) 西螺大橋下游空灑草籽32.5公頃
- 3) 二水鐵路橋上游北岸灘地植生林帶0.415公里

- 1) 稻草蓆鋪設86.5公頃
- 2) 簡易灑水設施0.9公頃
- 3) 碎石級配0.9公頃
- 4) 防塵網鋪設1.5公頃
- 5) 西濱下游北岸稻草蓆鋪設39公頃
- 6) 西濱下游北岸河中島防塵網4.5公頃
- 7) 防塵網鋪設10公頃
- 8) 簡易灑水1.7公頃
- 9) 22號井防塵網鋪設6公頃

- 1) 西濱下方_稻草蓆鋪設19公頃
- 2) 40-44號施工便道木屑鋪設0.5公頃
- 1) 58號複式斷面水線12公頃
- 2) 39號灘地植生灑水線1.6公頃
- 3) 39號低灘地鋪設稻草蓆5公頃
- 4) 74號越堤路高灘平鋪式防塵網7.5公頃

- 1) 油管橋下游_稻草蓆10.5公頃
- 2) 溪州大橋上游北岸_稻草蓆21公頃
