

揚塵防治 週報表


110/11/15~110/11/21



西濱大橋下游北岸_河道整理

西濱大橋北岸裸露地_平鋪式防塵網

西濱大橋下方裸露地_平鋪式防塵網

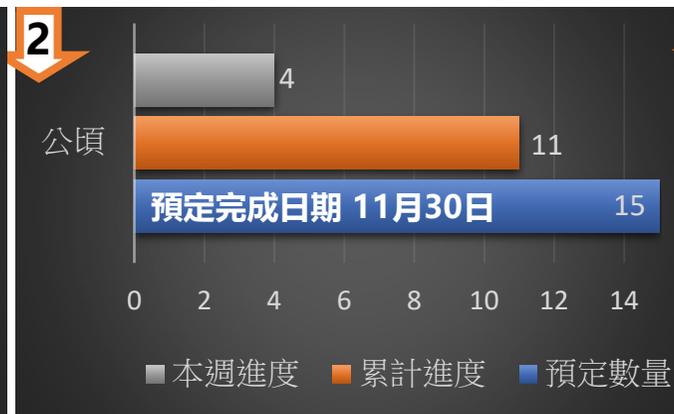






40-44號越堤路_平鋪式防塵網

電塔下游南岸裸露地(B)_平鋪式防塵網

自強大橋上方裸露地_稻草蓆鋪設



依作業工地現況調整預定完成時間

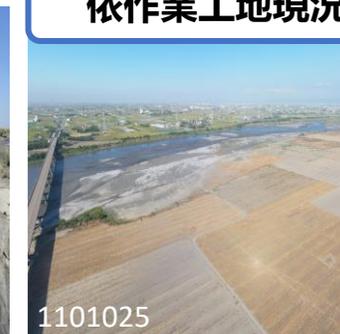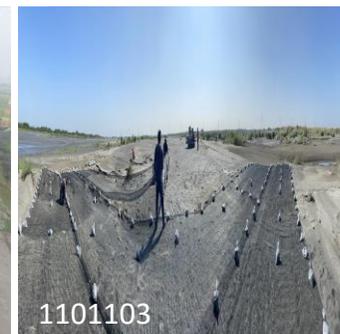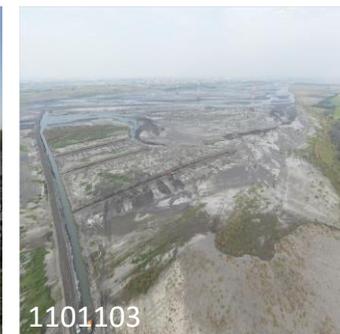



自強大橋上游94號越堤路段_攔水土堤



依作業工地現況調整預定完成時間





各區空拍現況



第一區 200公頃大沙洲



第二區 西濱大橋上游



第三區 自強大橋上游



第四區 高鐵橋下游



第五區 西螺大橋上游



110年 揚塵KPI進度管控

- 抑制面積
- 進度

水覆蓋



KPI / 400公頃
已完成 / 168公頃
達成率/ 42%

河道整理



KPI / 2.5公里
已完成 / 1.98公里
達成率/ 79.2%

綠覆蓋



KPI / 50公頃
已完成 / 274.7公頃
達成率/ 549.4%

防洪植栽



KPI / 4公里
已完成 / 4.515公里
達成率/ 112.9%

其他覆蓋



KPI / 450公頃
已完成 / 287.6公頃
達成率/ 63.9%

營造複式斷面規圖

- 107-109 完成複式斷面
- 110 執行中複式斷面
- 111-112 規劃複式斷面



110
1.5Km已完成

110
0.5km



複式斷面


達成率 **75%**

KPI	已完成
2公里	1.5公里

➤ 未完成數量及期程：

- 1) 11/1 進場施作便道，受11/12 大義崙排水放流影響，導致原取土便道沖毀，目前執行便道修復中，預計於11/23開始取土作業，並於12月底完成0.5公里複式斷面土方培厚。

堤防兩岸植樹

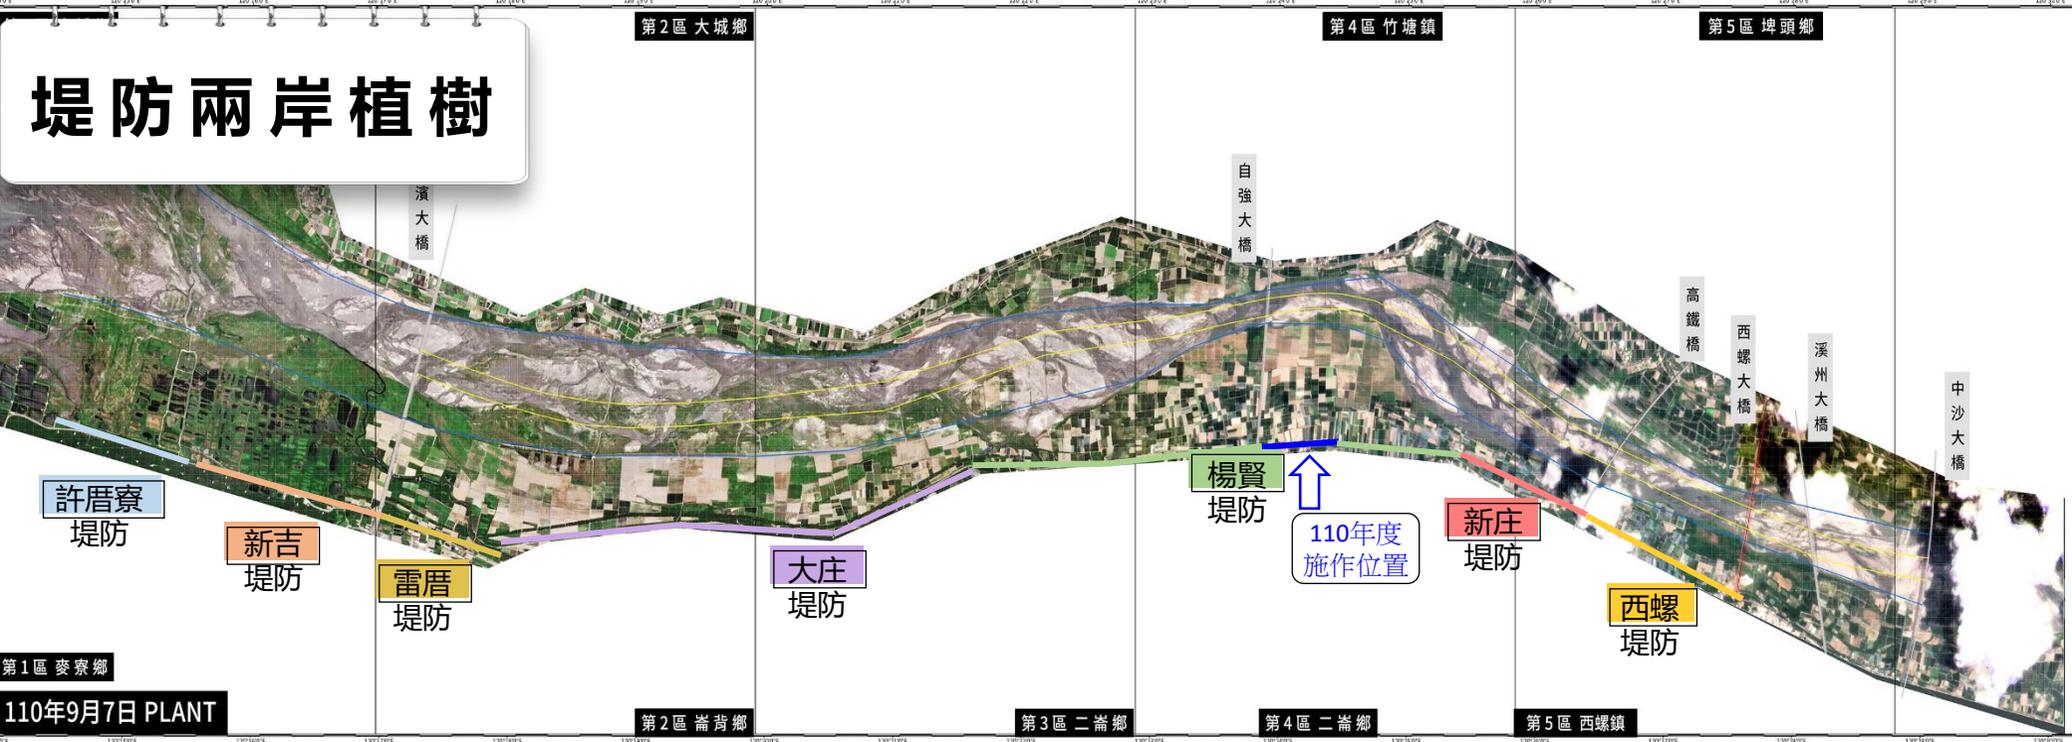

堤防兩岸植樹


達成率 **50%**

KPI	已完成
2公里	1公里

➤ 已完成數量及期程:

- 1) 110/10/21完成楊賢堤防道路植栽1公里。
- 2) 雷厝堤防堤段水防道路1公里改善工程：刻正辦理道路改善工程施工作業中，預計於111年2月完工後 (植栽部分預估111年5月完成)。

揚塵抑制措施

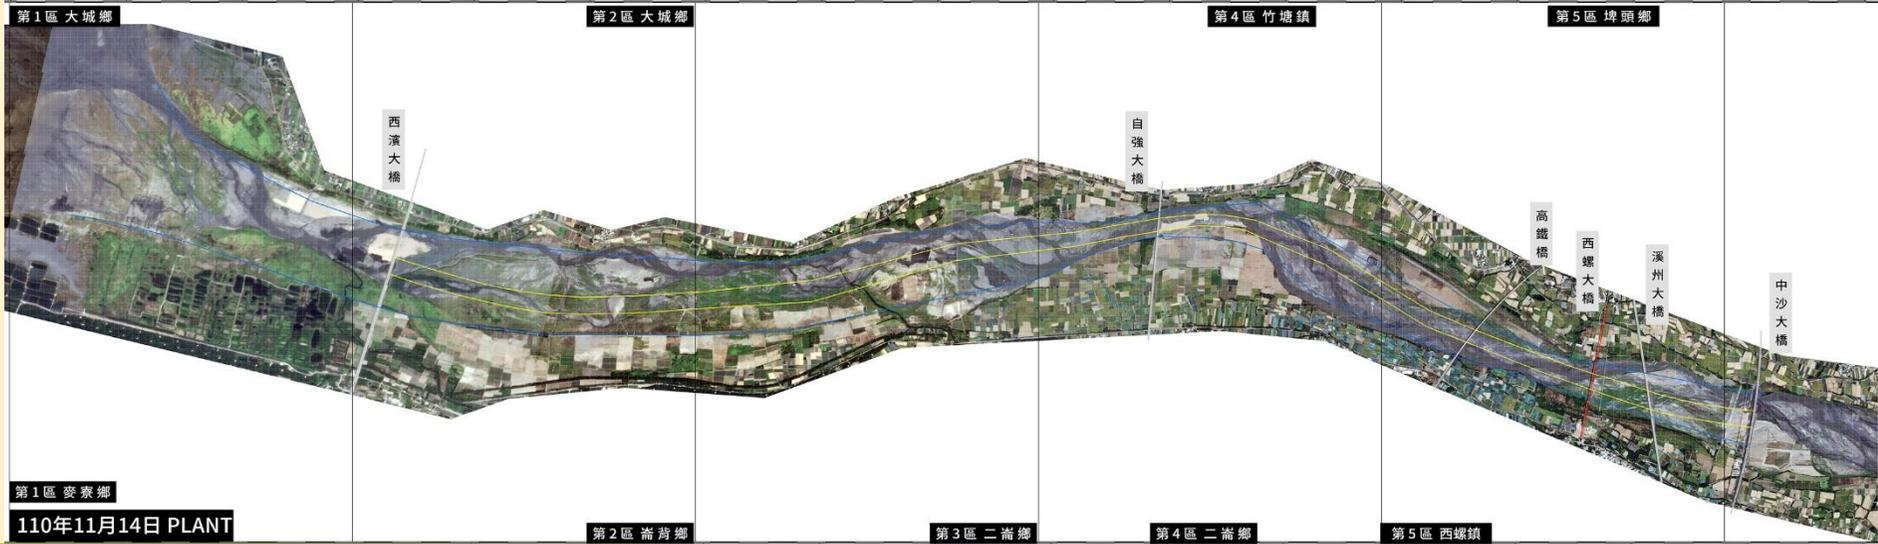

水覆蓋

- | | | | | |
|--|-------------|------------|--------------|--------------------------|
| | 1) 水覆蓋100公頃 | 1) 水覆蓋30公頃 | 1) 攔水土堤1.5公里 | 1) 水覆蓋20公頃
2) 水覆蓋18公頃 |
|--|-------------|------------|--------------|--------------------------|

河道整理

- | | | | | |
|--------------|--|--------------|---------------|--|
| 1) 河道整理0.3公里 | | 1) 河道整理0.9公里 | 1) 河道整理0.78公里 | |
|--------------|--|--------------|---------------|--|

綠覆蓋

- | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1) 防洪林帶0.6公里
2) 200公頃空灑草籽53公頃
3) 200公頃15-18水井空灑草籽18公頃
4) 綠覆蓋1.2公頃 | 1) 西濱上下游空灑草籽23公頃
2) 44號越堤路空灑草籽33公頃 | 1) 防洪林帶1.5公里
2) 空灑草籽60公頃
3) 噴灑草籽4公頃
4) 39號灘地林地植生1公里 | 1) 楊賢堤防_防汛道路植栽1公里 | 1) 中沙大橋上游空灑草籽50公頃
2) 西螺大橋下游空灑草籽32.5公頃
3) 二水鐵路橋上游北岸灘地植生林帶0.415公里 |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|

其他覆蓋

- | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------|
| 1) 稻草蓆鋪設86.5公頃
2) 簡易灑水設施2.8公頃
3) 碎石級配0.9公頃
4) 防塵網鋪設32公頃
5) 西濱下游北岸稻草蓆鋪設40公頃
6) 西濱下游北岸防塵網鋪設11公頃 | 1) 西濱下方_稻草蓆鋪設29公頃
2) 西濱下方_平鋪式防塵網4.7公頃
3) 40-44號施工便道木屑鋪設0.5公頃
4) 40-44號越堤段_平鋪式防塵網2公頃 | 1) 58號複式斷面水線12公頃
2) 39號灘地植生灑水線1.6公頃
3) 39號低灘地鋪設稻草蓆5公頃
4) 74號越堤路高灘平鋪式防網10公頃
5) 電塔下游南岸裸露地(B區)平鋪式防塵網10.8公頃 | 1) 自強橋上游_稻草蓆鋪設14.5公頃 | 1) 油管橋下游_稻草蓆10.5公頃
2) 溪州大橋上游北岸_稻草蓆24公頃 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------|
