


揚塵防治 週報表

110/12/06~110/12/12



西濱橋下游北岸(取土區前灘地)_平鋪式防塵網

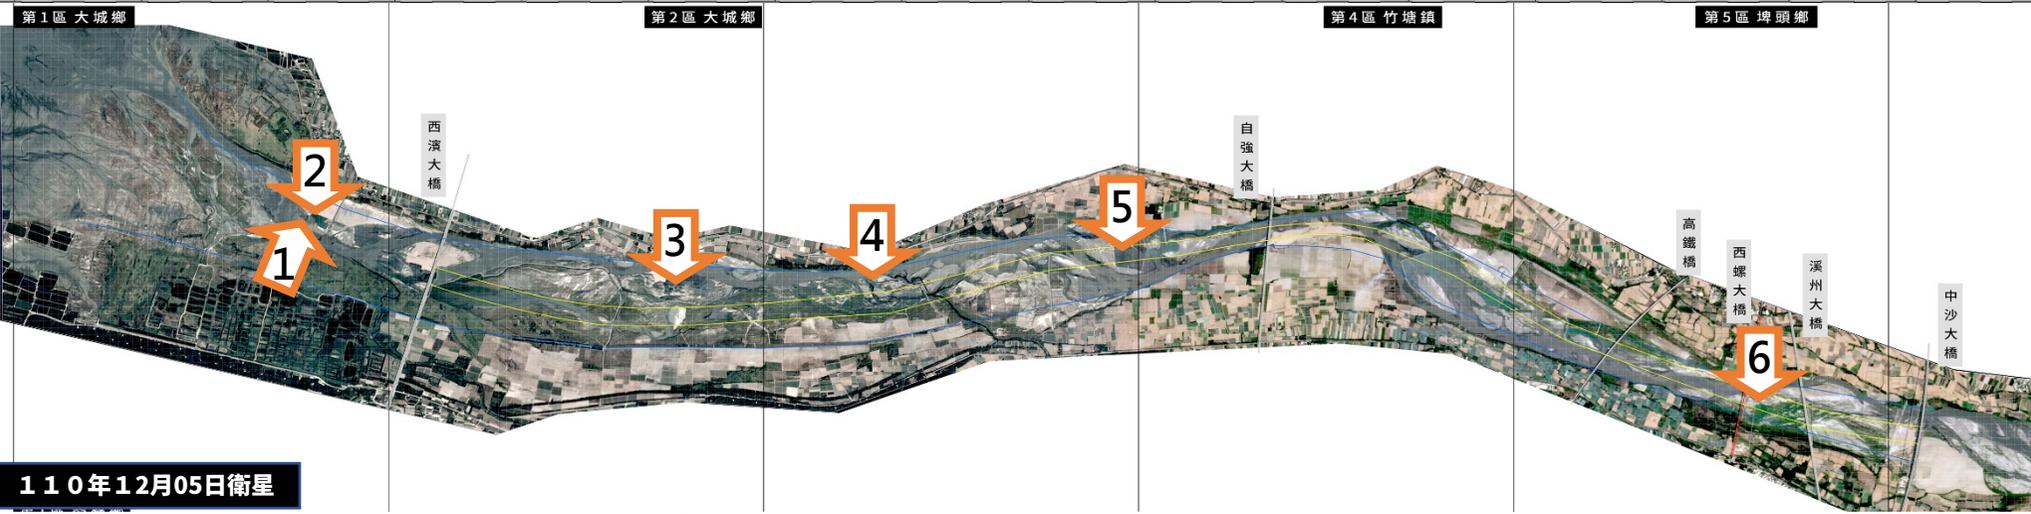

西濱大橋下游北岸_河道整理




40-44號越堤路_平鋪式防塵網



依現地狀況調整施作數量



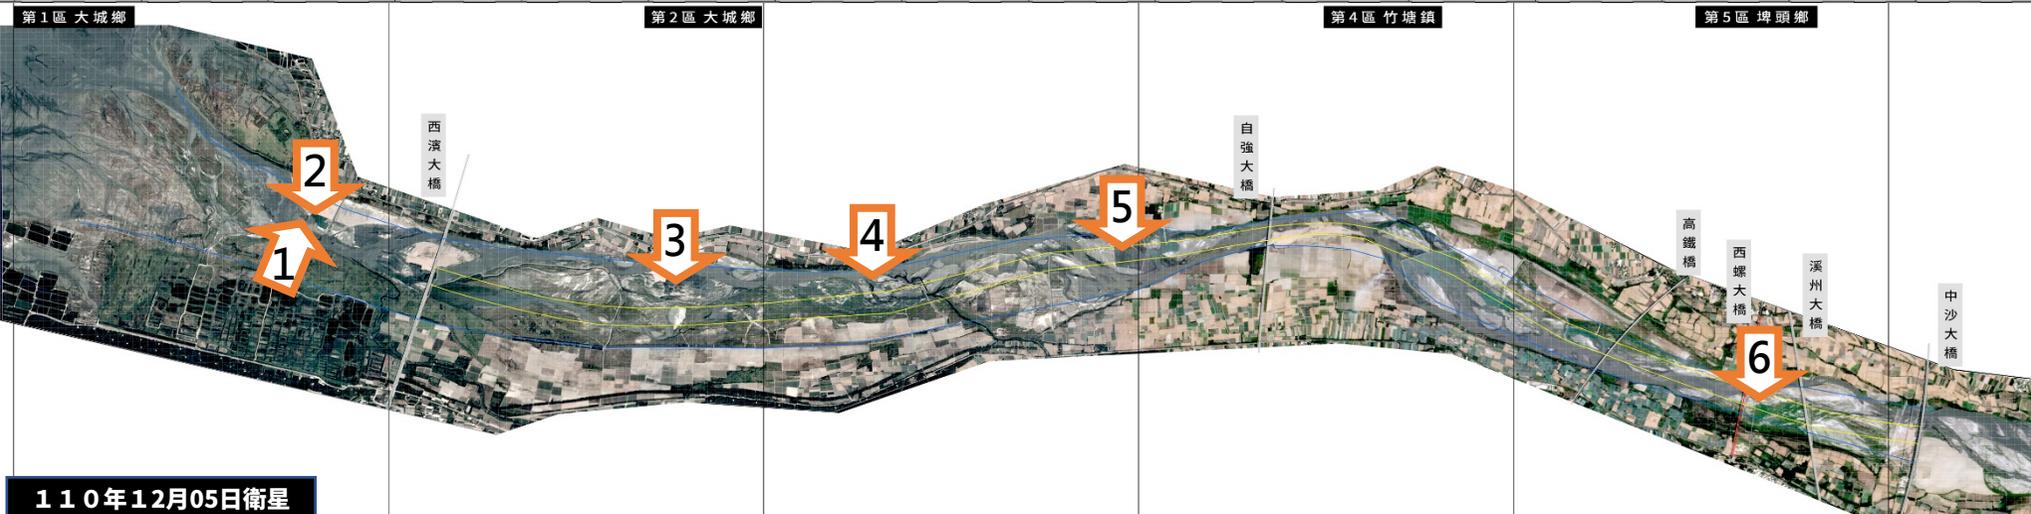

110年12月05日衛星

64號越堤段至大義崙排水口_河道整理

跨河鐵塔下(51號越堤)_平鋪式防塵網

西螺大橋上游_蓄水池塘





各區空拍現況



第一區 西濱下游北岸培厚



第二區 大義崙下游40-44號越堤



第三區 大義崙下游南岸培厚



第四區 高鐵橋下游



第五區 溪州大橋上游



110年 揚塵KPI進度管控

➤ 抑制面積

➤ 進度

水覆蓋



KPI / 400公頃
已完成 / 228公頃
達成率 / 57.0%

河道整理



KPI / 2.5公里
已完成 / 3.26公里
達成率 / 130.4%

綠覆蓋



KPI / 50公頃
已完成 / 274.7公頃
達成率 / 549.4%

防洪植栽



KPI / 4公里
已完成 / 4.515公里
達成率 / 112.9%

其他覆蓋



KPI / 450公頃
已完成 / 342.7公頃
達成率 / 76.2%

營造複式斷面規圖

- 107 - 109 完成複式斷面
- 110 執行中複式斷面
- 111 - 112 規劃複式斷面



110
1.5Km 已完成

110
0.5km

➤ 未完成數量及期程：

- 1) 11/1 進場施作便道，受11/12 大義崙排水放流影響，導致原取土便道沖毀，目前執行便道修復中，已於11/23 開始取土作業，目前已完成0.35公里並於12月底完成0.5公里複式斷面土方培厚。


複式斷面

達成率 **75%**

KPI	已完成
2公里	1.5公里



堤防兩岸植樹

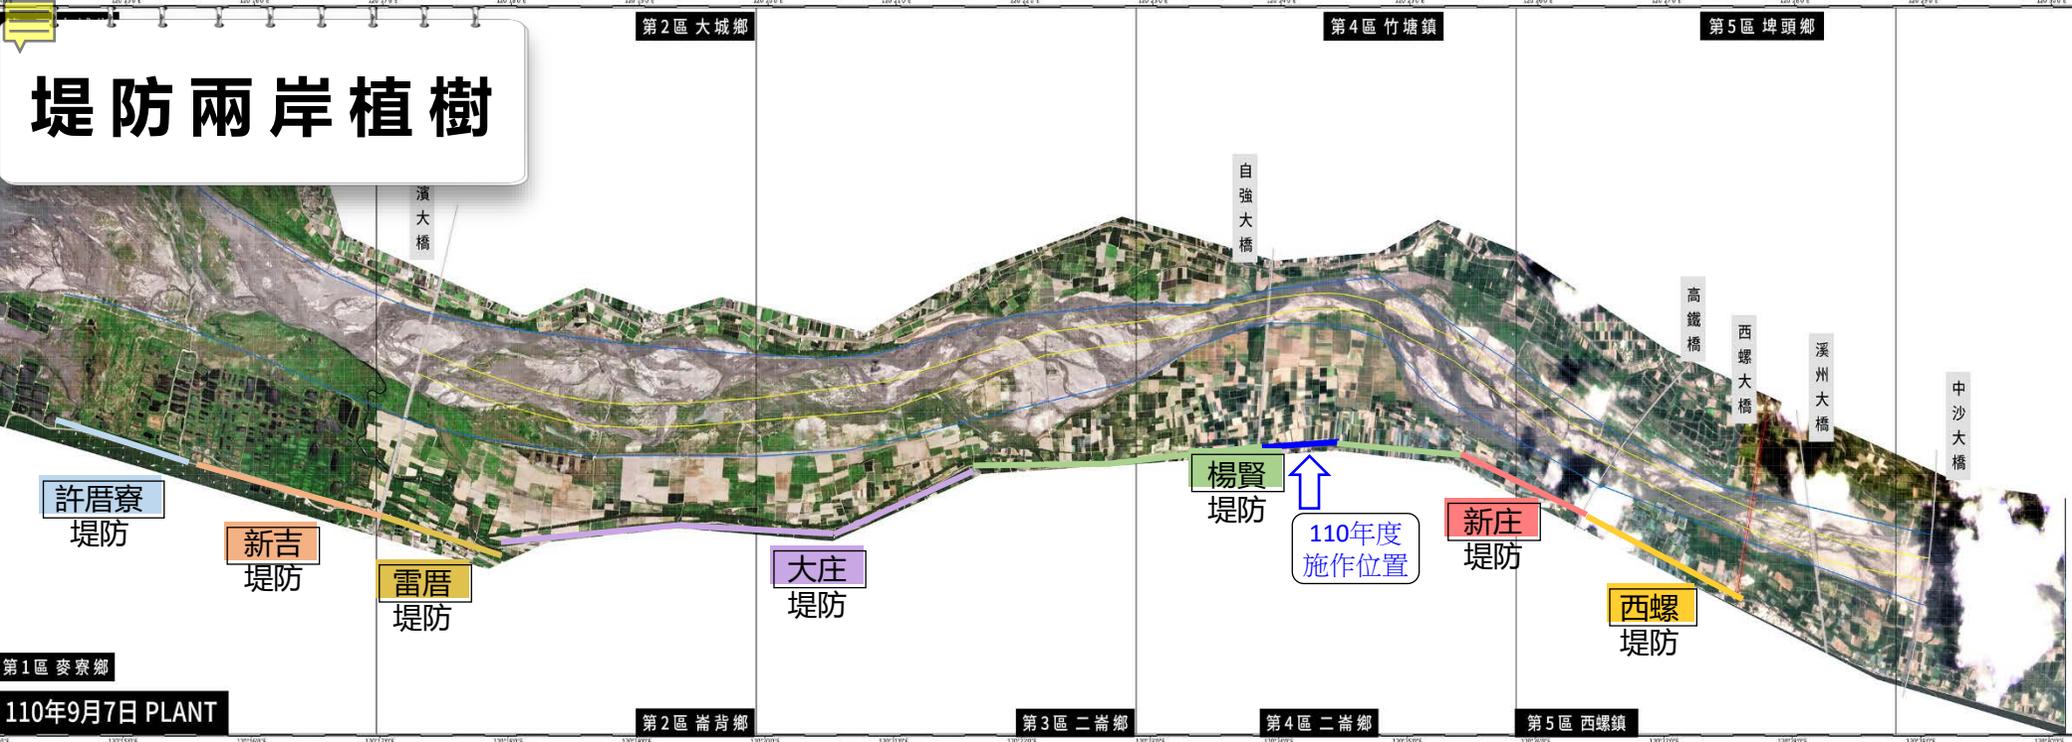

第1區 麥寮鄉
110年9月7日 PLANT



堤防兩岸植樹


達成率 **50%**

KPI	已完成
2公里	1公里

➤ 已完成數量及期程:

- 1) 110/10/21完成楊賢堤防道路植栽1公里。
- 2) 雷厝堤防堤段水防道路1公里改善工程：刻正辦理道路改善工程施工作業中，預計於111年2月完工後 (植栽部分預估111年5月完成)。

揚塵抑制措施

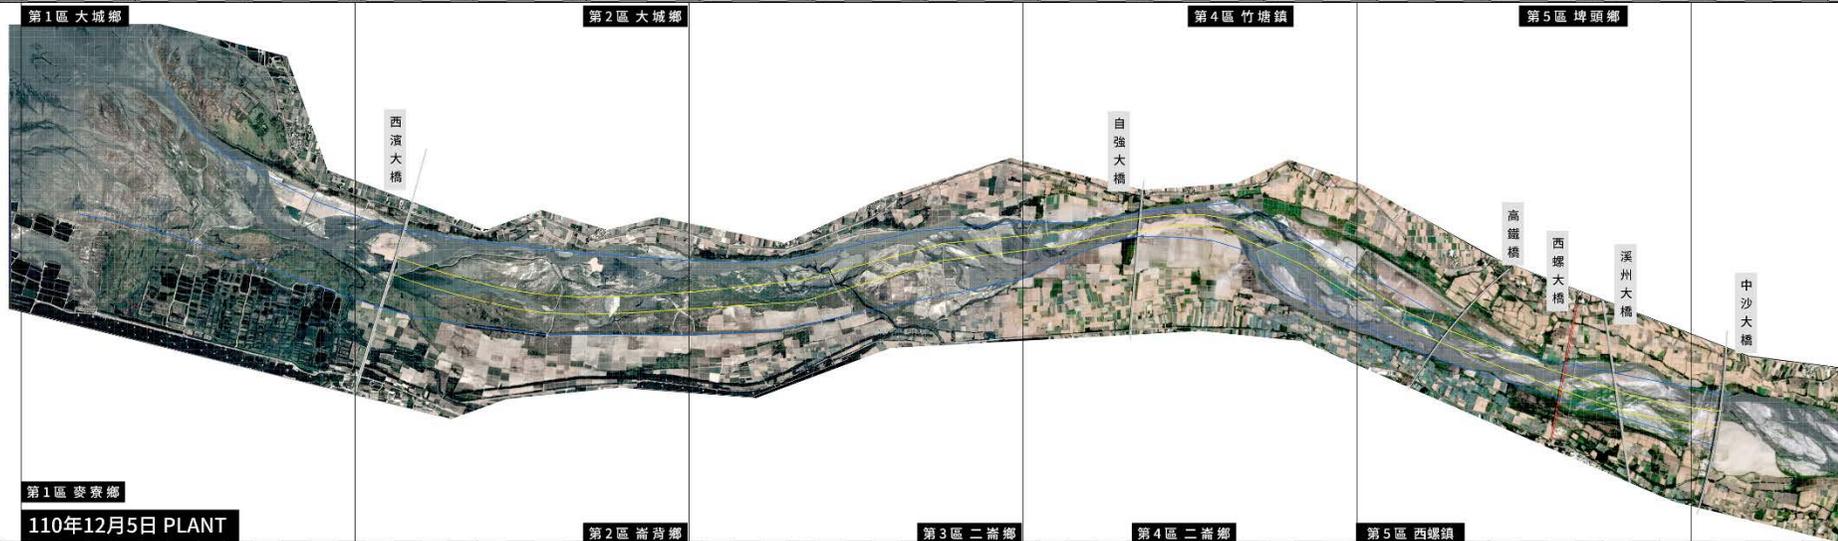

水覆蓋

- | | | | |
|-------------|------------|------------|--|
| 1) 水覆蓋100公頃 | 1) 水覆蓋30公頃 | 1) 水覆蓋60公頃 | 1) 水覆蓋20公頃
2) 水覆蓋18公頃
3) 西螺攔水土堤1.3公里 |
|-------------|------------|------------|--|

河道整理

- | | | | |
|---------------|-------------------------------|---------------|--|
| 1) 河道整理0.99公里 | 1) 河道整理0.9公里
2) 河道整理0.59公里 | 1) 河道整理0.78公里 | |
|---------------|-------------------------------|---------------|--|

綠覆蓋

- | | | | |
|--|---------------------------------------|--|--|
| 1) 防洪林帶0.6公里
2) 200公頃空灑草籽53公頃
3) 200公頃15-18水井空灑草籽18公頃
4) 綠覆蓋1.2公頃 | 1) 西濱上下游空灑草籽23公頃
2) 44號越堤路空灑草籽33公頃 | 1) 防洪林帶1.5公里
2) 空灑草籽60公頃
3) 噴灑草籽4公頃
4) 39號灘地林地植生1公里 | 1) 楊賢堤防_防汛道路植栽1公里
2) 中沙大橋上游空灑草籽50公頃
3) 西螺大橋下游空灑草籽32.5公頃
3) 二水鐵路橋上游北岸灘地植生林帶0.415公里 |
|--|---------------------------------------|--|--|

其他覆蓋

- | | | | |
|--|---|---|--|
| 1) 稻草蓆鋪設86.5公頃
2) 簡易灑水設施2.6公頃
3) 碎石級配0.9公頃
4) 防塵網鋪設22公頃
5) 西濱下游北岸稻草蓆鋪設40公頃
6) 西濱下游北岸防塵網鋪設13公頃
7) 200公頃4-8號井站堤防塵網1.5公頃
8) 西濱下游北岸取土區前灘地防塵網9公頃 | 1) 西濱下方_稻草蓆鋪設29公頃
2) 西濱下方_平鋪式防塵網4.7公頃
3) 40-44號施工便道木屑鋪設0.5公頃
4) 40-44號越堤段_平鋪式防塵網23.7公頃 | 1) 58號複式斷面水線12公頃
2) 39號灘地植生灑水線1.6公頃
3) 39號低灘地鋪設稻草蓆5公頃
4) 74號越堤路高灘平鋪式防網10公頃
5) 電塔下游南岸裸露地(B區)平鋪式防塵網10.8公頃
6) 跨河鐵塔下(51號越堤)_平鋪式防塵網17公頃 | 1) 自強橋上游_稻草蓆鋪設17公頃
2) 油管橋下游_稻草蓆10.5公頃
2) 溪州大橋上游北岸_稻草蓆24公頃
3) 二水鐵路橋上游北岸灘地簡易灑水設施1.4公頃 |
|--|---|---|--|
