

揚塵防治 週報表

111/01/10~111/01/16

1/11日揚塵緊急應變

➤ 第一區(西濱大橋至出海口)

- 1、200公頃大沙洲既有水線噴灑
- 2、200公頃大沙洲高灘裸露地水線加密2道水線噴灑
- 3、200公頃大沙洲低灘裸露地水線加密5道水線噴灑
- 4、200公頃大沙洲堤前便道2台灑水車灑水
- 5、許厝寮堤防8號越堤段便道1台灑水車灑水
- 6、下海墘堤防7號越堤段堤前便道2台灑水車灑水
- 7、下海墘堤防7號越堤段堤前高灘裸露地1台高揚程泵浦噴水



➤ 第二區(崙背草湖地區)


- 1、大庄堤防第44號至58號越堤段培厚植栽區水線灑水
- 2、大庄堤防第40號至58號越堤段堤前便道1台灑水車灑水
- 3、大庄堤防第64號至70號越堤段培厚植栽區水線灑水
- 4、大義崙下游低灘裸露地1台高揚程泵浦噴水




➤ 第三區(二崙清潔隊前區域)

- 1、楊賢堤防第74號越堤段堤前便道1台灑水車灑水
- 2、九塊厝堤防第51號越堤段堤前便道1台灑水車灑水
- 3、九塊厝堤防第51號越堤段高灘裸露地1台高揚程泵浦噴水
- 4、九塊厝堤防第39號越堤段培厚植栽區水線灑水



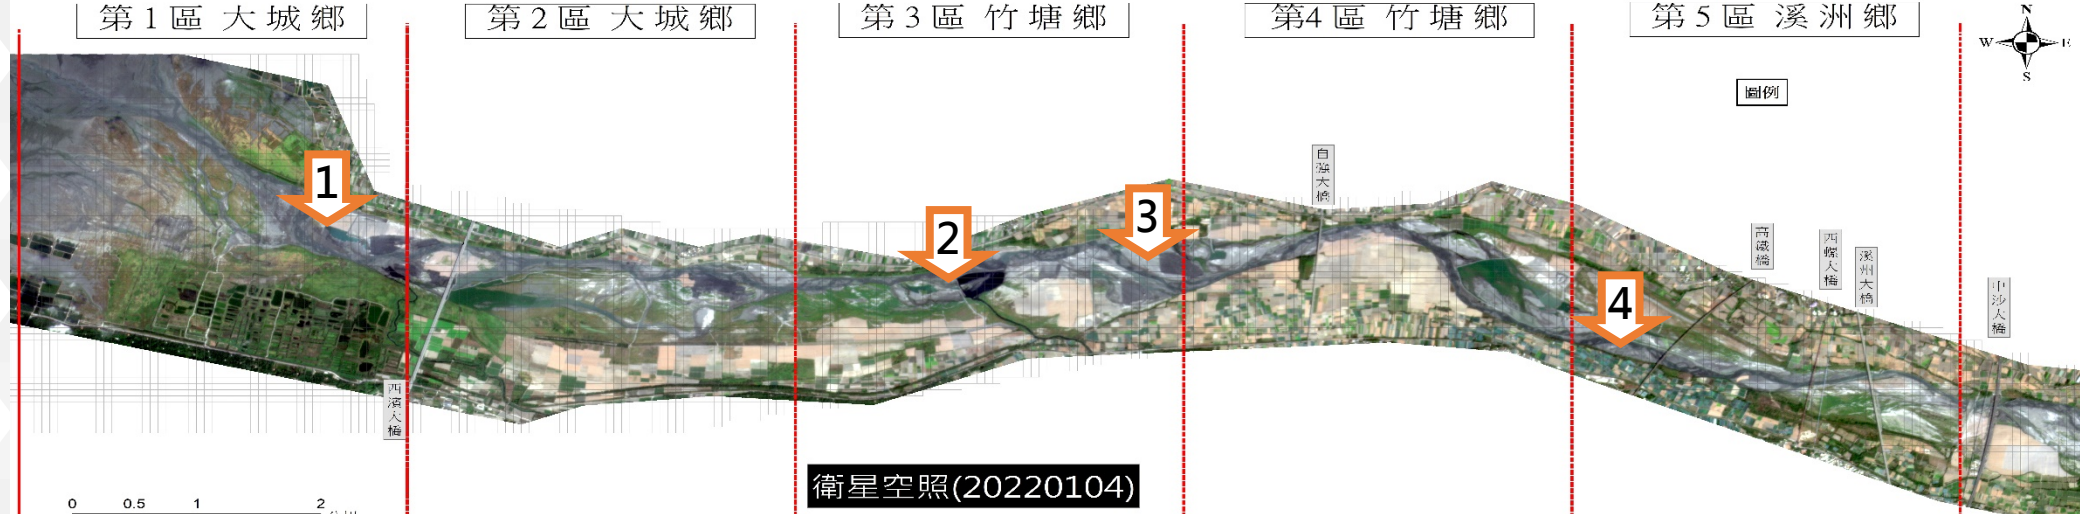





西濱大橋下游北岸_河道整理

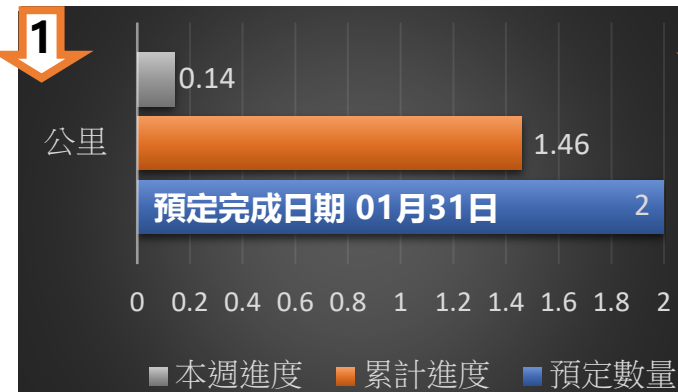


大義崙排水口上游_攔水土堤



跨河鐵塔B區_稻草蓆鋪設

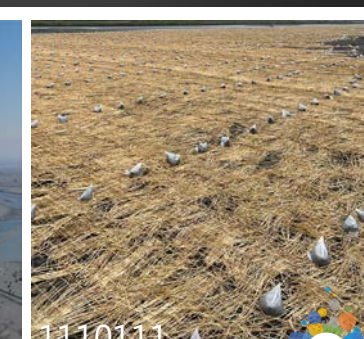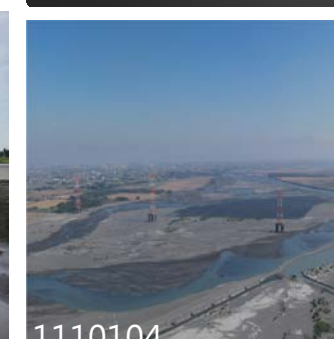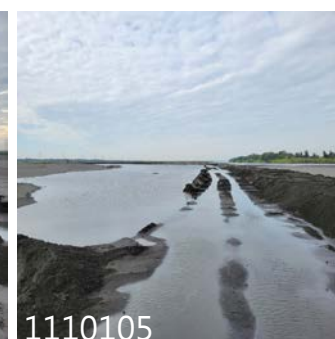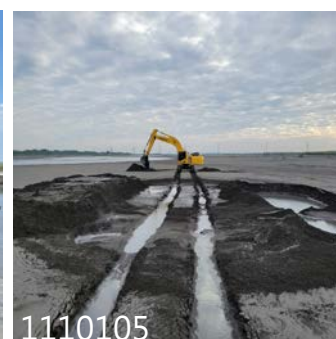

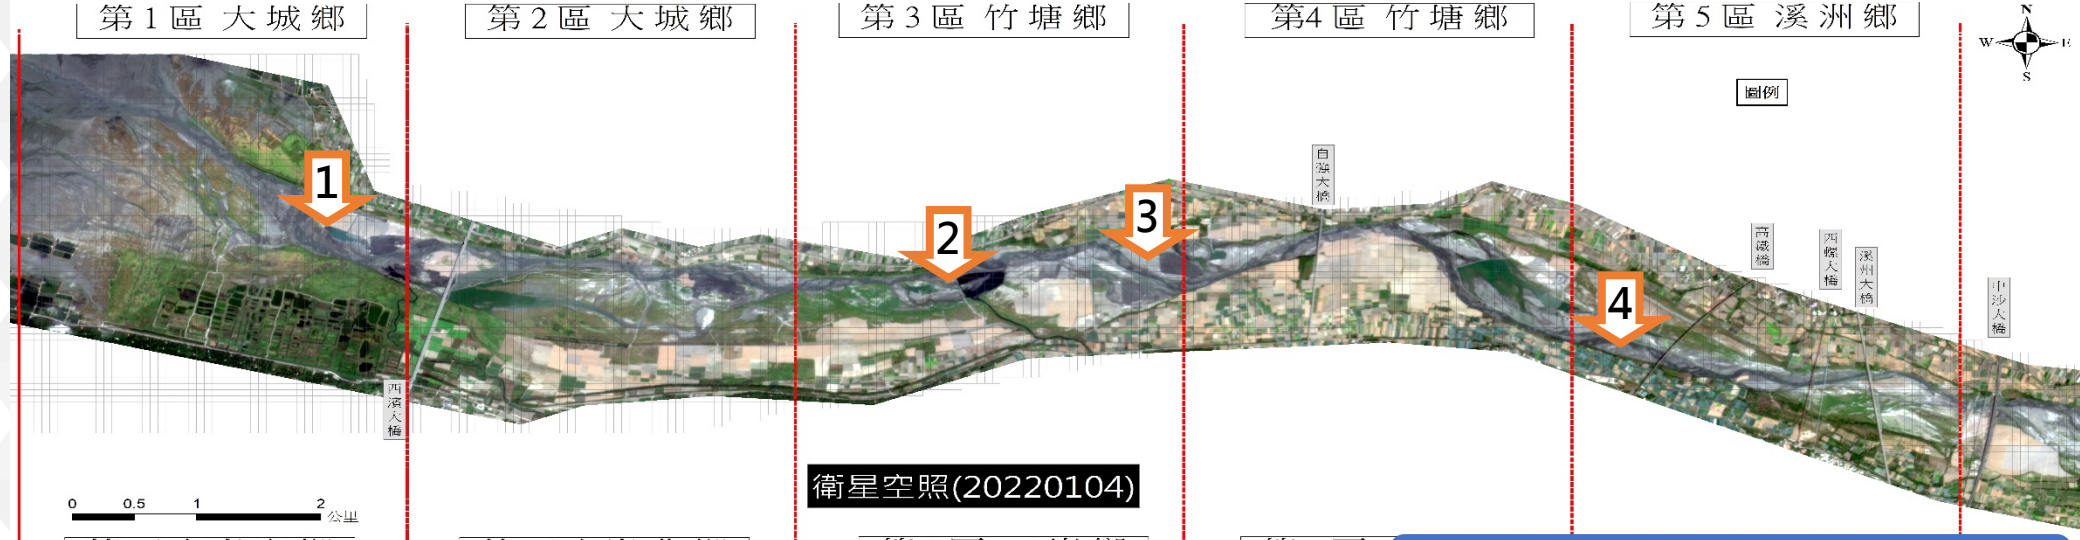

第1區 麥寮鄉

第2區 崙背鄉

第3區 二崙鄉

第4區

西螺大橋下游南岸_稻草蓆鋪設




依現況調整施作數量





各區空拍現況



第一區

西濱大橋下游



第二區

西濱大橋上游



第三區

跨河鐵塔下游



第四區

高鐵橋下游



第五區

西螺大橋下游



110年 揚塵KPI進度管控

➤ 抑制面積

➤ 進度

水覆蓋



KPI / 400公頃
已完成 / 405公頃
達成率/ 101.3%

河道整理



KPI / 2.5公里
已完成 / 3.77公里
達成率/ 150.8%

綠覆蓋



KPI / 50公頃
已完成 / 274.7公頃
達成率/ 549.4%

防洪植栽



KPI / 4公里
已完成 / 5.145公里
達成率/ 128.6%

其他覆蓋




KPI / 450公頃
已完成 / 364.2公頃
達成率/ 80.9%

營造複式斷面規劃圖

複式斷面

年度	107-109	110	111	112	合計
KPI(公里)	8	2	6	4	20
實際完成	8	2.13	-	-	-

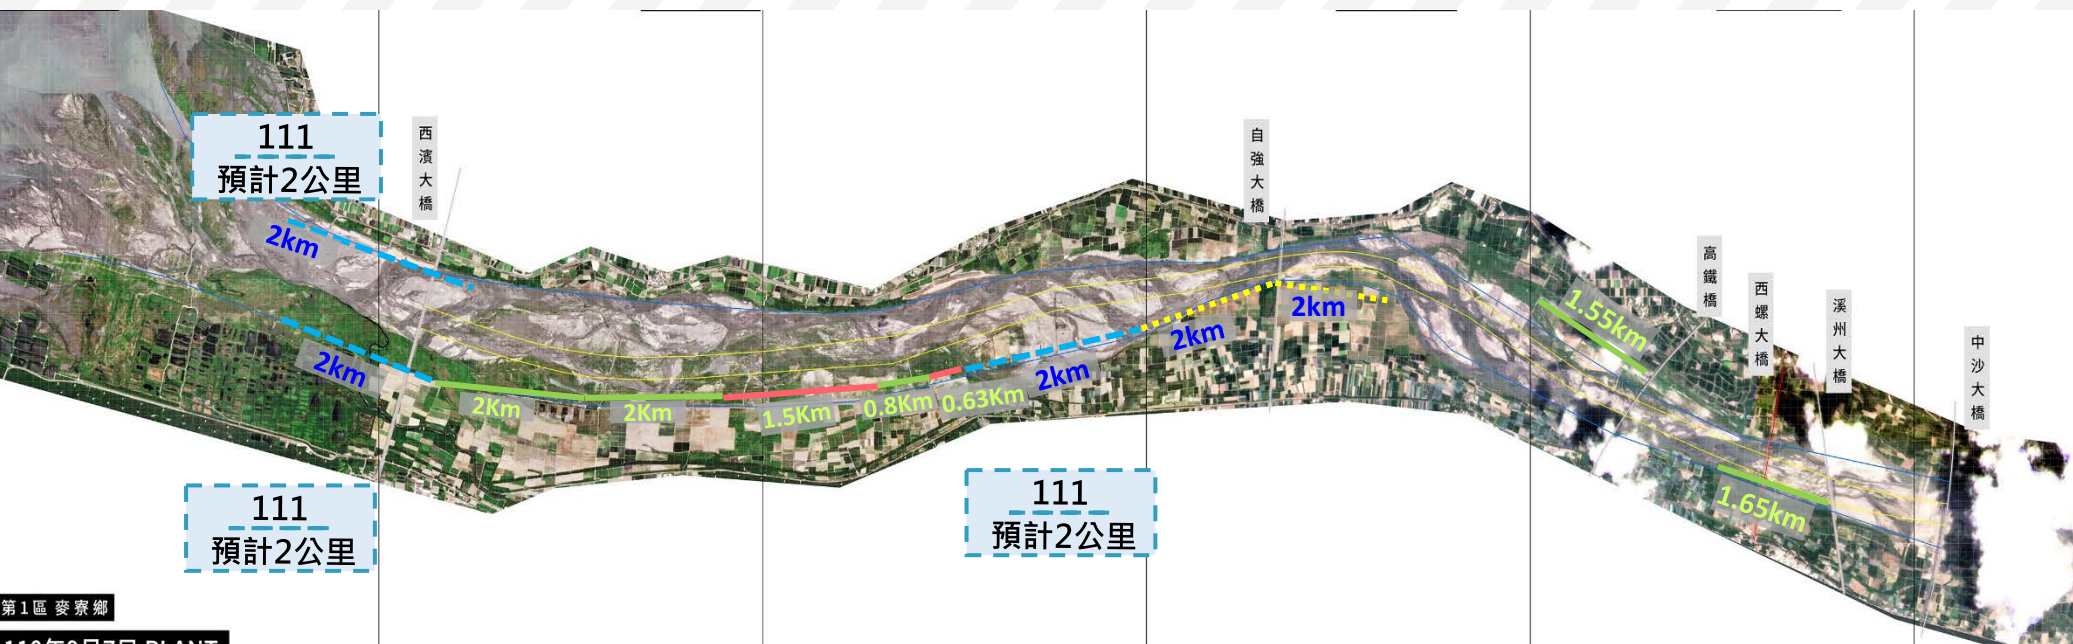


• 111年營造複式斷面KPI進度管控

KPI / 6公里
已完成 / -
達成率 / -

➤ 執行進度說明：

- 1) 111年度複式斷面規劃為6公里，目前先以西濱大橋下游北岸進行土方培厚作業，預計1/31前完成培厚2公里。

水防道路植栽規劃圖

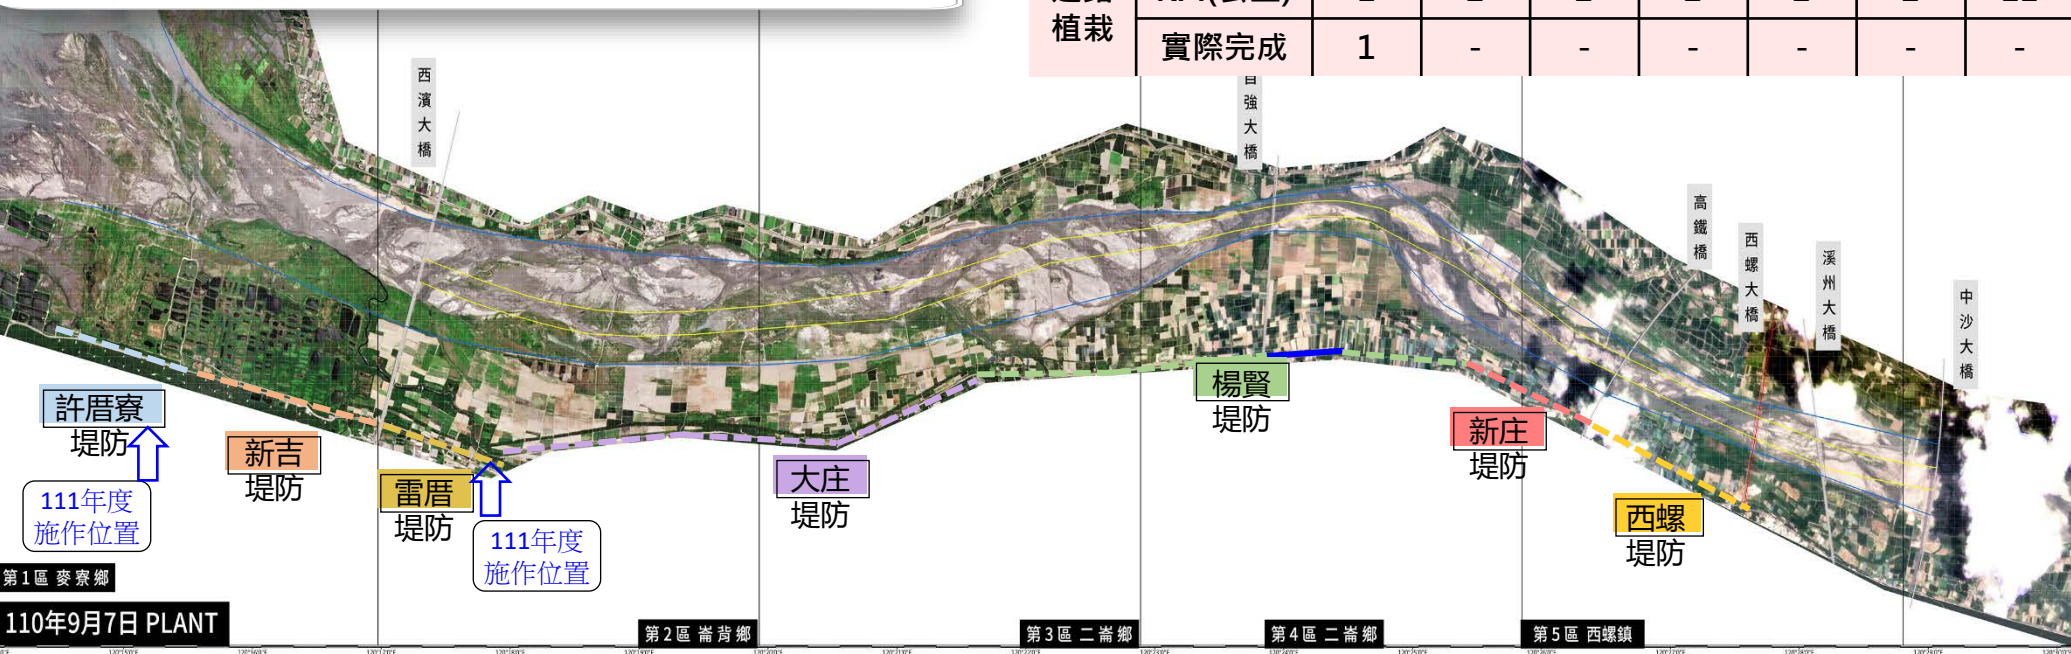

年度	110	111	112	113	114	115	合計
KPI(公里)	1	2	2	2	2	2	11
實際完成	1	-	-	-	-	-	-

• 111年水防道路植栽KPI進度管控

KPI / 2公里
 已完成 / -
 達成率 / -

➤ 執行進度說明：

- 1) 雷厝堤防堤段水防道路1公里改善工程：
 刻正辦理道路改善工程施工作業中，預計於111年2月完工後 (植栽部分預估111年5月完成)。



