


# 揚塵防治 週報表

110/12/20~110/12/26



### 西濱大橋下游北岸\_河道整理

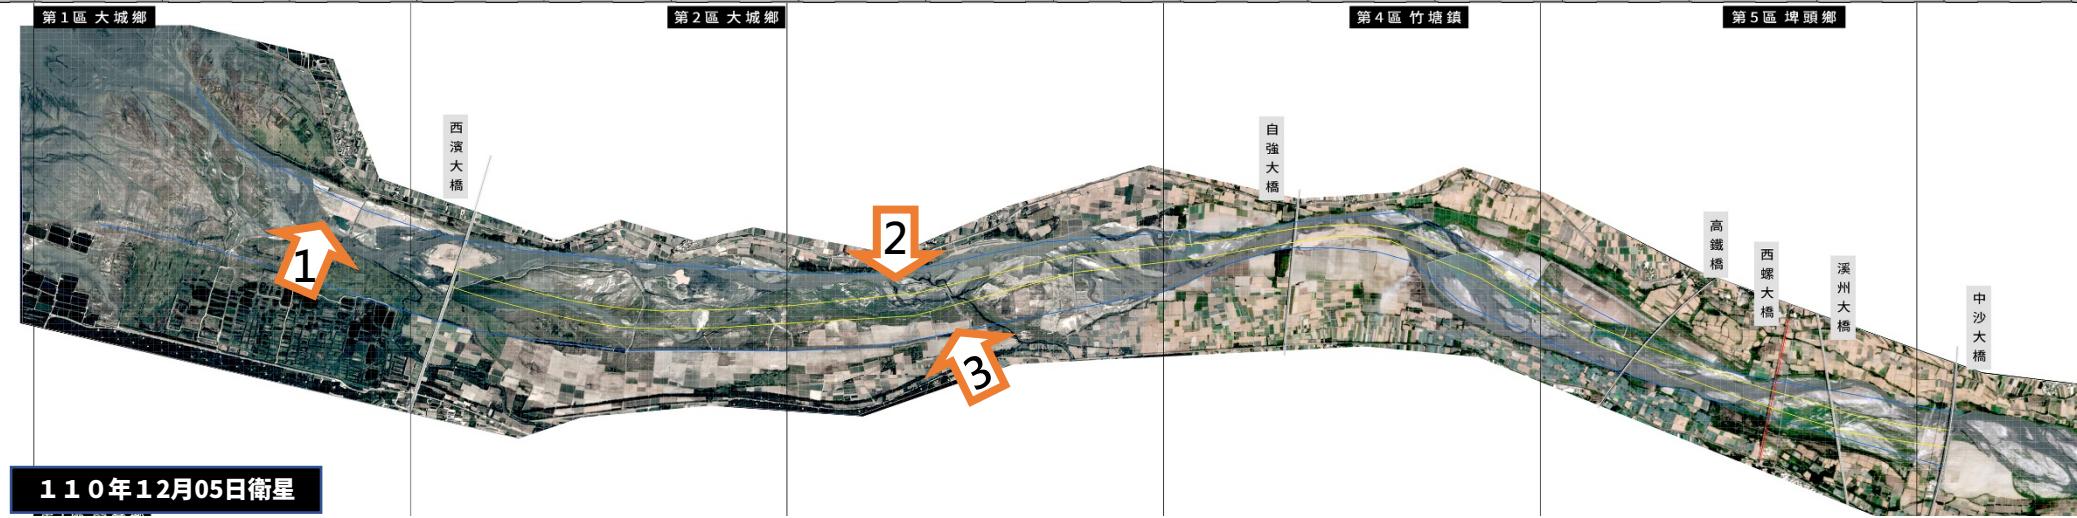

### 64號越堤段至大義崙排水口\_河道整理



### 64號越堤段培厚\_簡易灑水設施





# 各區空拍現況



第三區  
大義崙排水口下游



第四區  
高鐵橋下游



第五區  
西螺大橋上游



# 110年 揚塵KPI進度管控

- 抑制面積
- 進度

## 水覆蓋



## 河道整理



KPI / 400公頃  
已完成 / 365公頃  
達成率 / 91%

KPI / 2.5公里  
已完成 / 3.41公里  
達成率 / 136.4%

## 綠覆蓋



KPI / 50公頃  
已完成 / 274.7公頃  
達成率 / 549.4%

## 防洪植栽



KPI / 4公里  
已完成 / 4.515公里  
達成率 / 112.9%

## 其他覆蓋



KPI / 450公頃  
已完成 / 347.5公頃  
達成率 / 77.2%

# 營造複式斷面規圖

107-109 完成複式斷面

110 執行中 複式斷面

111-112 規劃複式斷面



第1區 麥寮鄉

110年9月11日 PLANT



110/09/11

## 複式斷面


達成率 **106.5%**

KPI  
2公里

已完成  
2.13公里

➤ 未完成數量及期程：

- 目前已完成0.63公里複式斷面土方培厚及簡易灑水設施。

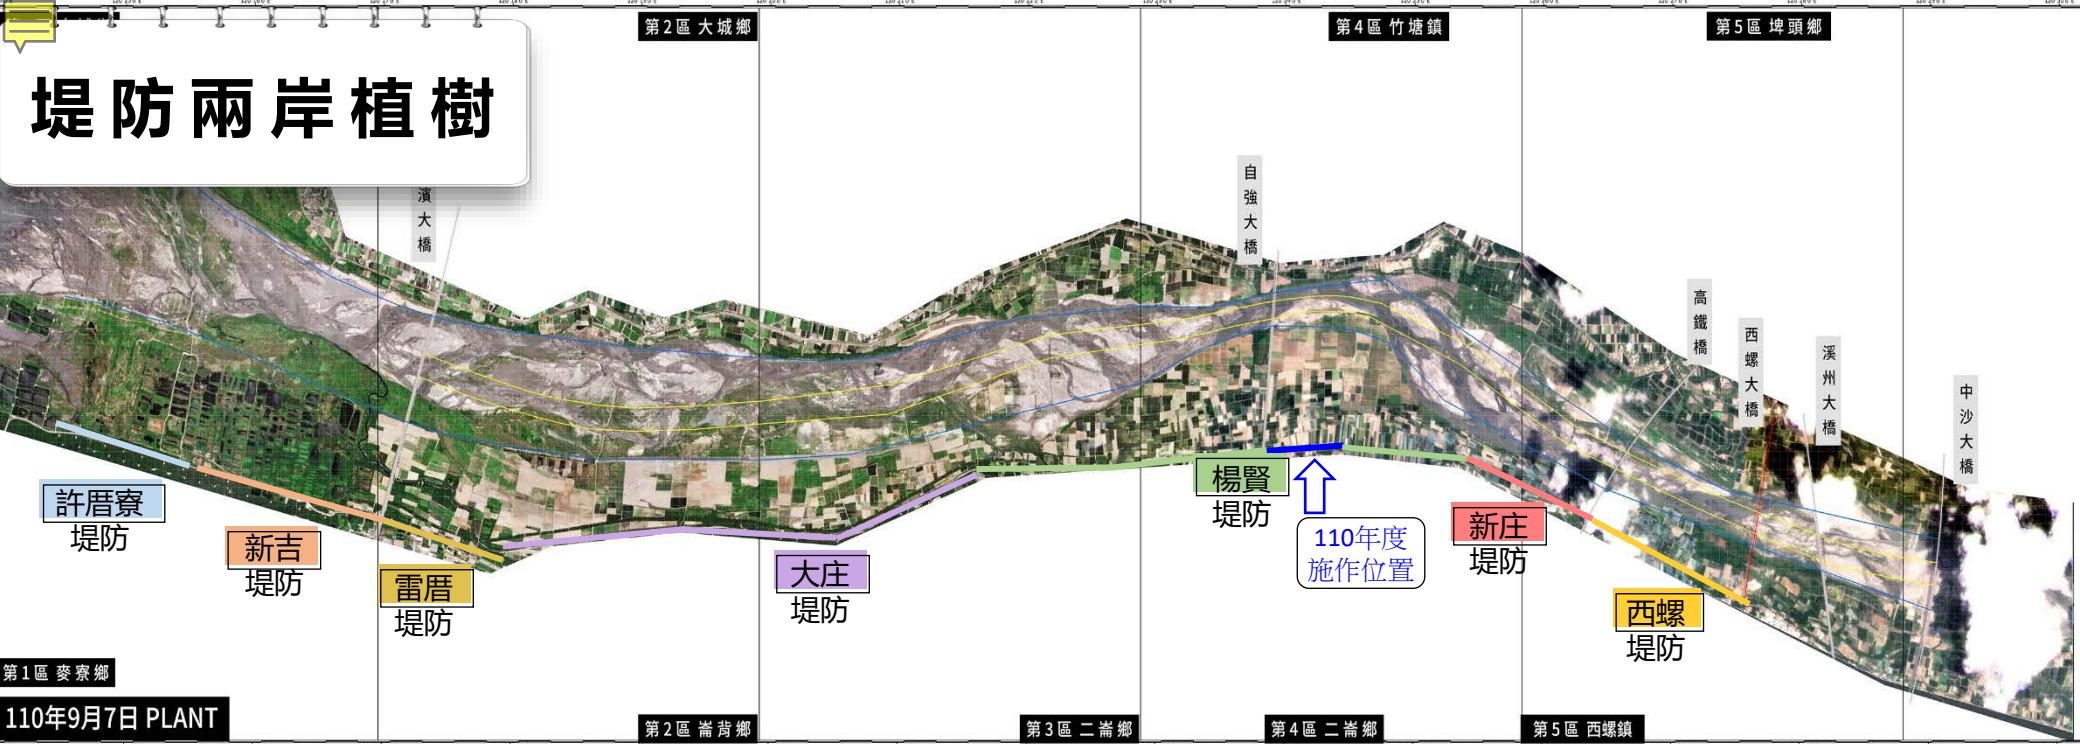

## 堤防兩岸植樹


達成率 **50%**

<b>KPI</b>	<b>已完成</b>
2公里	1公里

## 已完成數量及期程:

- 1) 110/10/21完成楊賢堤防道路植栽1公里。
- 2) 雷厝堤防堤段水防道路1公里改善工程：刻正辦理道路改善工程施工作業中，預計於111年2月完工後（植栽部分預估111年5月完成）。

# 揚塵抑制措施

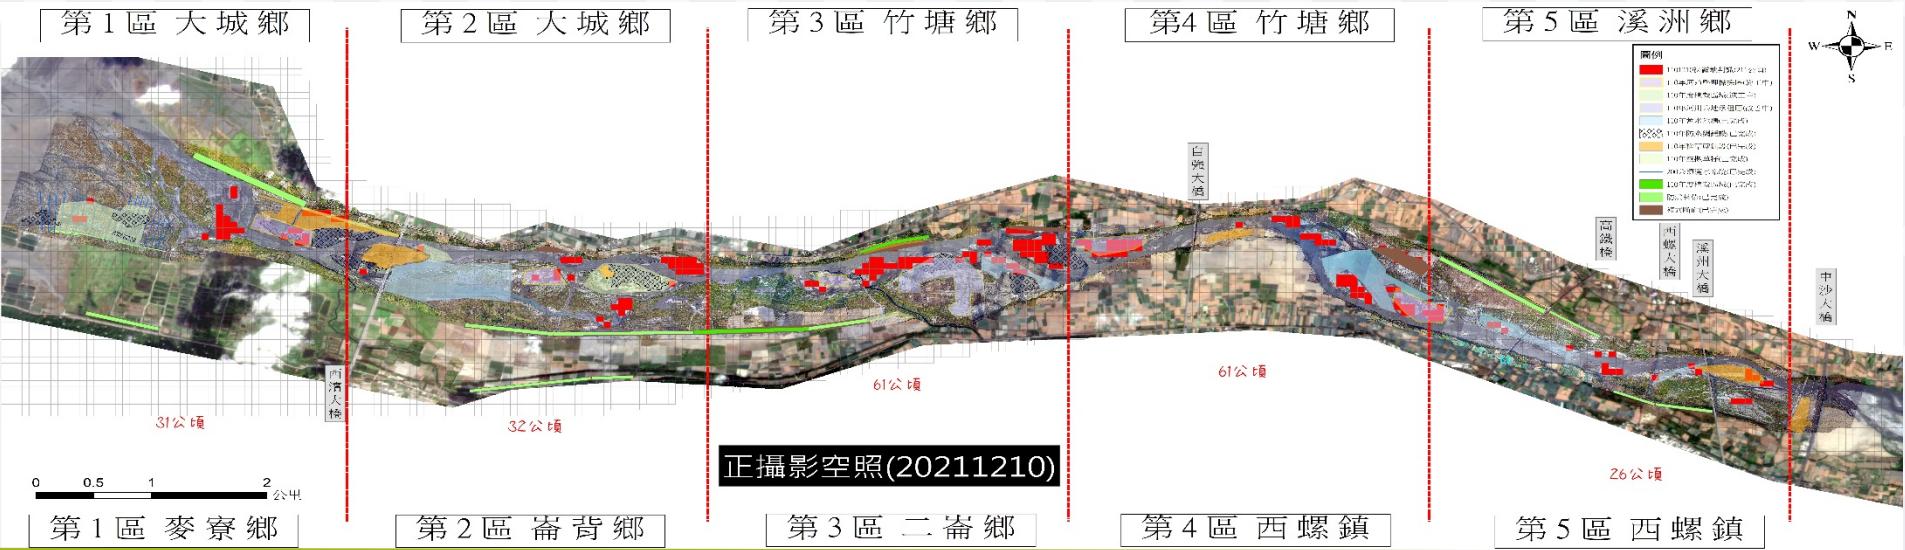

## 水覆蓋

1) 水覆蓋150公頃

1) 水覆蓋30公頃

1) 水覆蓋100公頃

1) 中沙水覆蓋20公頃  
2) 高鐵水覆蓋50公頃  
3) 西螺水覆蓋15公頃

## 河道整理

1) 河道整理1.1公里

1) 河道整理0.9公里  
2) 河道整理0.63公里

1) 河道整理0.78公里

## 綠覆蓋

1) 防洪林帶0.6公里  
2) 200公頃空灑草籽53公頃  
3) 200公頃15-18水井空灑草籽18公頃  
4) 綠覆蓋1.2公頃

1) 西濱上下游空灑草籽23公頃  
2) 44號越堤路空灑草籽33公頃

1) 防洪林帶1.5公里  
2) 空灑草籽60公頃  
3) 噴灑草籽4公頃  
4) 39號灘地林地植生1公里

1) 楊賢堤防\_防汛道路植栽1公里

1) 中沙大橋上游空灑草籽50公頃  
2) 西螺大橋下游空灑草籽32.5公頃  
3) 二水鐵路橋上游北岸灘地植生林帶0.415公里

## 其他

1) 稻草蓆鋪設86.5公頃  
2) 簡易灑水設施2.6公頃  
3) 碎石級配0.9公頃  
4) 防塵網鋪設22公頃  
5) 西濱下游北岸稻草蓆鋪設40公頃  
6) 西濱下游北岸防塵網鋪設13公頃  
7) 200公頃4-8號井站堤防塵網1.5公頃  
8) 西濱下游北岸取土區前灘地防塵網10公頃

1) 西濱下方\_稻草蓆鋪設29公頃  
2) 西濱下方\_平鋪式防塵網4.7公頃  
3) 40-44號施工便道木屑鋪設0.5公頃  
4) 40-44號越堤段\_平鋪式防塵網23.7公頃

1) 58號複式斷面水線12公頃  
2) 39號灘地植生灑水線1.6公頃  
3) 39號低灘地鋪設稻草蓆5公頃  
4) 74號越堤路高灘平鋪式防網10公頃  
5) 電塔下游南岸裸露地(B區)平鋪式防塵網10.8公頃  
6) 跨河鐵塔下(51號越堤)\_平鋪式防塵網17公頃  
7) 64號越堤培厚\_灑水線3.8公頃

1) 自強橋上游\_稻草蓆鋪設17公頃

1) 油管橋下游\_稻草蓆10.5公頃  
2) 溪洲大橋上游北岸\_稻草蓆24公頃  
3) 二水鐵路橋上游北岸灘地簡易灑水設施1.4公頃
