

揚塵防治 週報表


111/01/17 ~ 111/01/23



西濱大橋下游北岸_河道整理



跨河鐵塔B區_稻草蓆鋪設

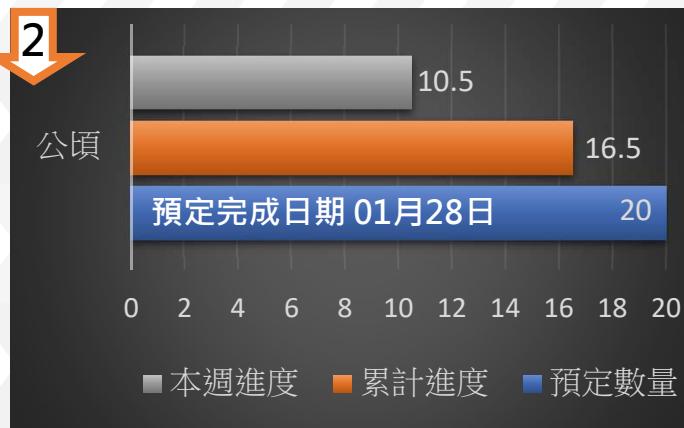



各區空拍現況



第三區
跨河鐵塔下游



第四區
自強大橋上游



第五區
溪州大橋上游



110年 揚塵KPI進度管控

- 抑制面積
- 進度

水覆蓋



河道整理



KPI / 400公頃
已完成 / 405公頃
達成率 / 101.3%

KPI / 2.5公里
已完成 / 3.92公里
達成率 / 156.8%

綠覆蓋



KPI / 50公頃
已完成 / 274.7公頃
達成率 / 549.4%

防洪植栽



KPI / 4公里
已完成 / 5.145公里
達成率 / 128.6%

其他覆蓋



KPI / 450公頃
已完成 / 374.7公頃
達成率 / 83.3%

營造複式斷面規劃圖

複式 斷面	年度	107-109	110	111	112	合計
	KPI(公里)	8	2	6	4	20
	實際完成	8	2.13	-	-	-





- 111年營造複式斷面KPI進度管控

KPI / 6公里
已完成 / -
達成率 / -

- 執行進度說

明 1) 111年度複式斷面規劃為6公里，目前先以西濱大橋下游北岸進行土方培厚作業，預計1/31前完成培厚2公里。

水防道路植栽規劃圖

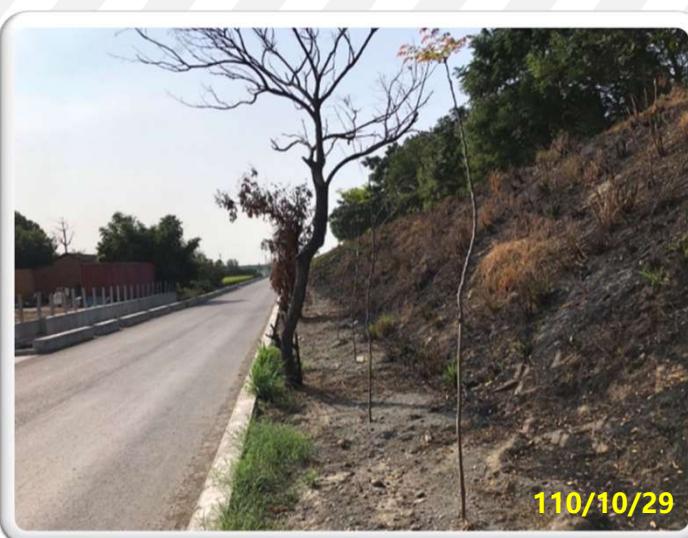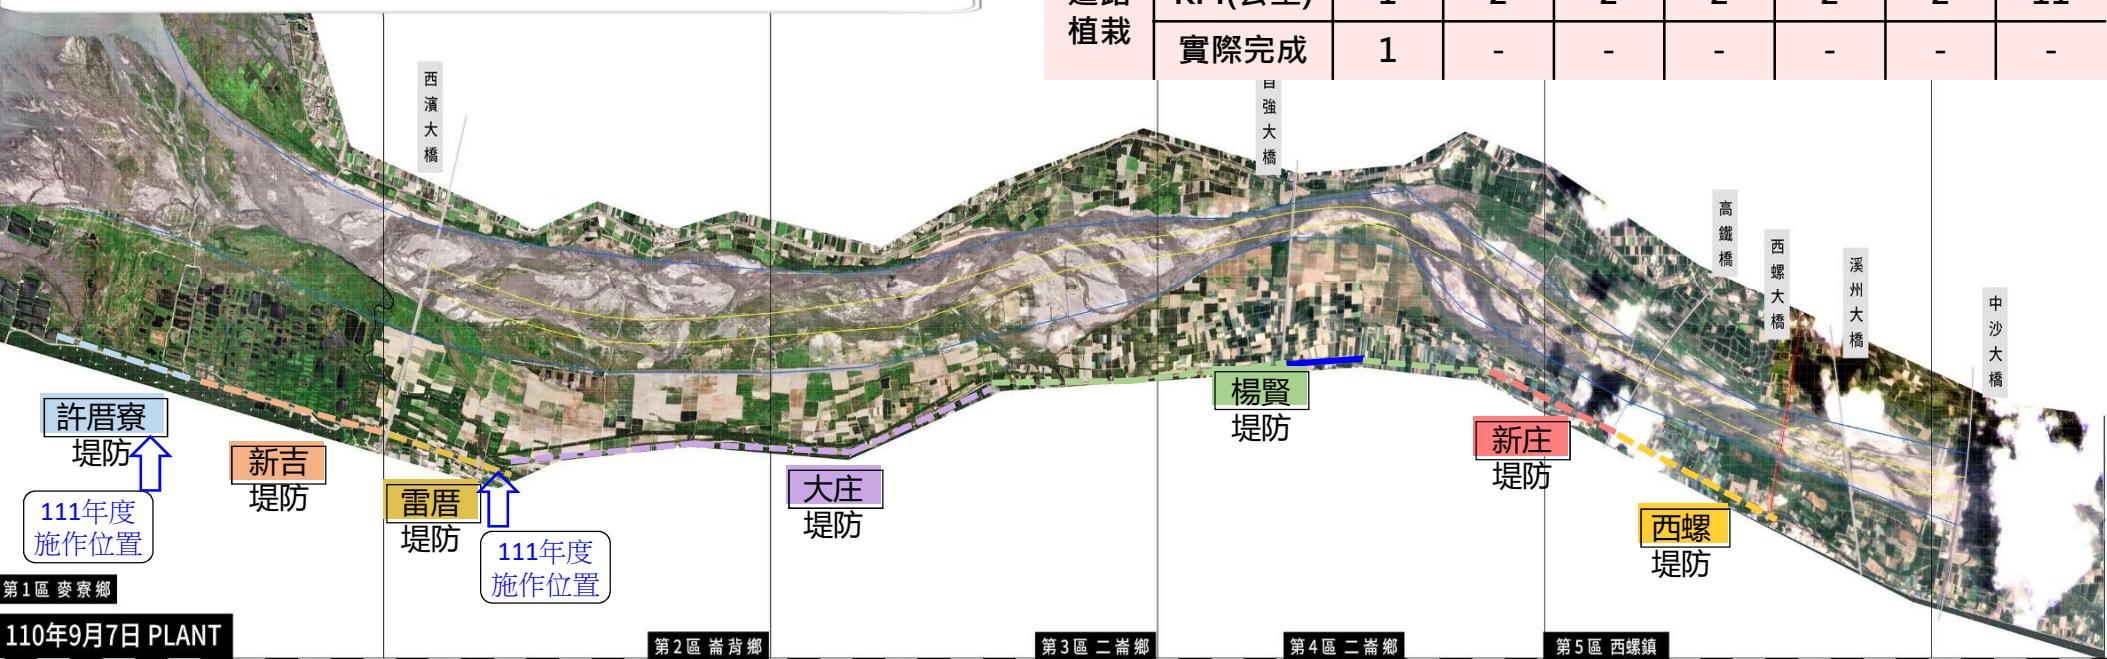

- 111年水防道路植栽KPI進度管控


KPI / 2公里 ➤ 執行進度說

已完成 / -

達成率 / -

明 : 1) 雷厝堤防堤段水防道路1公里改善工程：刻正辦理道路改善工程施工業中，預計於111年2月完工後 (植栽部分預估111年5月完成)。

揚塵抑制措施

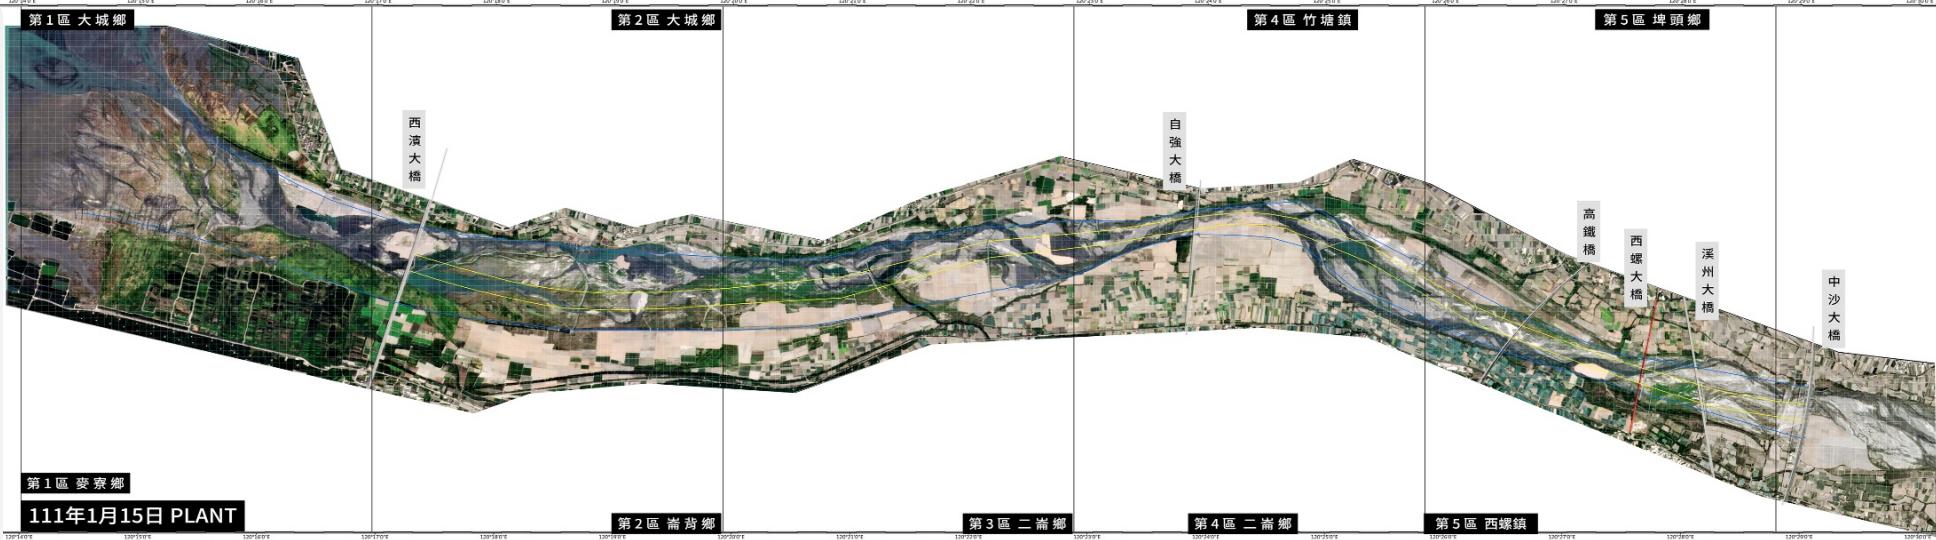

水 覆 蓋

- 1) 水覆蓋150公頃

- 1) 水覆蓋30公頃
2) 水覆蓋40公頃

- 1) 水覆蓋100公頃

- 1) 中沙水覆蓋20公頃
2) 高鐵水覆蓋50公頃
3) 西螺水覆蓋15公頃

河 道 整 理

- 1) 河道整理1.61公里

- 1) 河道整理0.9公里
2) 河道整理0.63公里

- 1) 河道整理0.78公里

綠 覆 蓋

- 1) 防洪林帶0.6公里
2) 200公頃空灑草籽53公頃
3) 200公頃15-18水井空灑草籽18公頃
4) 綠覆蓋1.2公頃

- 1) 西濱上下游空灑草籽23公頃
2) 44號越堤路空灑草籽33公頃

- 1) 防洪林帶1.5公里
2) 空灑草籽60公頃
3) 噴灑草籽4公頃
4) 39號灘地林地植生1公里
5) 防洪林帶0.63公里

- 1) 楊賢堤防_防汎道路植栽1公里
1) 中沙大橋上游空灑草籽50公頃
2) 西螺大橋下游空灑草籽32.5公頃
3) 二水鐵路橋上游北岸灘地植生林帶0.415公里

其 他 覆 蓋

- 1) 稻草蓆鋪設86.5公頃
2) 簡易灑水設施2.6公頃
3) 碎石級配0.9公頃
4) 防塵網鋪設22公頃
5) 西濱下游北岸稻草蓆鋪設40公頃
6) 西濱下游北岸防塵網鋪設13公頃
7) 200公頃4-8號井站堤防塵網1.5公頃
8) 西濱下游北岸取土區前灘地防塵網10公頃
9) 10號越堤路施工便道碎石級配1.2公頃

- 1) 西濱下方_稻草蓆鋪設29公頃
2) 西濱下方_平鋪式防塵網4.7公頃
3) 40-44號施工便道木屑鋪設0.5公頃
4) 40-44號越堤段_平鋪式防塵網23.7公頃

- 1) 58號複式斷面水線12公頃
2) 39號灘地植生灑水線1.6公頃
3) 39號低灘地鋪設稻草蓆5公頃
4) 74號越堤平鋪式防網10公頃
5) 電塔下游南岸裸露地(B區)平鋪式防塵網10.8公頃
6) 跨河鐵塔下(51號越堤)_平鋪式防塵網17公頃
7) 64號越堤培厚_灑水線3.8公頃
8) 74號越堤路施工便道碎石級配1.5公頃
9) 跨河鐵塔下B區_稻草蓆16.5公頃

- 1) 油管橋下游_稻草蓆10.5公頃
2) 溪州大橋上游北岸_稻草蓆24公頃
3) 二水鐵路橋上游北岸灘地簡易灑水設施1.4公頃
4) 西螺大橋下游南岸_稻草蓆8公頃
