


# 揚塵防治 週報表

111/05/16~111/05/22

# 每日施工項目及位置

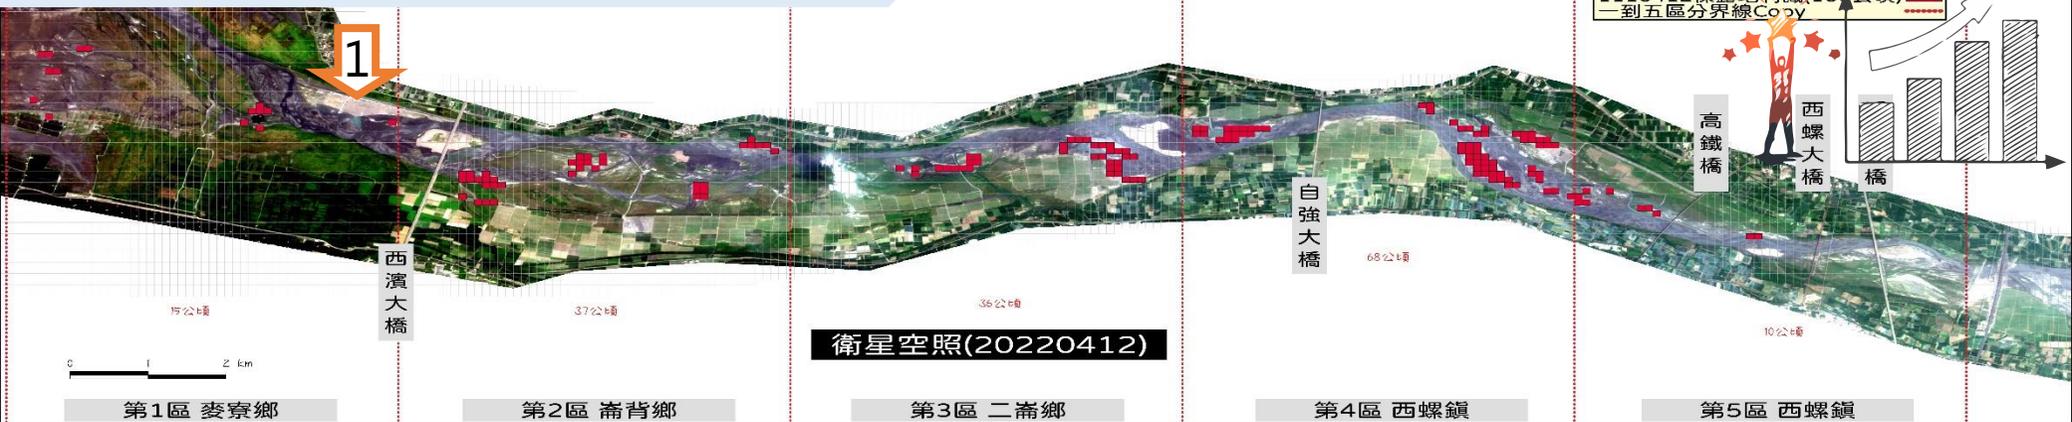

## 西濱下游北岸\_簡易灑水系統





# 各區空拍現況



## 第一區 西濱大橋下游



111/05/19

## 第二區 西濱大橋上游



111/05/19

## 第三區 跨河電塔下游



111/05/19

## 第四區 自強大橋下游



111/05/19

## 第五區 溪州大橋上下游



111/05/19



111年

## 揚塵KPI進度管控

執行期程:111年5月至112年4月

- 抑制面積
- 進度



### 防洪植栽

KPI / 6 公里  
已完成 / - 公里  
達成率/ - %



### 水覆蓋

KPI / 400公頃  
已完成 / - 公頃  
達成率/ - %



### 綠覆蓋

KPI / 50公頃  
已完成 / - 公頃  
達成率/ - %



### 河道整理

KPI / 2.5公里  
已完成 / 0.56公里  
達成率/ 22.4%




### 其他覆蓋

KPI / 450公頃  
已完成 / 13公頃  
達成率/ 2.9%

# 營造複式斷面規劃圖

年度	107-109	110	111	112	合計
KPI(公里)	8	2	6	4	20
實際完成	8	2.13	-	-	-

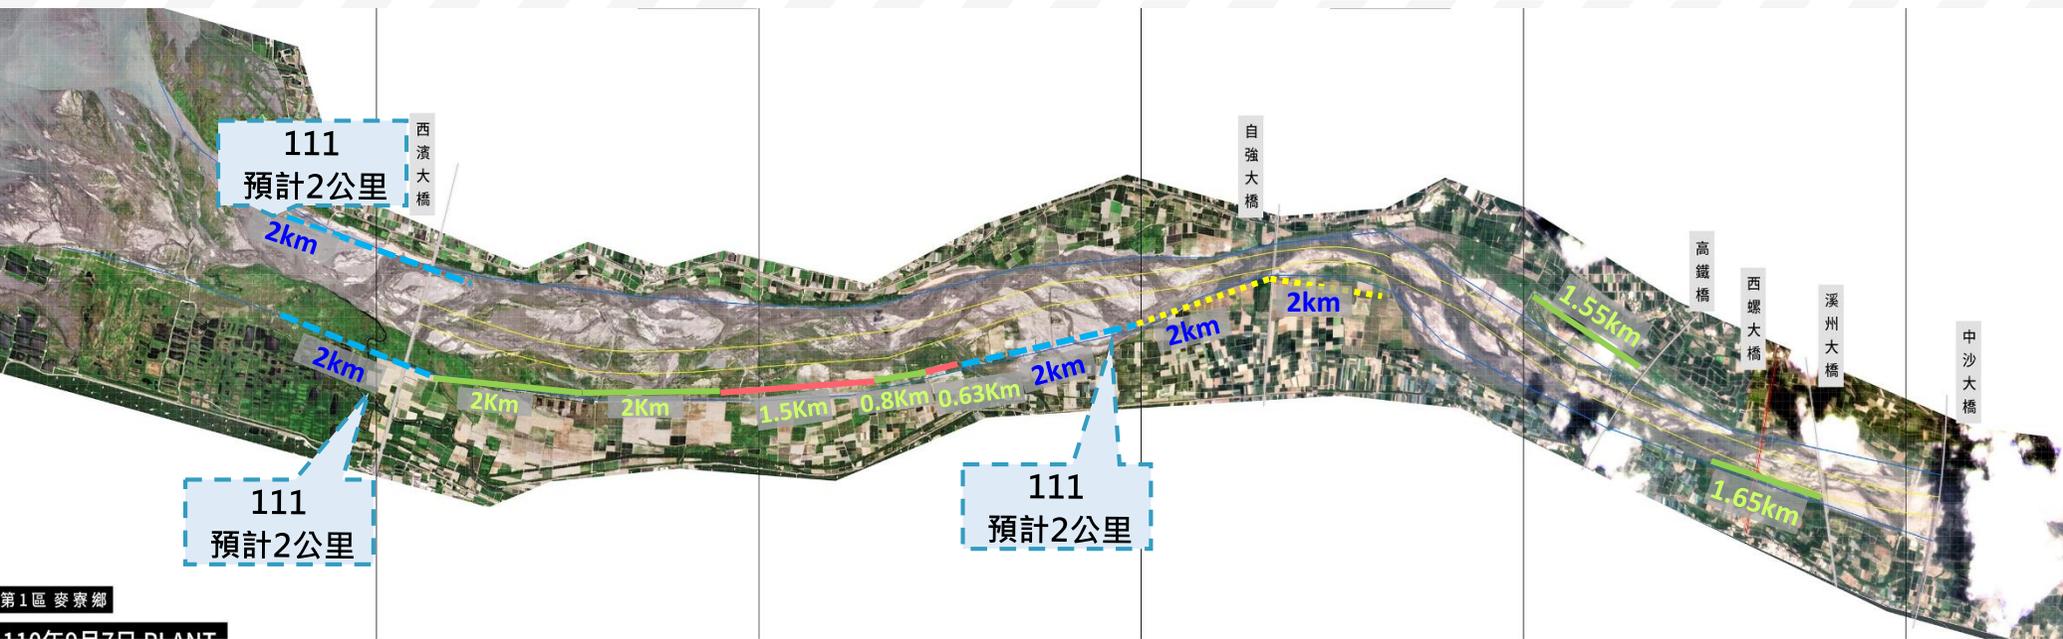

第1區 麥寮鄉

110年9月7日 PLAN 5



## 111年營造複式斷面KPI進度管控

KPI / 6公里

已完成 / -


達成率 / -

### ➤ 執行進度說明：

- (1) 西濱大橋下游北岸已完成土堤培厚2公里，預計6月底完成簡易灑水系統及植栽。
- (2) 西濱下游南岸已於5/13日完成土堤培厚1.8公里，訂於5/23日辦理填方驗收作業，俟驗收完成後，進場辦理簡易灑水系統設置及植栽。

# 水防道路植栽規劃圖

年度	110	111	112	113	114	115	合計
KPI(公里)	1	2	2	2	2	2	11
實際完成	1	1	-	-	-	-	-

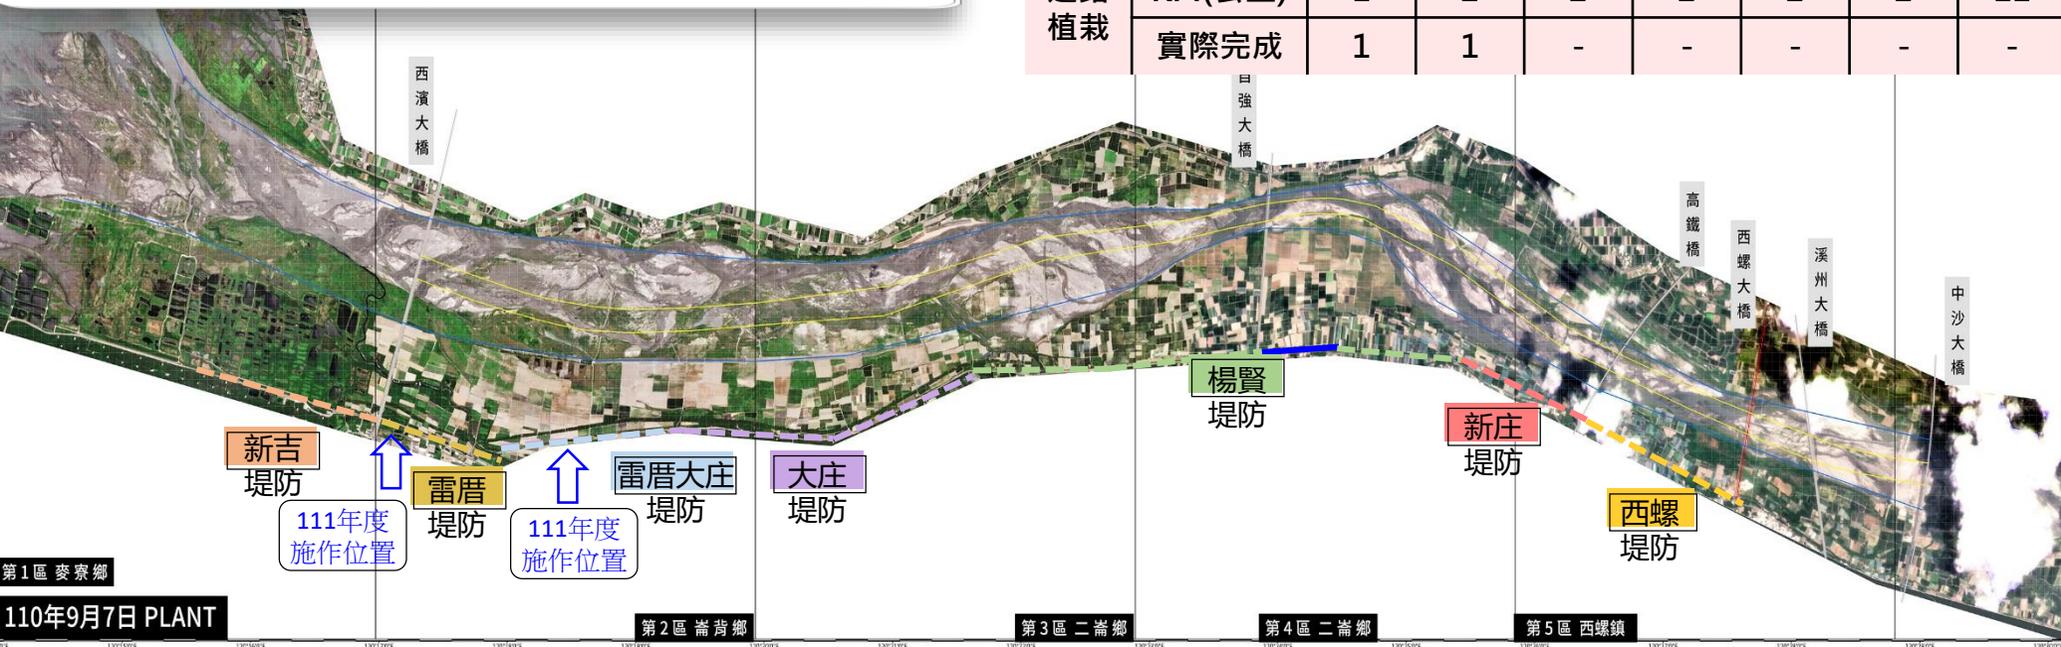


## • 111年水防道路植栽KPI進度管控

**KPI / 2公里**  
 已完成 / 1公里  
 達成率 / 50%

### ➤ 執行進度說明：

- (1) 雷厝堤防堤段水防道路側植樹1公里：道路改善工程已於110年4月施工完成，水防道路側植樹部分，林務局已於5/12日辦理完成。
- (2) 雷厝至大庄堤防堤段水防道路側植樹1公里：目前進場辦理花台設施作業，規劃長度1.3公里，預計8月底完成植樹作業。

# 揚塵抑制措施

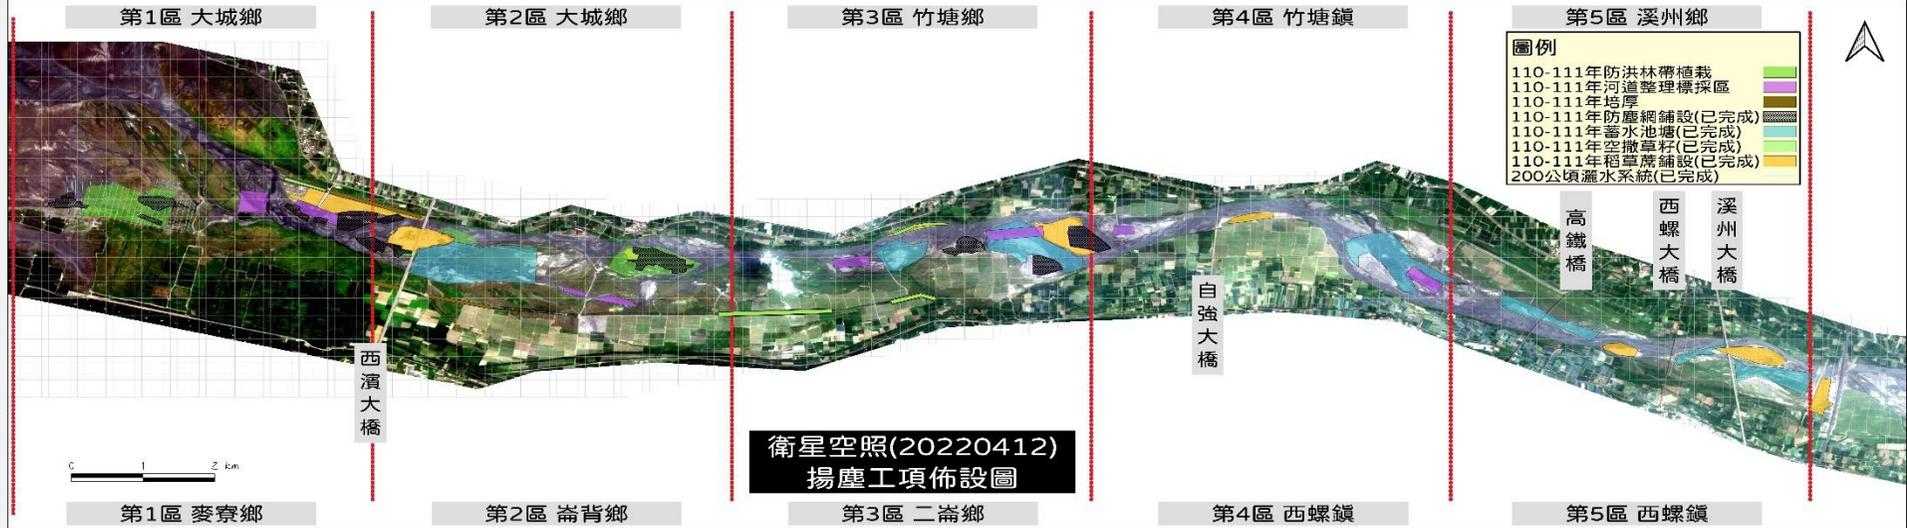

第1區 麥寮鄉	第2區 崙背鄉	第3區 二崙鄉	第4區 西螺鎮	第5區 西螺鎮
水覆蓋	水覆蓋	水覆蓋	水覆蓋	水覆蓋
河道整理	河道整理 1) 河道整理0.56公里	河道整理	河道整理	河道整理
綠覆蓋	綠覆蓋	綠覆蓋	綠覆蓋	綠覆蓋
其他覆蓋	其他覆蓋	其他覆蓋	其他覆蓋	其他覆蓋

- 1) 22號井旁\_防塵網7公頃
- 2) 西濱下北岸\_水線6公頃
