

揚塵防治 週報表


111/06/06~111/06/12

每日施工項目及位置

第3區 竹塘鄉

第4區 竹塘鎮

第5區 溪州鄉

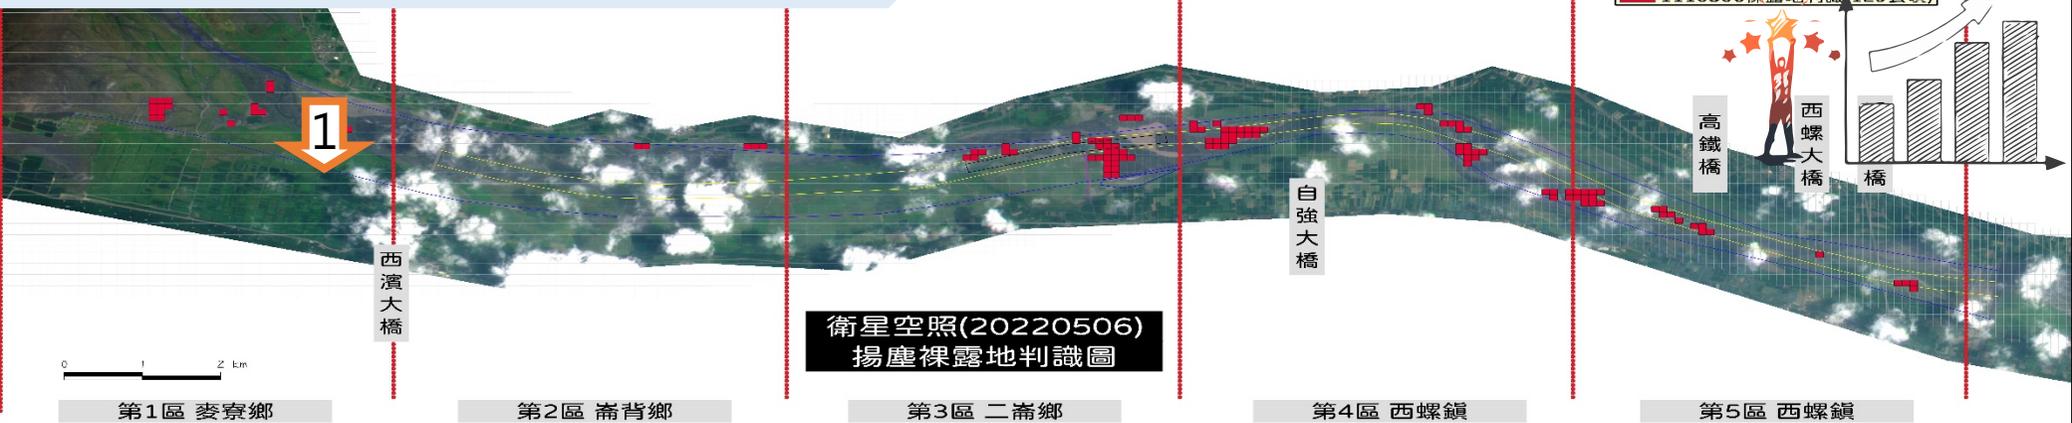

西濱下南岸_簡易灑水系統





各區空拍現況



第一區 西濱大橋下游北岸



第二區 西濱大橋上游



第三區 跨河電塔下游



第四區 自橋大橋上游



第五區 西螺大橋上游



111年

揚塵KPI進度管控

執行期程:111年5月至112年4月

- 抑制面積
- 進度



水覆蓋

KPI / 400公頃
已完成 / - 公頃
達成率 / - %



河道整理

KPI / 2.5公里
已完成 / 0.56公里
達成率 / 22.4%



防洪植栽

KPI / 6 公里
已完成 / - 公里
達成率 / - %



綠覆蓋

KPI / 50公頃
已完成 / - 公頃
達成率 / - %




其他覆蓋

KPI / 450公頃
已完成 / 25.7公頃
達成率 / 5.7%

營造複式斷面規劃圖

年度	107-109	110	111	112	合計
KPI(公里)	8	2	6	4	20
實際完成	8	2.13	-	-	-

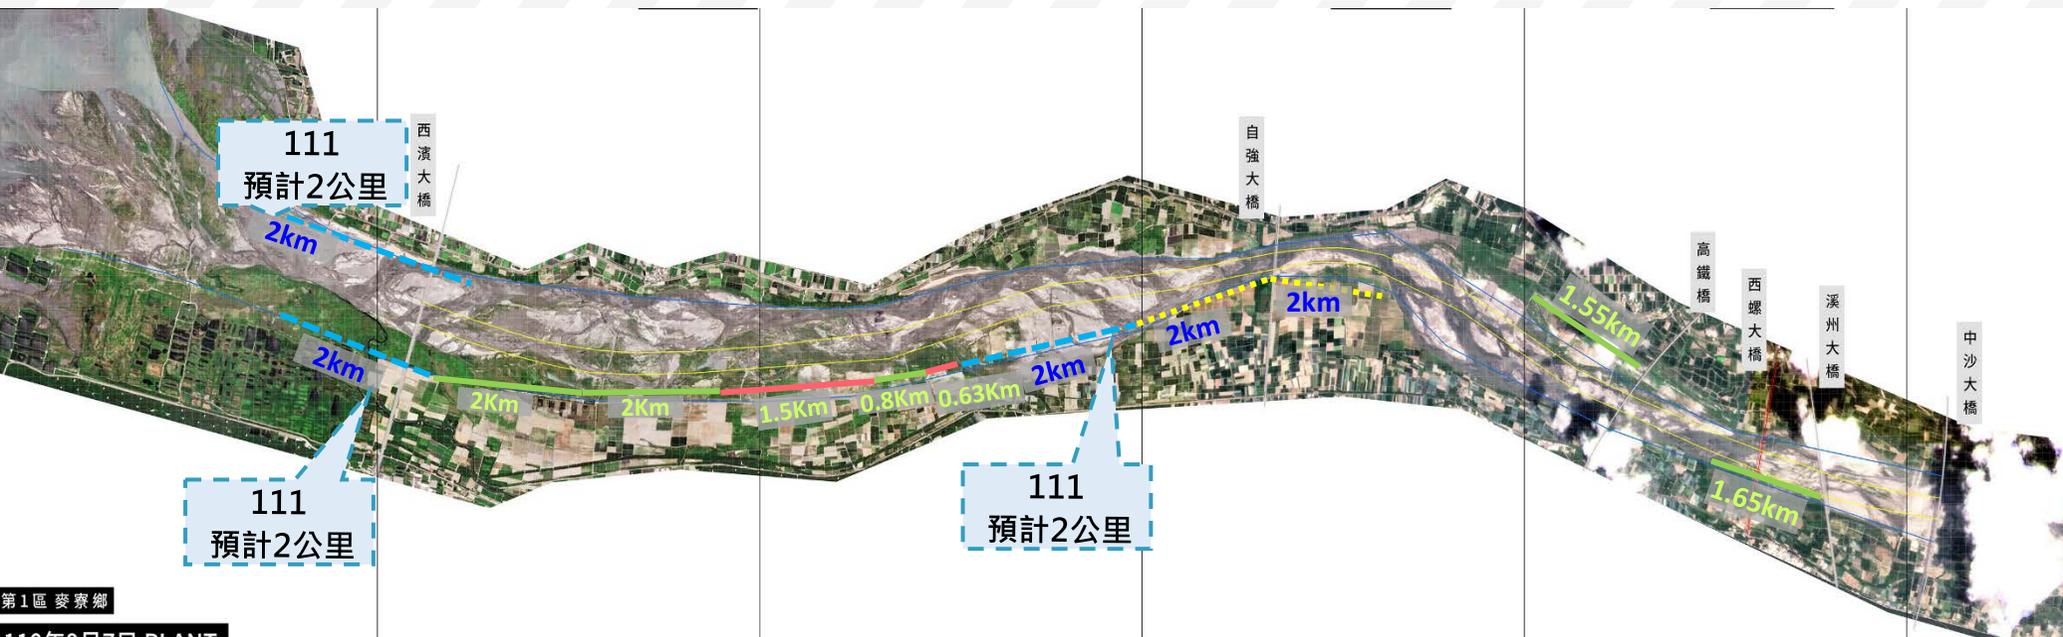

第1區 麥寮鄉

110年05月31日 PLAN 5



110/12/11

● 111年營造複式斷面KPI進度管控

KPI / 6公里

已完成 / -


達成率 / -

➤ 執行進度說明：

- (1) 西濱大橋下游北岸已完成土堤培厚2公里及簡易灑水系統，預計6月底完成植栽作業。
- (2) 西濱大橋下游南岸已完成土堤培厚1.8公里，簡易灑水系統設置，已於6/6日完成，預計6月底完成植栽作業。

水防道路植栽規劃圖

年度	110	111	112	113	114	115	合計
KPI(公里)	1	2	2	2	2	2	11
實際完成	1	1	-	-	-	-	-

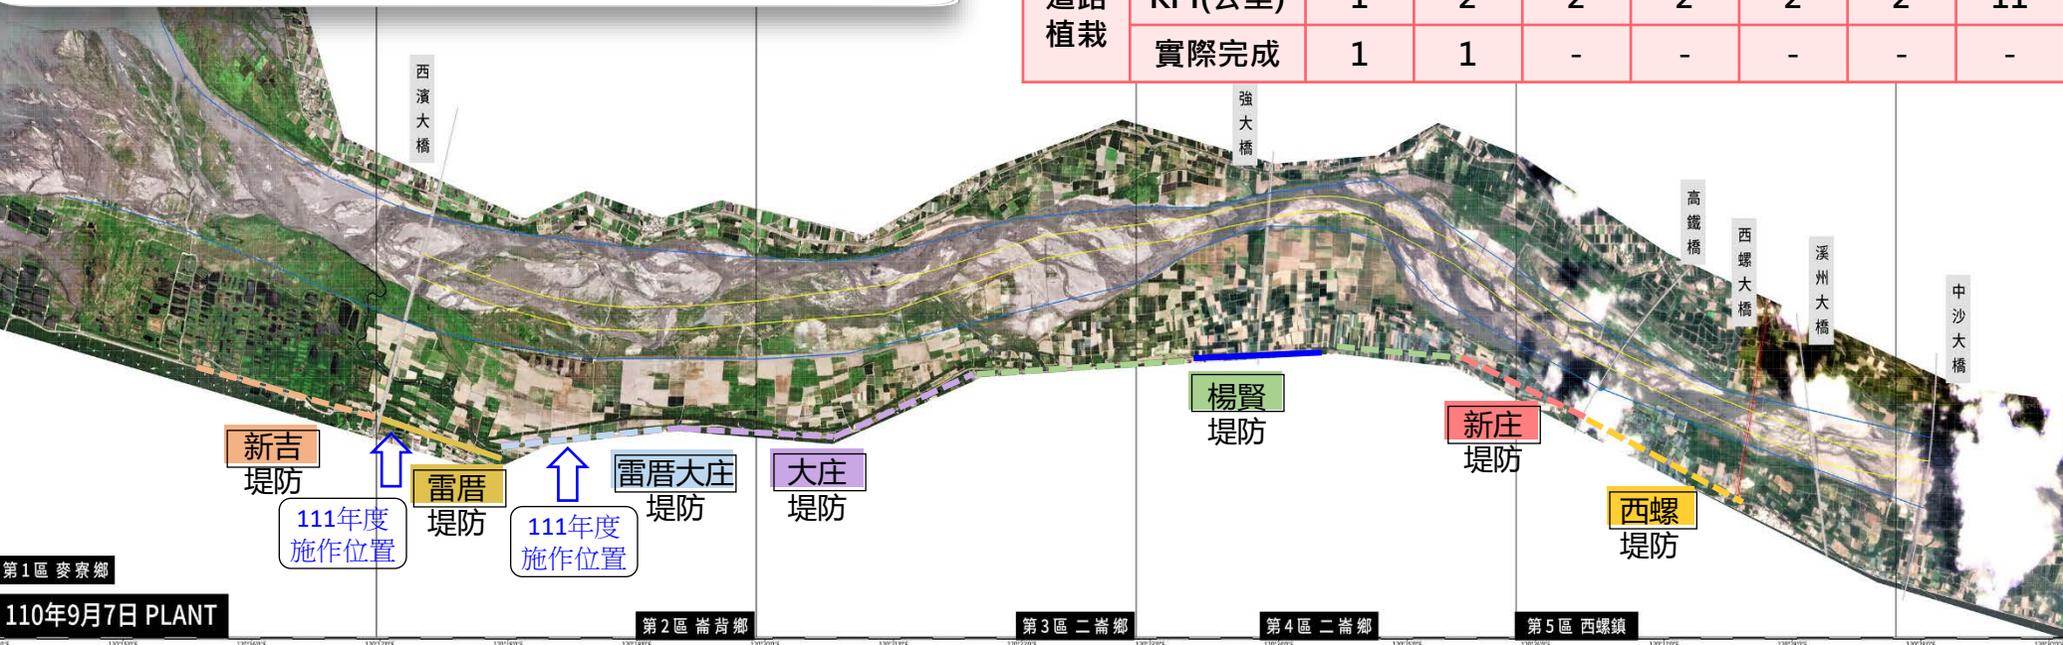


111年水防道路植栽KPI進度管控

KPI / 2公里
 已完成 / 1公里
 達成率 / 50%

➤ 執行進度說明：

- (1) 雷厝堤防堤段水防道路側植樹1公里：道路改善工程已於110年4月施工完成，水防道路側植樹部分，林務局已於5/12日辦理完成。
- (2) 雷厝至大庄堤防堤段水防道路側植樹1公里：目前進場辦理花台設施作業，規劃長度1.3公里，預計8月底完成植樹作業。

揚塵抑制措施

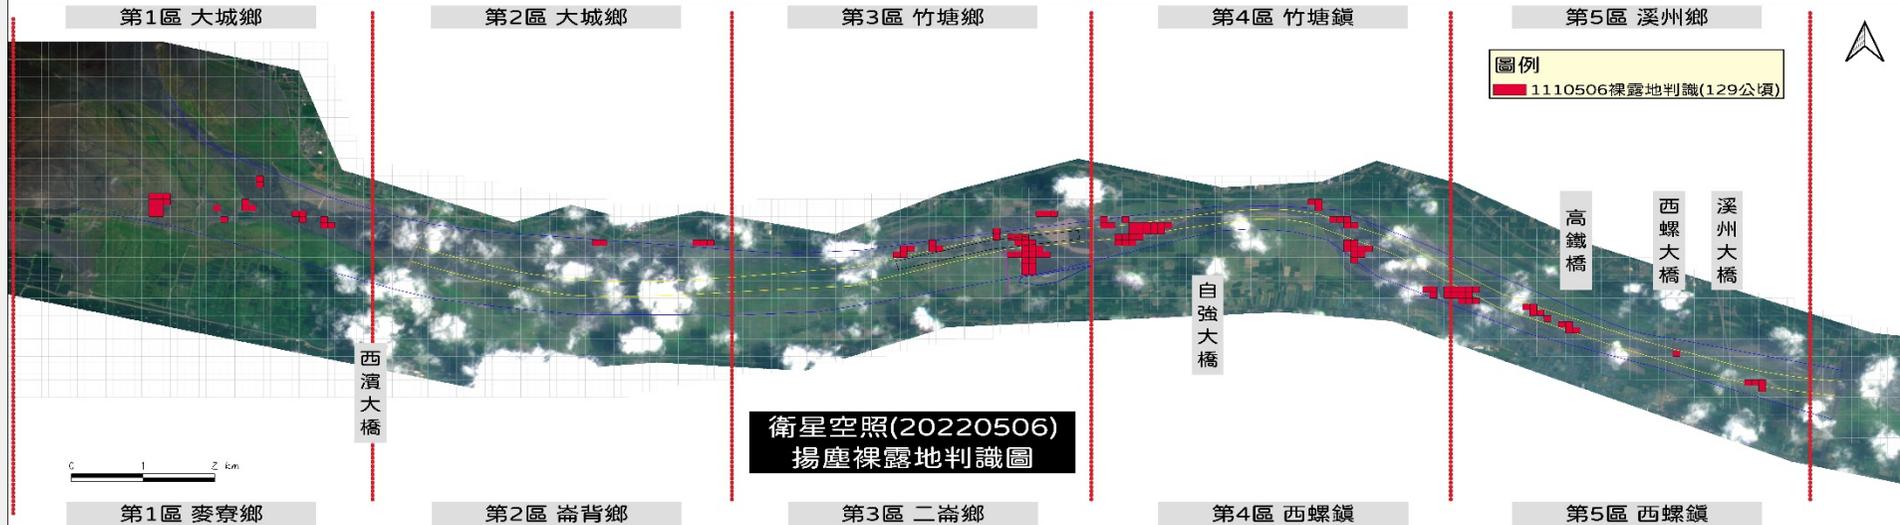

第1區 麥寮鄉	第2區 崙背鄉	第3區 二崙鄉	第4區 西螺鎮	第5區 西螺鎮
水覆蓋	水覆蓋	水覆蓋	水覆蓋	水覆蓋
河道整理	河道整理 1) 河道整理0.56公里	河道整理	河道整理	河道整理
綠覆蓋	綠覆蓋	綠覆蓋	綠覆蓋	綠覆蓋
其他覆蓋	其他覆蓋	其他覆蓋	其他覆蓋	其他覆蓋
1) 22號井旁_防塵網7公頃 2) 西濱下北岸_水線10.5公頃 3) 20公頃_水線0.8公頃 4) 西濱下南岸_水線7.4公頃				
