




日報表

2022/01/28

本日揚塵空品監測

➤ 本日未發布揚塵警報

麥寮測站

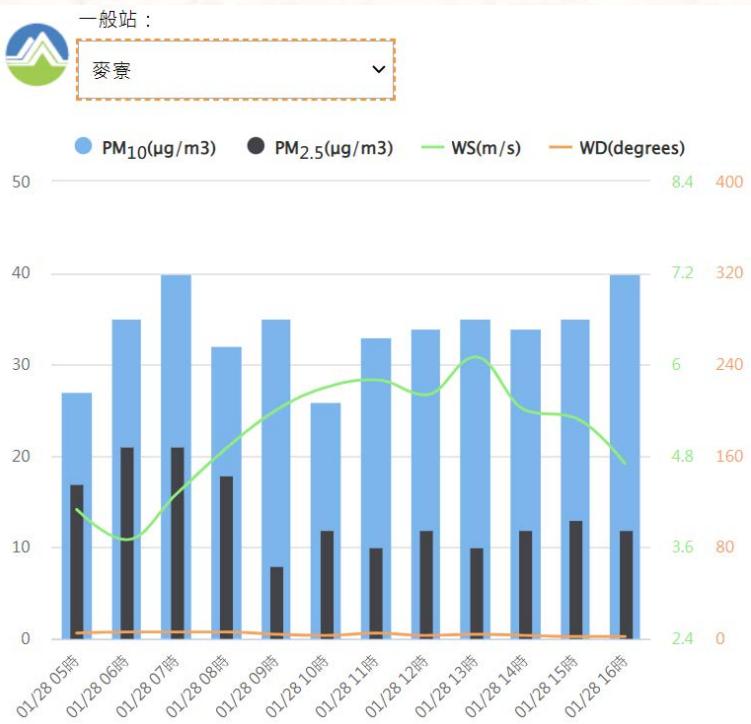

崙背測站





各區空拍現況



第三區
跨河鐵塔下游




第四區
自強大橋上游



第五區
溪州大橋上游



每日施工項目及位置

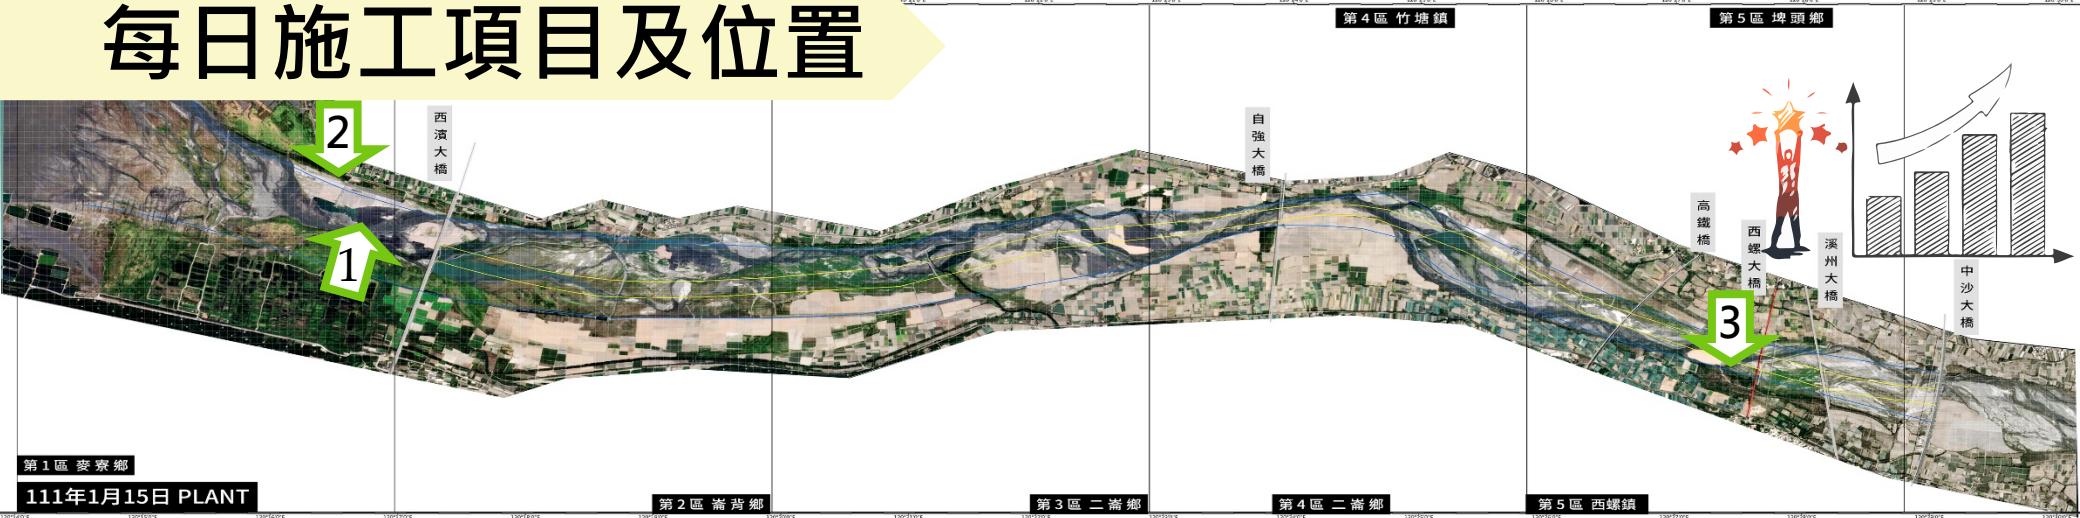

111年1月15日 PLANT

西濱大橋下游北岸_河道整理



西濱下游北岸_複式斷面植栽



西螺大橋下游南岸B區_稻草蓆鋪設



110年 揚塵KPI進度管控

- 抑制面積
- 進度



KPI / 400公頃
已完成 / 405公頃
達成率 / 101.3%



KPI / 2.5公里
已完成 / 4.07公里
達成率 / 162.8%

綠覆蓋



KPI / 50公頃
已完成 / 274.7公頃
達成率 / 549.4%

防洪植栽




KPI / 4公里
已完成 / 5.695公里
達成率 / 142.4%

其他覆蓋



KPI / 450公頃
已完成 / 386.5公頃
達成率 / 85.9%

揚塵抑制措施

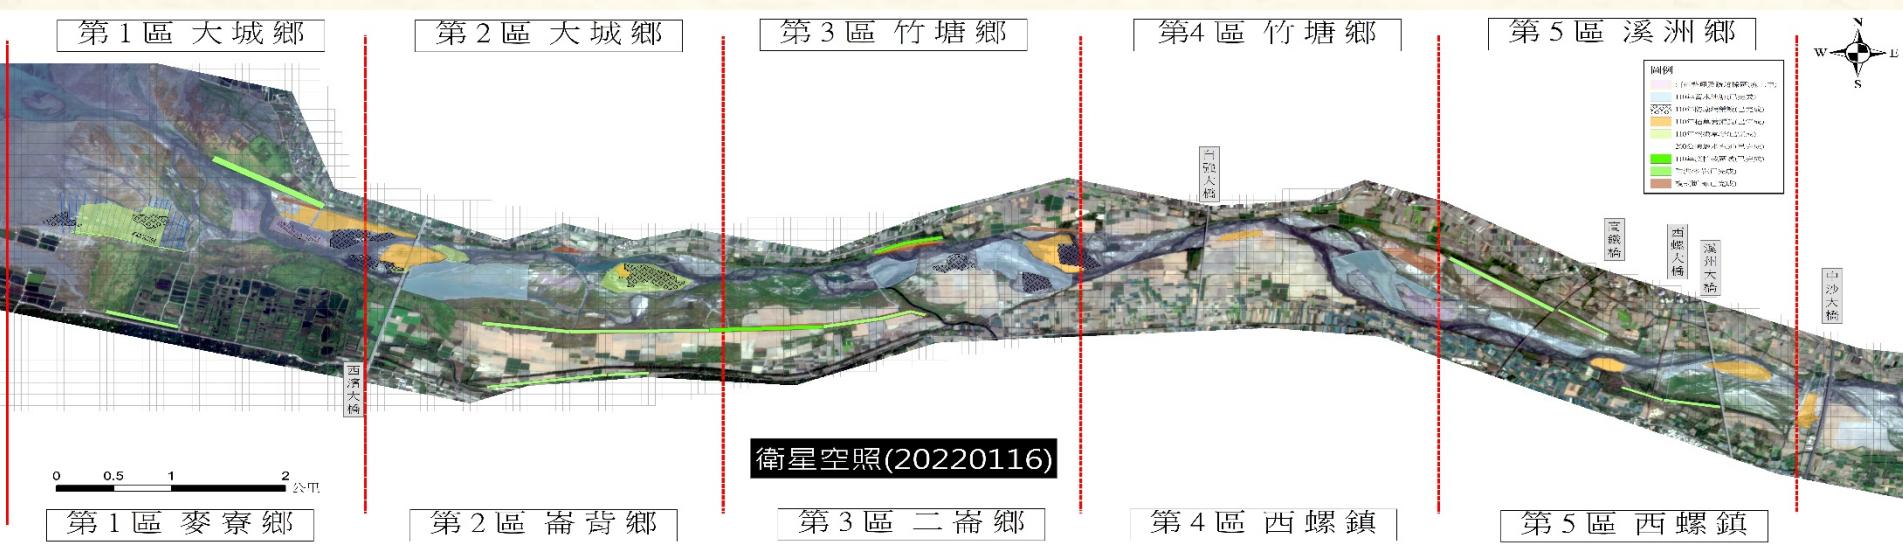

水覆蓋

- 1) 水覆蓋150公頃
- 1) 水覆蓋30公頃
- 1) 水覆蓋100公頃
- 1) 中沙水覆蓋20公頃

河道整理

- 1) 河道整理1.76公里
- 1) 河道整理0.9公里
- 1) 河道整理0.78公里

綠覆蓋

- 1) 防洪林帶0.6公里
- 2) 200公頃空灑草籽53公頃
- 3) 200公頃15-18水井空灑草籽18公頃
- 4) 綠覆蓋1.2公頃
- 5) 防洪林帶0.55公里
- 1) 西濱上下游空灑草籽23公頃
- 2) 44號越堤路空灑草籽33公頃
- 1) 防洪林帶1.5公里
- 2) 空灑草籽60公頃
- 3) 噴灑草籽4公頃
- 4) 39號灘地林地植生1公里
- 5) 防洪林帶0.63公里

其他覆蓋

- 1) 稻草蓆鋪設86.5公頃
- 2) 簡易灑水設施2.6公頃
- 3) 碎石級配0.9公頃
- 4) 防塵網鋪設22公頃
- 5) 西濱下游北岸稻草蓆鋪設40公頃
- 6) 西濱下游北岸防塵網鋪設13公頃
- 7) 200公頃4-8號井站堤防塵網1.5公頃
- 8) 西濱下游北岸取土區前灘地防塵網10公頃
- 9) 10號越堤路施工便道碎石級配1.2公頃
- 10) 西濱下北岸簡易灑水3.3公頃
- 1) 西濱下方_稻草蓆鋪設29公頃
- 2) 西濱下方_平鋪式防塵網4.7公頃
- 3) 40-44號施工便道木屑鋪設0.5公頃
- 4) 40-44號越堤段_平鋪式防塵網23.7公頃
- 1) 58號複式斷面水線12公頃
- 2) 39號灘地植生灑水線1.6公頃
- 3) 39號低灘地鋪設稻草蓆5公頃
- 4) 74號越堤平鋪式防網10公頃
- 5) 電塔下游南岸裸露地(B區)平鋪式防塵網10.8公頃
- 6) 跨河鐵塔下(51號越堤)_平鋪式防塵網17公頃
- 7) 64號越堤培厚_灑水線3.8公頃
- 8) 74號越堤路施工便道碎石級配1.5公頃
- 9) 跨河鐵塔下B區_稻草蓆23公頃
