




# 每日報表

2022/01/23


# 本日揚塵空品監測

➤ 本日未發布揚塵警報

## 麥寮測站

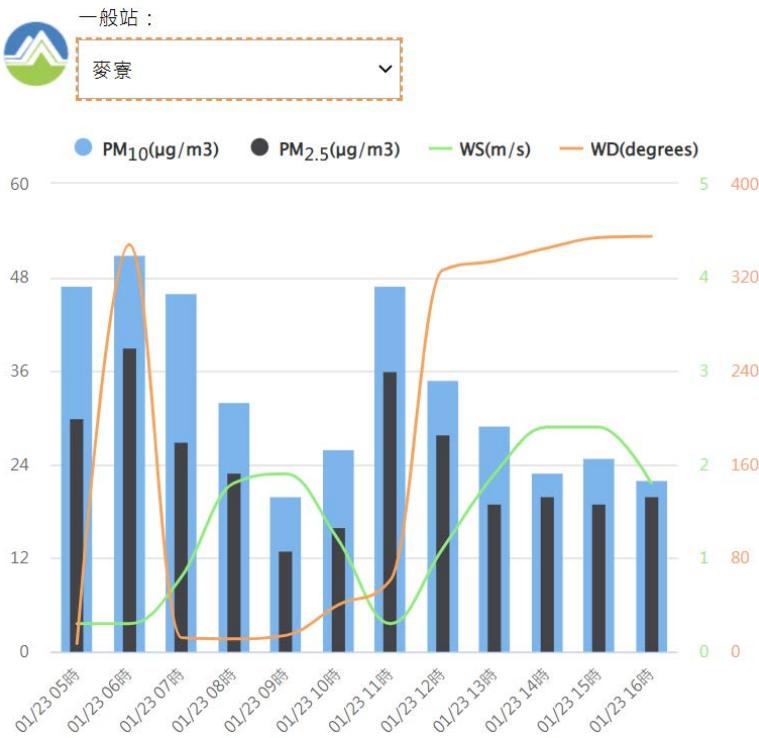


## 崙背測站

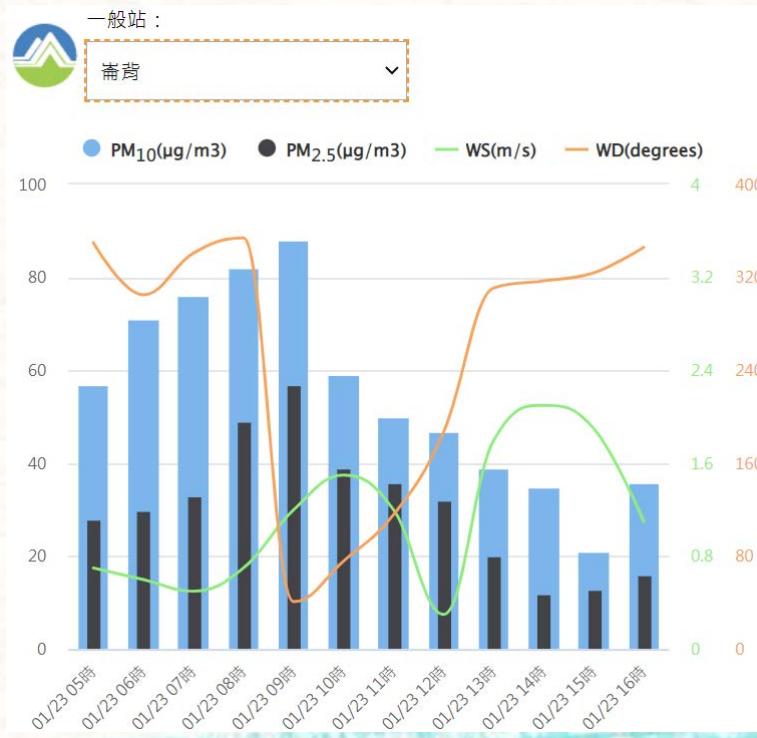



# 各區空拍現況

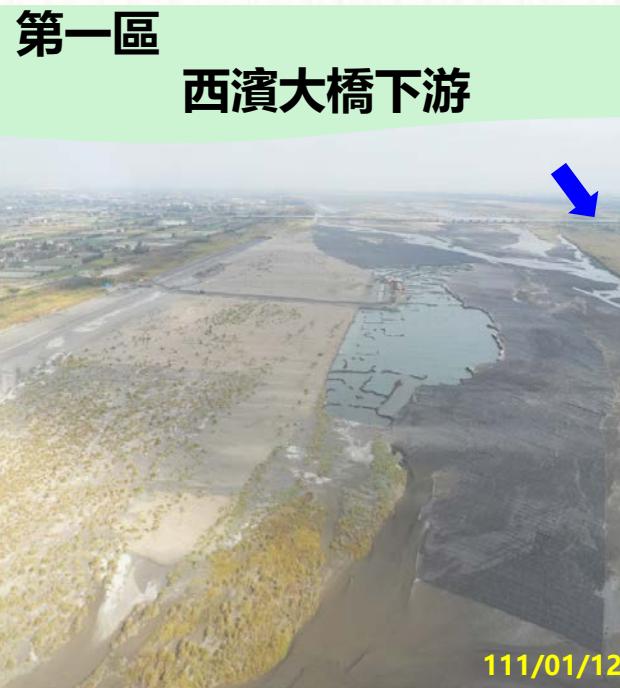

第三區  
跨河鐵塔下游




第四區  
高鐵橋下游




第五區  
西螺大橋下游



# 每日施工項目及位置

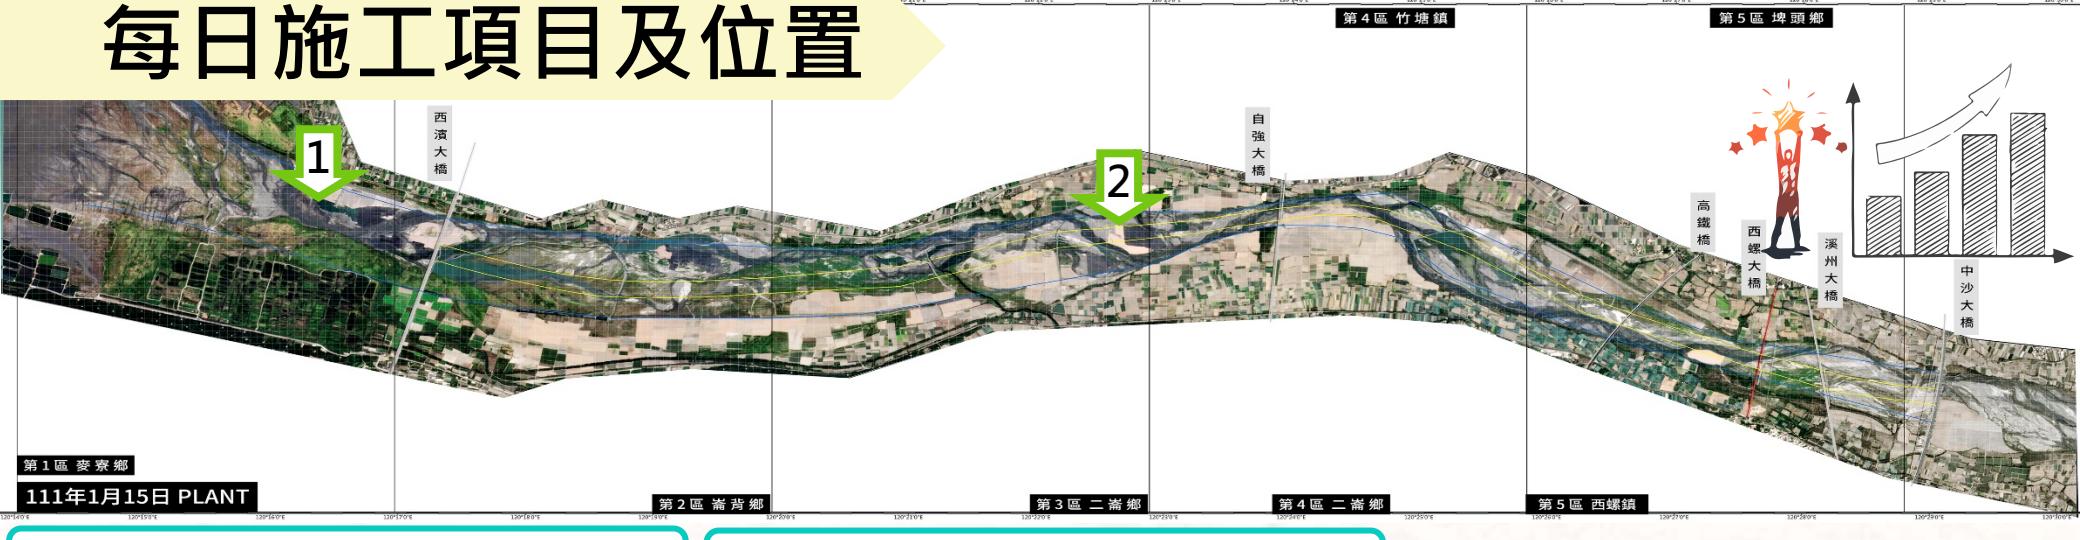

西濱大橋下游北岸\_河道整理

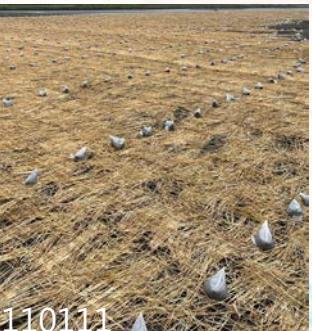

跨河鐵塔B區\_稻草蓆鋪設



# 110年 揚塵KPI進度管控

- 抑制面積
- 進度



KPI / 400公頃  
已完成 / 405公頃  
達成率 / 101.3%



KPI / 2.5公里  
已完成 / 3.92公里  
達成率 / 156.8%



KPI / 50公頃  
已完成 / 274.7公頃  
達成率 / 549.4%




KPI / 4公里  
已完成 / 5.145公里  
達成率 / 128.6%



KPI / 450公頃  
已完成 / 374.7公頃  
達成率 / 83.3%

# 揚塵抑制措施

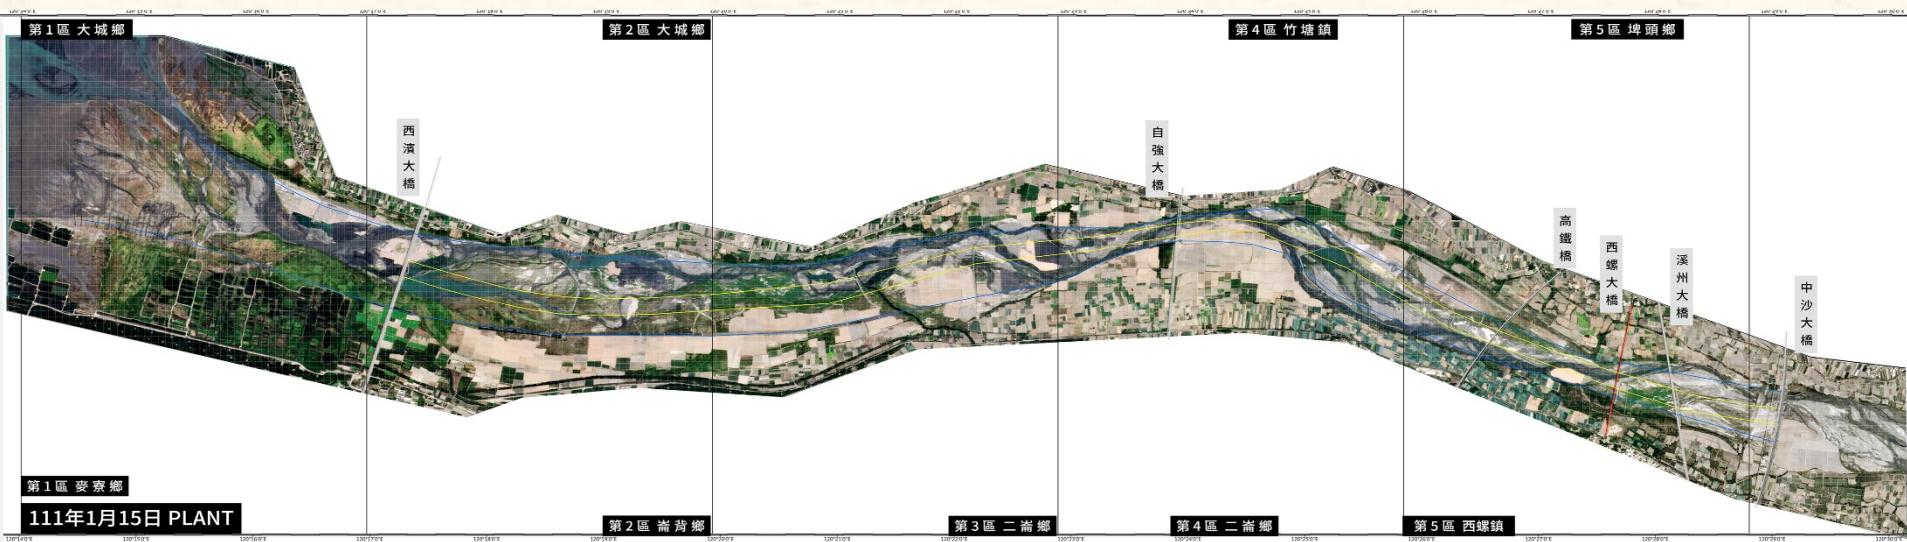

## 水覆蓋

- |             |                          |             |  |
|-------------|--------------------------|-------------|--|
| 1) 水覆蓋150公頃 | 1) 水覆蓋30公頃<br>2) 水覆蓋40公頃 | 1) 水覆蓋100公頃 | 1) 中沙水覆蓋20公頃<br>2) 高鐵水覆蓋50公頃<br>3) 西螺水覆蓋15公頃 |
|-------------|--------------------------|-------------|--|

## 河道整理

- |               |                               |               |  |
|---------------|-------------------------------|---------------|--|
| 1) 河道整理1.61公里 | 1) 河道整理0.9公里<br>2) 河道整理0.63公里 | 1) 河道整理0.78公里 |  |
|---------------|-------------------------------|---------------|--|

## 綠覆蓋

- |  |                                       |   |  |
|--|---------------------------------------|---|--|
| 1) 防洪林帶0.6公里<br>2) 200公頃空灑草籽53公頃<br>3) 200公頃15-18水井空灑草籽18公頃<br>4) 綠覆蓋1.2公頃 | 1) 西濱上下游空灑草籽23公頃<br>2) 44號越堤路空灑草籽33公頃 | 1) 防洪林帶1.5公里<br>2) 空灑草籽60公頃<br>3) 噴灑草籽4公頃<br>4) 39號灘地林地植生1公里<br>5) 防洪林帶0.63公里 | 1) 楊賢堤防_防汛道路植栽1公里<br>1) 中沙大橋上游空灑草籽50公頃<br>2) 西螺大橋下游空灑草籽32.5公頃<br>3) 二水鐵路橋上游北岸灘地植生林帶0.415公里 |
|--|---------------------------------------|---|--|

## 其他覆蓋

- |   |   |   |  |
|---|---|---|--|
| 1) 稻草蓆鋪設86.5公頃<br>2) 簡易灑水設施2.6公頃<br>3) 碎石級配0.9公頃<br>4) 防塵網鋪設22公頃<br>5) 西濱下游北岸稻草蓆鋪設40公頃<br>6) 西濱下游北岸防塵網鋪設13公頃<br>7) 200公頃4-8號井站堤防塵網1.5公頃<br>8) 西濱下游北岸取土區前灘地防塵網10公頃<br>9) 10號越堤路施工便道碎石級配1.2公頃 | 1) 西濱下方_稻草蓆鋪設29公頃<br>2) 西濱下方_平鋪式防塵網4.7公頃<br>3) 40-44號施工便道木屑鋪設0.5公頃<br>4) 40-44號越堤段_平鋪式防塵網23.7公頃 | 1) 58號複式斷面水線12公頃<br>2) 39號灘地植生灑水線1.6公頃<br>3) 39號低灘地鋪設稻草蓆5公頃<br>4) 74號越堤平鋪式防網10公頃<br>5) 電塔下游南岸裸露地(B區)平鋪式防塵網10.8公頃<br>6) 跨河鐵塔下(51號越堤)_平鋪式防塵網17公頃<br>7) 64號越堤培厚_灑水線3.8公頃<br>8) 74號越堤路施工便道碎石級配1.5公頃<br>9) 跨河鐵塔下B區_稻草蓆16.5公頃 | 1) 自強橋上游_稻草蓆鋪設17公頃<br>1) 油管橋下游_稻草蓆10.5公頃<br>2) 溪州大橋上游北岸_稻草蓆24公頃<br>3) 二水鐵路橋上游北岸灘地簡易灑水設施1.4公頃<br>4) 西螺大橋下游南岸_稻草蓆8公頃 |
|---|---|---|--|
