

揚塵防治 週報表

111/08/15~111/08/21

每日施工項目及位置



大義崙排水上游_河道整理_去化土砂_培厚





各區空拍現況



第一區

西濱大橋下游



第二區

大庄堤防(40號越堤路)下游



第三區

楊賢堤防(74號越堤路)上下游



第四區

自強大橋上游



第五區

西螺大橋上游



111年度

揚塵KPI進度管控

執行期程:111年5月至112年4月



- 抑制面積
- 進度



水覆蓋

KPI / 400公頃
已完成 / - 公頃
達成率/ - %



河道整理

KPI / 2.5公里
已完成 / 0.9公里
達成率/ 36%



防洪植栽

KPI / 4 公里
已完成 / 4.55公里
達成率/ 113.8%



綠覆蓋

KPI / 50公頃
已完成 / 6 公頃
達成率/ 12 %



其他覆蓋

KPI / 450公頃
已完成 / 27.2公頃
達成率/ 6%

營造複式斷面規劃圖

年度	107-109	110	111	112	合計
KPI(公里)	8	2	6	4	20
實際完成	8	2.13	3.8	-	13.93



第1區 麥寮鄉

110年05月 PLAN5



111/07/19

111年營造複式斷面進度管控


KPI / 6公里
 已完成 / 3.8km
 達成率 / 63.3%

➤ 執行進度說明：

- (1) 西濱大橋下游北岸已於6/29完成2公里。
- (2) 西濱大橋上游南岸已於7/30完成1.8公里。
- (3) 楊賢堤防(74號越堤路):已進場施作，預計12月底完成。

水防道路植栽規劃圖

年度	110	111	112	113	114	115	合計
KPI(公里)	1	2	2	2	2	2	11
實際完成	1	2.3	-	-	-	-	3.3

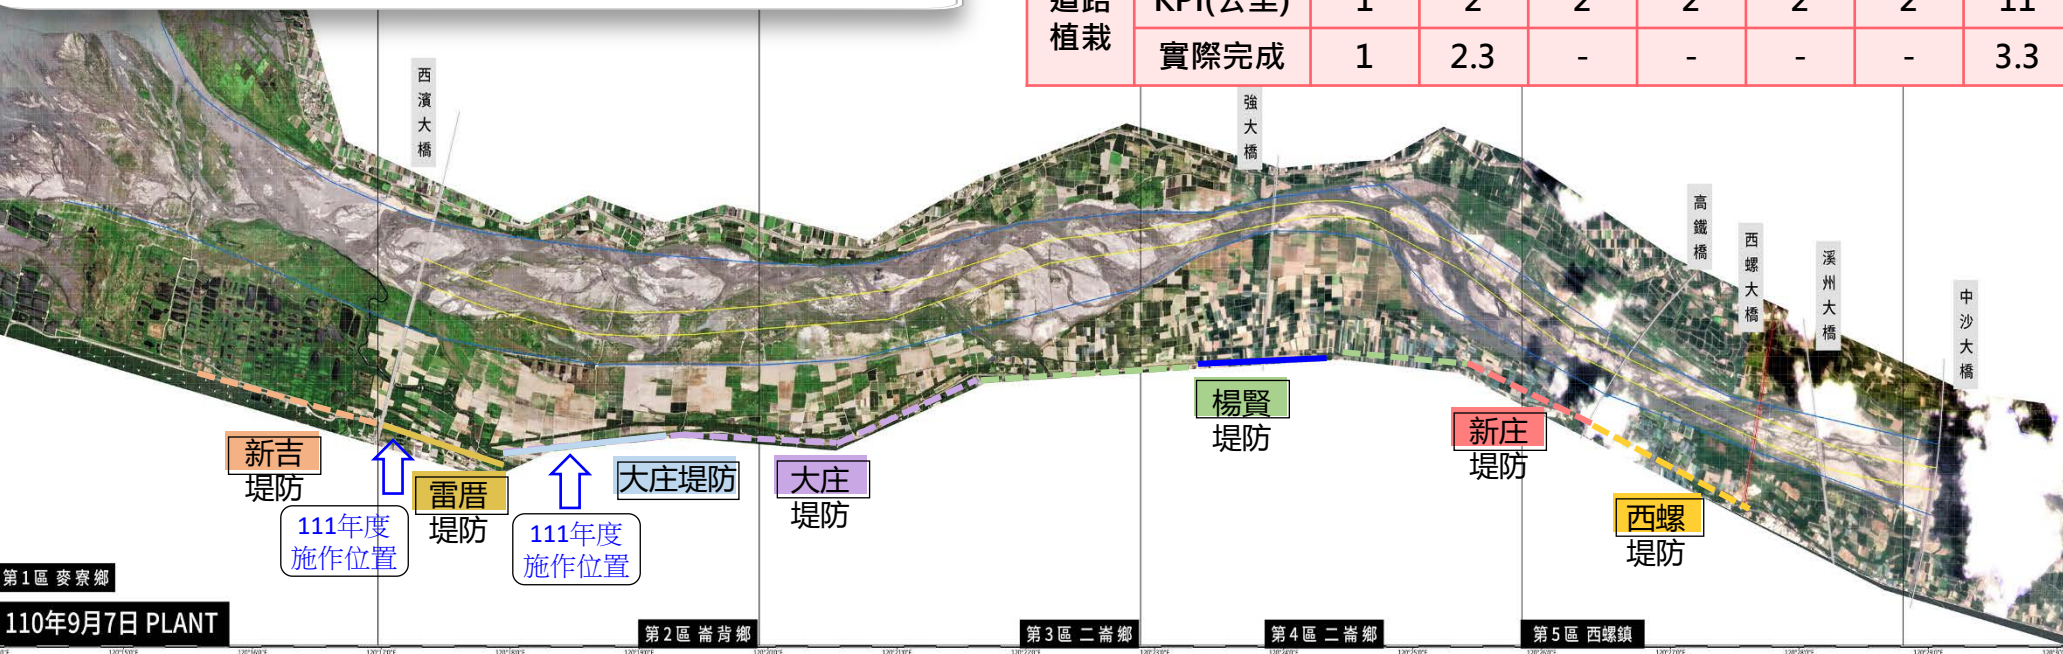


• 111年水防道路植栽進度管控

KPI / 2公里
 已完成 / 2.3公里
 達成率/ 115%

➤ 執行進度說明：

- (1) 雷厝堤防堤段水防道路側植樹1公里：道路改善工程已於110年4月施工完成，水防道路側植樹部分，林務局已於5/12日辦理完成。
- (2) 大庄堤防堤段水防道路側植樹1.3公里：植栽作業已於7/15日辦理施作完成。

揚塵抑制措施

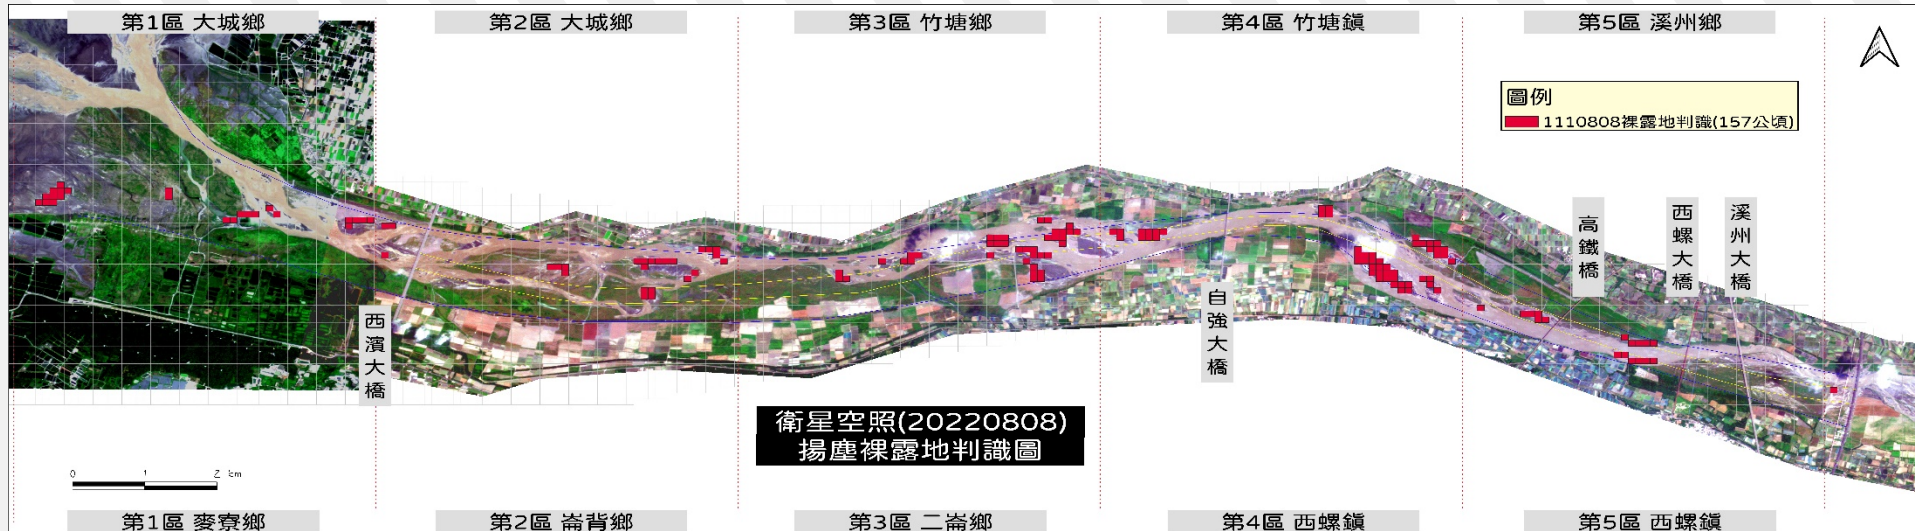

水覆蓋	水覆蓋	水覆蓋	水覆蓋	水覆蓋
河道整理	河道整理	河道整理	河道整理	河道整理
	1) 河道整理0.56公里	1) 河道整理0.34公里		
綠覆蓋	綠覆蓋	綠覆蓋	綠覆蓋	綠覆蓋
1) 西濱下游北岸_地面綠化_4公頃	1) 西濱上南岸_地面綠化_2公頃			
防洪植栽	防洪植栽	防洪植栽	防洪植栽	防洪植栽
1) 西濱下北岸_植栽_1.45公里	1) 大庄堤防堤段水防道路側植樹1.3公里 2) 西濱上南岸_植栽_1.8公里			
其他覆蓋	其他覆蓋	其他覆蓋	其他覆蓋	其他覆蓋
1) 22號井旁_防塵網7公頃 2) 西濱下北岸_水線10.5公頃 3) 20公頃_水線0.8公頃 4) 西濱下南岸_水線7.4公頃 5) 西濱下北岸(增設)_水線1.5公頃				
