

2022

濁水溪「揚塵防制及改善行動方案」

〈日報表〉


09月05日




本日揚塵空品監測

麥寮
測站

WS:風速 WD:風向 RH:相對濕度

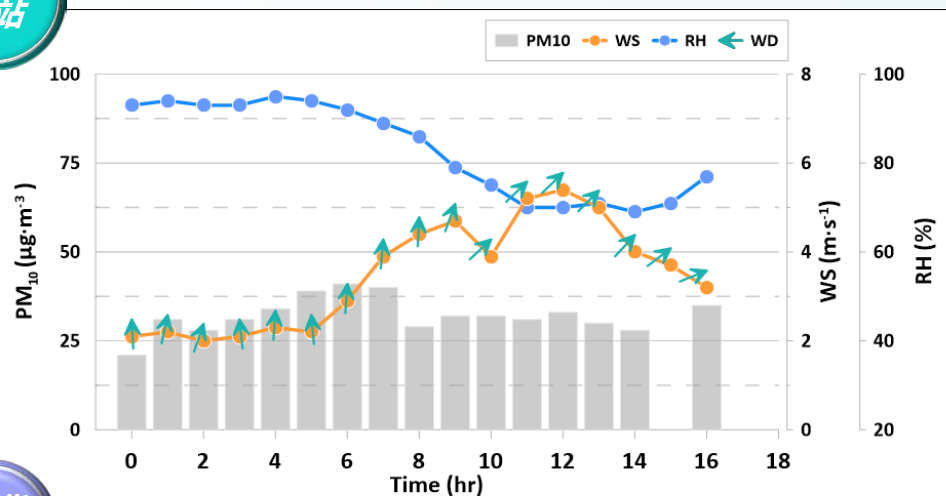

崙背
測站

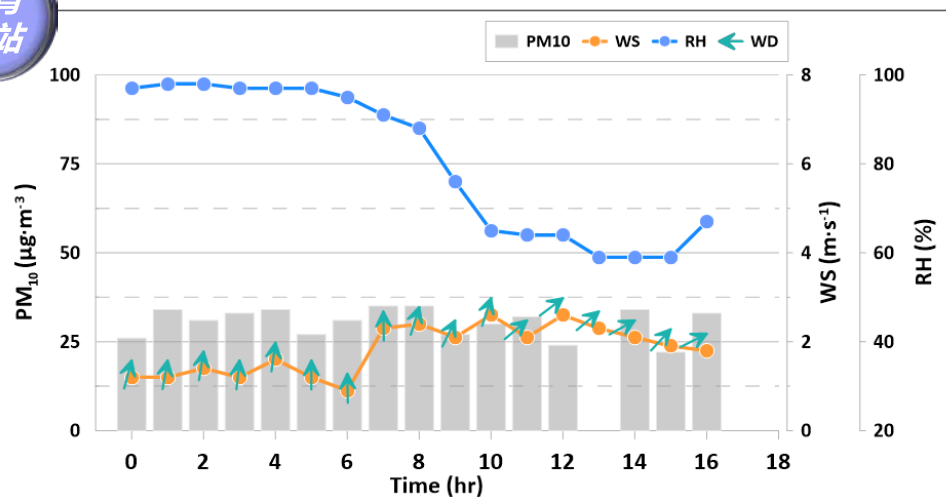

資料來源:環保署空氣品質監測網

本日未發布揚塵警報

麥寮

日累積雨量 0 mm


崙背

日累積雨量 0 mm

資料來源:環保署空氣品質監測網



各區空拍現況



第一區
麥寮 出海口



第二區
西濱大橋上游



第三區
楊賢堤防(74號越堤路)上游




第四區
自強大橋上游



第五區
西螺大橋上游



每日施工項目及位置

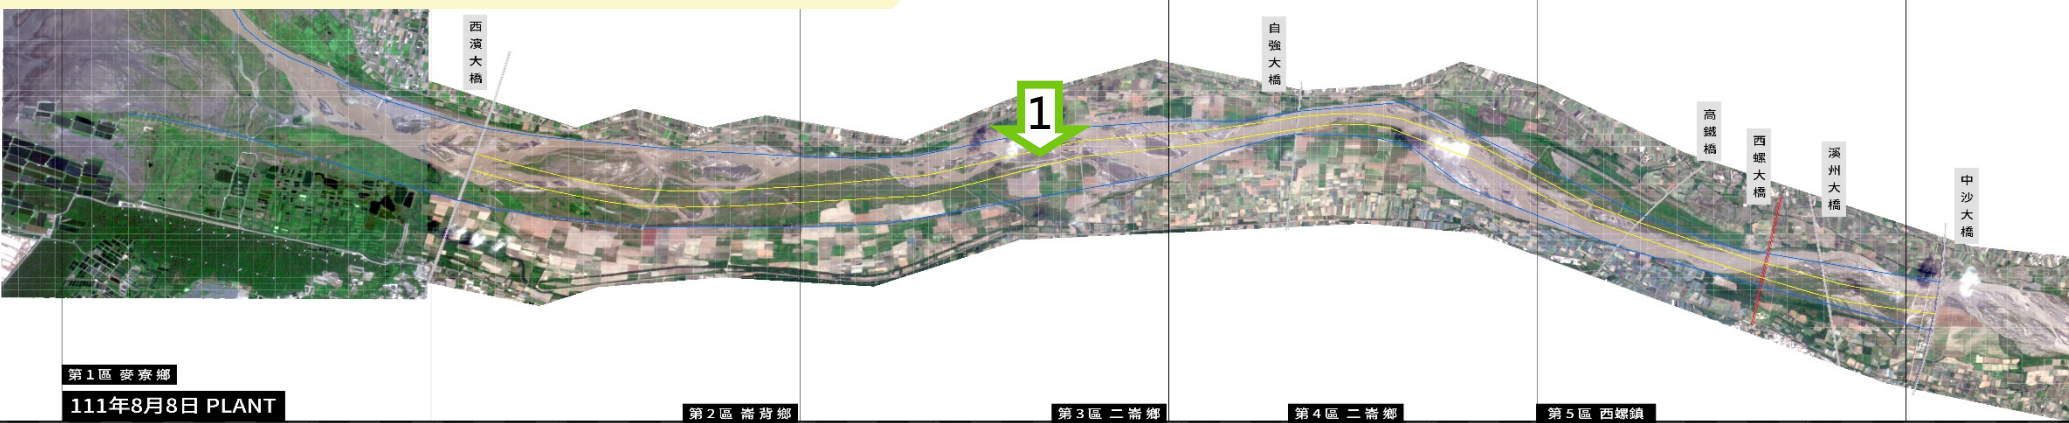

大義崙排水上游_河道整理_去化土砂_培厚



111年度

揚塵KPI進度管

執行期程:111年5月至112年4月

- 抑制面積
- 進度



水覆蓋

- 目標值：400 公頃
- 已完成：- 公頃
- 達成率：-

防洪植栽

- 目標值：4 公里
- 已完成：4.55 公里
- 達成率：113.8 %



其他覆蓋

- 目標值：450 公頃
- 已完成：27.2 公頃
- 達成率：6 %


河道整理

- 目標值：2.5 公里
- 已完成：1.20公里
- 達成率：48%

綠覆蓋

- 目標值：50 公頃
- 已完成：6 公頃
- 達成率：12 %

揚塵抑制措施

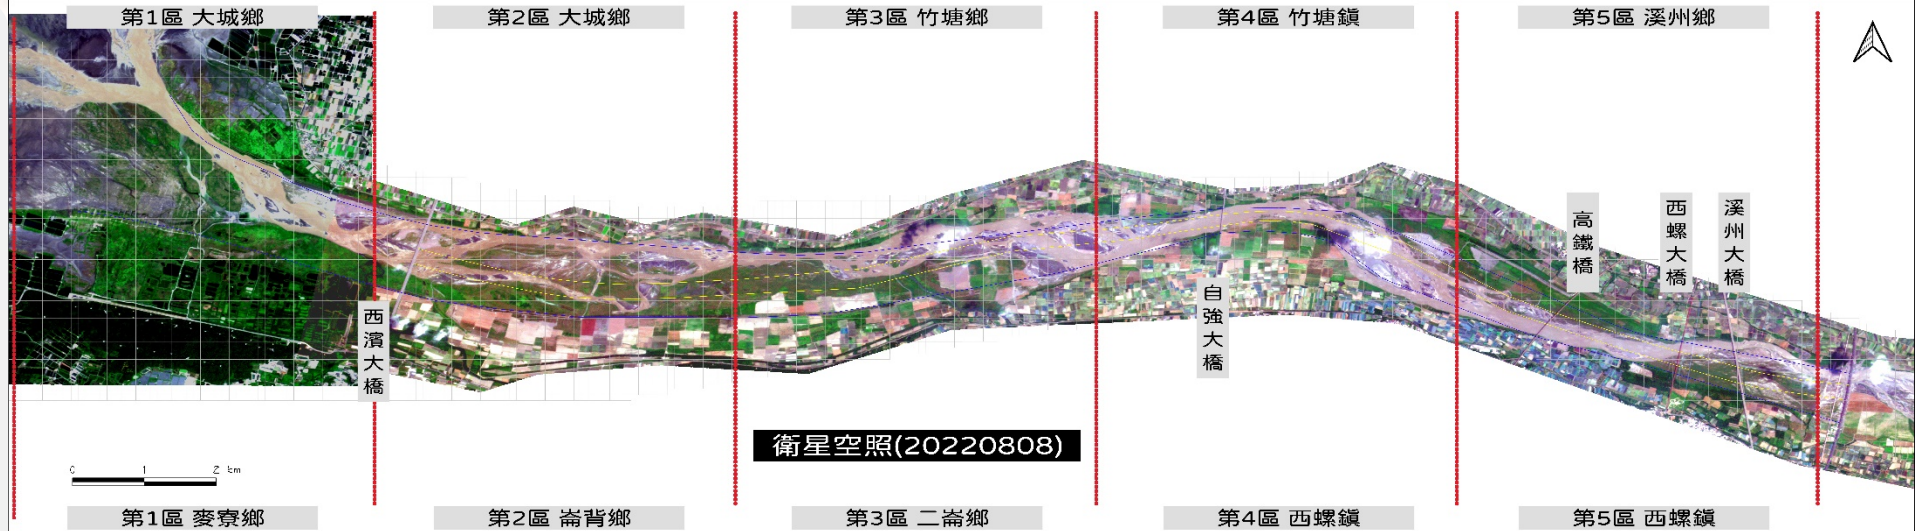

水覆蓋	水覆蓋	水覆蓋	水覆蓋	水覆蓋
河道整理	河道整理	河道整理	河道整理	河道整理
	1) 河道整理0.56公里	1) 河道整理0.64公里		
綠覆蓋	綠覆蓋	綠覆蓋	綠覆蓋	綠覆蓋
1) 西濱下游北岸_地面綠化_4公頃	1) 西濱上南岸_地面綠化_2公頃			
防洪植栽	防洪植栽	防洪植栽	防洪植栽	防洪植栽
1) 西濱下北岸_植栽_1.45公里	1) 大庄堤防堤段水防道路側植樹1.3公里 2) 西濱上南岸_植栽_1.8公里			
其他覆蓋	其他覆蓋	其他覆蓋	其他覆蓋	其他覆蓋
1) 22號井旁_防塵網7公頃 2) 西濱下北岸_水線10.5公頃 3) 20公頃_水線0.8公頃 4) 西濱下南岸_水線7.4公頃 5) 西濱下北岸(增設)_水線1.5公頃				
