


揚塵防治 週報表

112/02/06~112/02/12




西濱大橋下游北岸灘地_防塵網

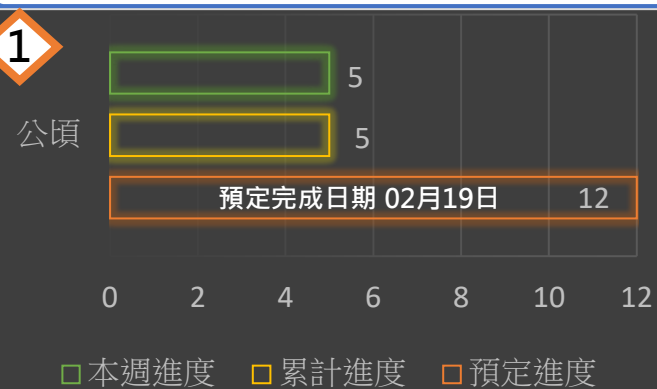

大義崙下游_河道整理



跨河電塔下游北岸低灘地_稻草蓆

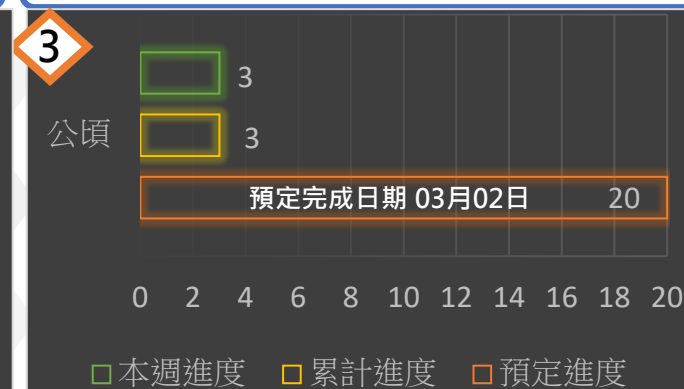

各區 空拍現況



第一區

西濱大橋下游



第二區

40號越堤段(大庄堤防)下游



第三區

74號越堤段上下游



第四區

自橋大橋下游



第五區


西螺大橋上下游

111年度

揚塵KPI進度管制

執行期程:111年5月至112年4月

- 抑制面積
- 進度

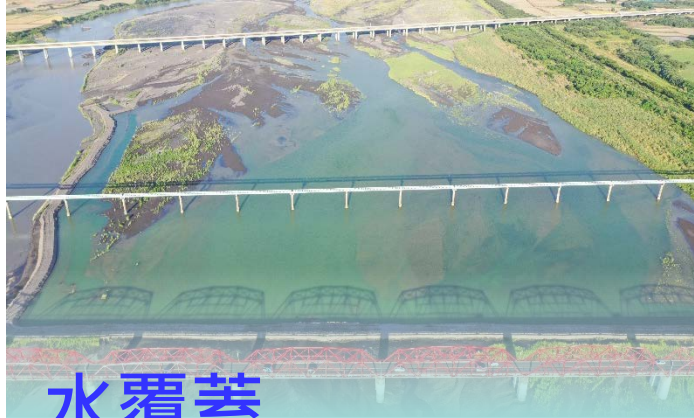

水覆蓋

- 目標值：400 公頃
- 已完成：470 公頃
- 達成率：117.5 %



防洪植栽

- 目標值：4 公里
- 已完成：7.4 公里
- 達成率：185 %



其他覆蓋

- 目標值：450 公頃
- 已完成：329.3 公頃
- 達成率：73.2 %



河道整理

- 目標值：2.5 公里
- 已完成：3公里
- 達成率：120 %



綠覆蓋

- 目標值：50 公頃
- 已完成：265 公頃
- 達成率：530 %

營造複式斷面規劃圖

年度	107-109	110	111	112	合計
KPI(公里)	8	2	6	4	20
實際完成	8	2.13	6.05	-	16.18



第1區 麥寮鄉

110年05月31日 PLAN 5



111/07/19

112年營造複式斷面進度管控


KPI / 4公里
 已完成 / 0km
 達成率 / 0%

➤ 執行進度說明：

預計於112年2月下旬召開局內工作進度檢討會議，並依會議結論規劃本(112)年度複式斷面項目進場期程。

水防道路植栽規劃圖

年度	110	111	112	113	114	115	合計
KPI(公里)	1	2	2	2	2	2	11
實際完成	1	2.3	-	-	-	-	3.3

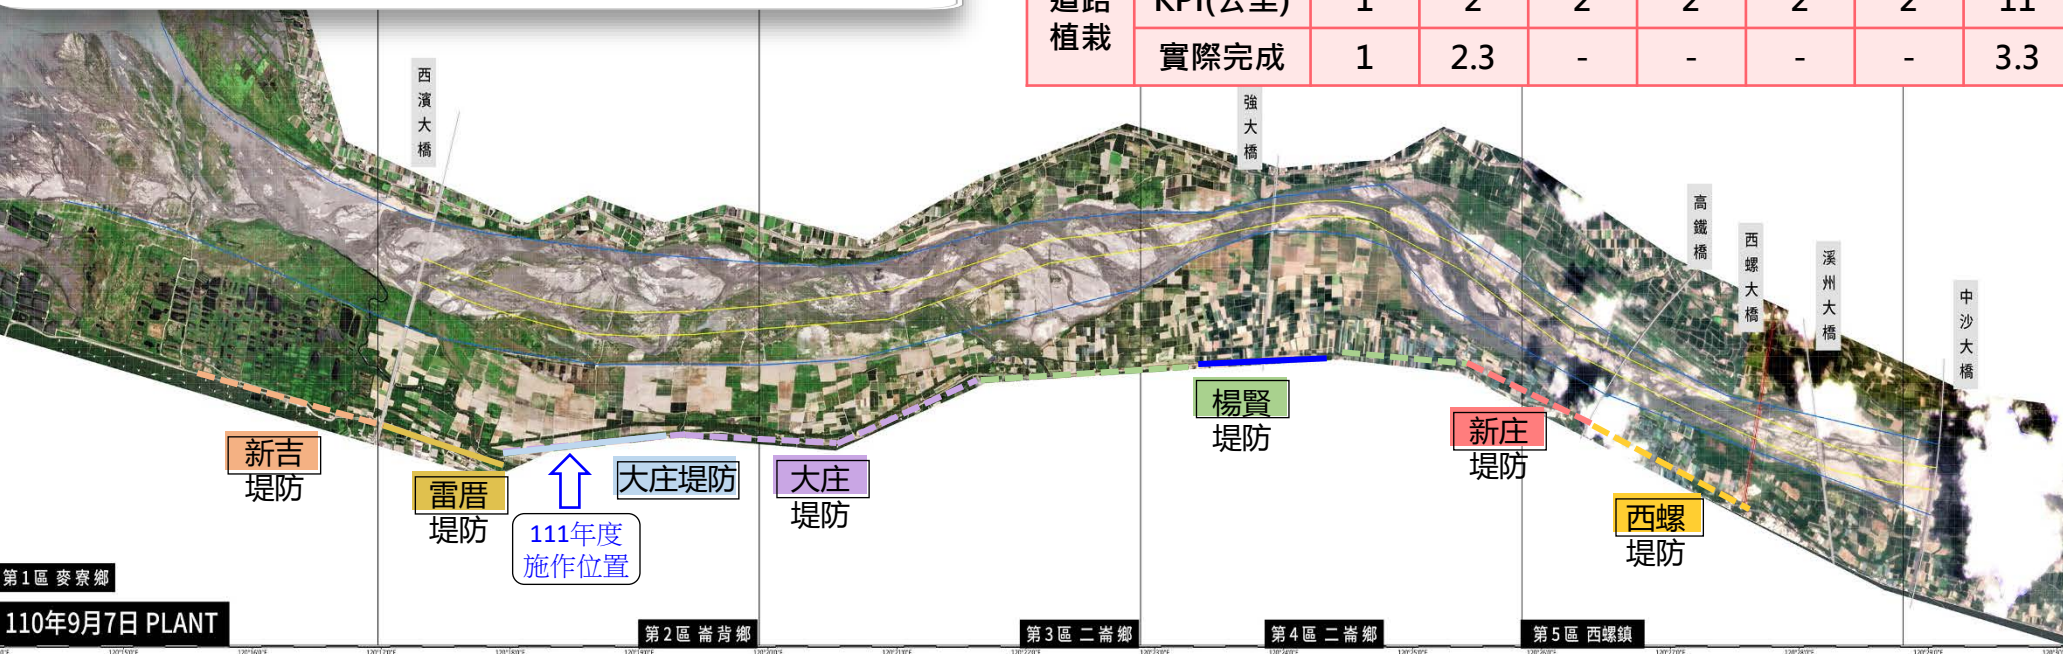

112年水防道路植栽進度管控


KPI / 2公里
已完成 / 0公里
達成率/ 0%

➤ 執行進度說明：

預計於112年2月下旬召開局內工作進度檢討會議，並依會議結論規劃本(112)年度水防道路植栽項目進場期程。



揚塵抑制措施

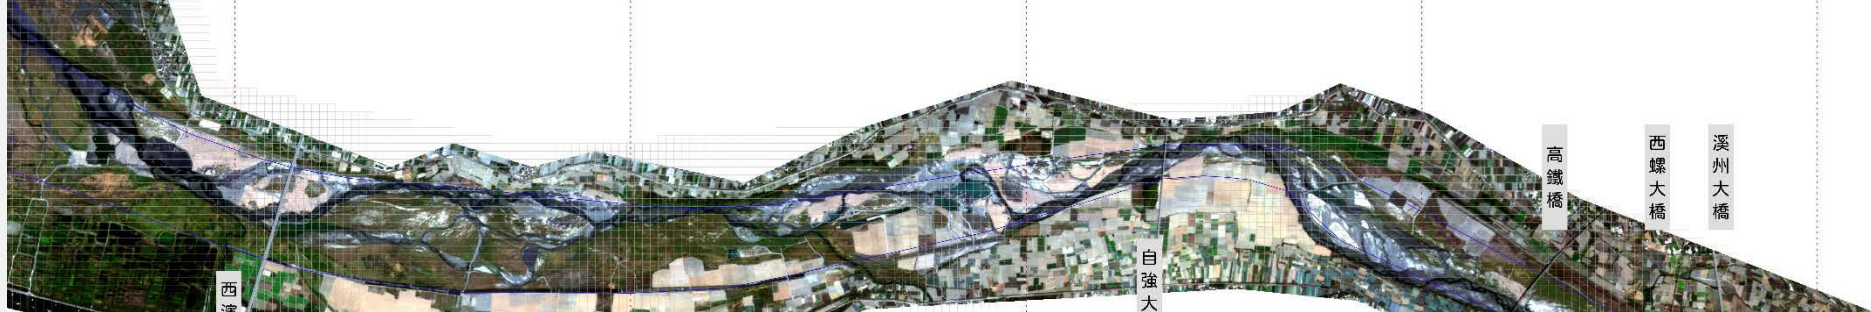

水覆蓋	水覆蓋	水覆蓋	水覆蓋	水覆蓋
	1) 西濱下游北岸_50公頃 2) 西濱大橋上游南岸_180公頃	1) 跨河電塔下游南岸_30公頃	1)51號越堤段A_20公頃 2)51號越堤段B_60公頃 3)94號越堤段_100公頃	1) 高鐵橋上游北岸_30公頃
河道整理	河道整理	河道整理	河道整理	河道整理
	1) 河道整理0.56公里	1) 河道整理1.4公里 2) 74號越堤段0.8公里 3) 大義崙排水下游0.24公里		
綠覆蓋	綠覆蓋	綠覆蓋	綠覆蓋	綠覆蓋
1) 西濱下游北岸_地面綠化_4公頃 2) 西濱下游至200公頃河中灘地_空灑草籽_80公頃	1) 西濱上南岸_地面綠化_2公頃	1) 51號越堤段下游北岸至74號越堤段下游南岸_空灑草籽55公頃	1) 高鐵下游北岸疏濬暫置區_地面綠化3公頃 2) 自強大橋上游_空灑草籽50公頃 3) 高鐵下游北岸至51號越堤段上游北岸_空灑草籽20公頃	1) 西螺大橋下游_空灑草籽25公頃 2) 西螺大橋下游北岸至高鐵下游北岸_空灑草籽26公頃
防洪植栽	防洪植栽	防洪植栽	防洪植栽	防洪植栽
1) 西濱下北岸_植栽_1.45公里	1) 大庄堤防堤段水防道路側植樹1.3公里 2) 西濱上南岸_植栽_1.8公里	1) 74號越堤段下游A_複式斷面植栽0.6公里 2) 74號越堤至跨河電塔_植栽_0.85公里 3) 74號越堤段下游B_複式斷面植栽0.8公里	1) 高鐵下游北岸疏濬暫置區_防洪林帶0.6公里	
其他覆蓋	其他覆蓋	其他覆蓋	其他覆蓋	其他覆蓋
1) 22號井旁_防塵網7公頃 2) 西濱下北岸_水線10.5公頃 3) 20公頃_水線0.8公頃 4) 西濱下南岸_水線7.4公頃 5) 西濱下北岸(增設)_水線1.5公頃 6) 200公頃大沙洲維護便道_碎石級配_1公頃 7) 站體6號至12號北側灘地_防塵網_10公頃 8) 200公頃大沙洲東北側低灘地_稻草蓆_14公頃 9) 9號越堤段河道灘地_稻草蓆_25公頃 10)10號越堤路便道_簡易灑水線0.9公頃 11)西濱大橋橋下灘地_稻草蓆31.3公頃 12)7號越堤段河道灘地_防塵網5公頃 13)站體13號至18號水井灘地_防塵網11公頃 14)西濱大橋下游北岸灘地_防塵網5公頃	1) 下山腳堤防27號越堤段A_稻草蓆2公頃 2) 下山腳堤防27號越堤段B_稻草蓆5公頃 3) 下山腳堤防27號越堤段C_稻草蓆4公頃 4) 40號越堤段便道_碎石級配0.9公頃 5) 西濱大橋下方_稻草蓆_13公頃 6) 44號越堤段上游河道灘地_防塵網4公頃	1) 74號越堤段上游南岸_稻草蓆8公頃 2) 74號越堤段下游南岸_稻草蓆12公頃 3) 74號越堤段複式斷面A_簡易灑水線_6公頃 4) 74號越堤段上游南岸B_稻草蓆9公頃 5) 大義崙上游_稻草蓆18公頃 6) 51號越堤段跨河電塔下北岸_稻草蓆_14公頃 7) 跨河電塔北岸下游_稻草蓆_4公頃 8) 74號越堤上游至跨河電塔_簡易灑水線6.8公頃 9) 大義崙上游至74號越堤_簡易灑水設施5.2公頃 10)跨河電塔上游南岸低灘地_稻草蓆8公頃 11)跨河電塔下游北岸低灘地_稻草蓆3公頃	1)高鐵橋下游北岸_水線4.2公頃 2)高鐵下游北岸疏濬暫置區_稻草蓆_3公頃 3)61號越堤段北岸_防塵網6公頃 4)51號越堤段上游河道灘地(A+B)_稻草蓆11公頃 5)51號越堤段上游北岸低灘地(C)_稻草蓆4公頃	1)高鐵橋上游北岸_稻草蓆10公頃 2)高鐵橋下游北岸_稻草蓆7公頃 3)西螺大橋下游北岸_稻草蓆9公頃 4)中沙大橋上游低灘地_稻草蓆17.8公頃 5)西螺大橋下游北岸_稻草蓆4公頃
