


# 揚塵防治 週報表

112/04/03~112/04/09




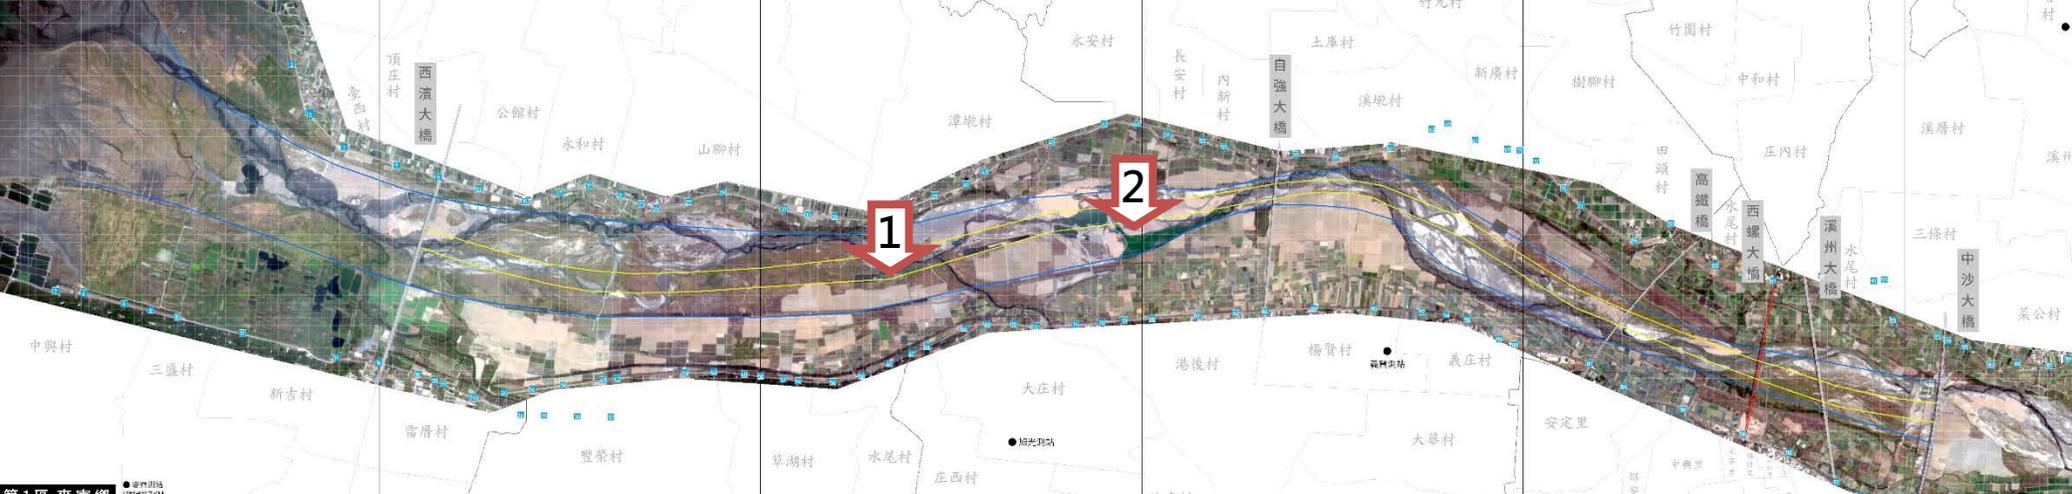

### 大義崙下游\_河道整理



### 跨河電塔下游\_河道整理

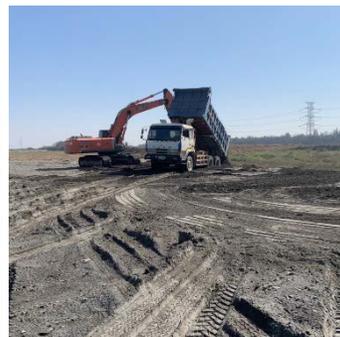

# 各區 空拍現況



第一區  
出海口 下游



第二區  
西濱大橋上游



第三區  
跨河電塔上游



第四區  
自強大橋下游



第五區  
西螺大橋上下游

# 111年度

## 揚塵KPI進度管制

執行期程:111年5月至112年4月

- 抑制面積
- 進度



### 水覆蓋

- 目標值：400 公頃
- 已完成：490 公頃
- 達成率：122.5 %



### 防洪植栽

- 目標值：4 公里
- 已完成：8.9 公里
- 達成率：222.5 %



### 其他覆蓋

- 目標值：450 公頃
- 已完成：356.8 公頃
- 達成率：79.3 %



### 河道整理

- 目標值：2.5 公里
- 已完成：4.225公里
- 達成率：169 %



### 綠覆蓋

- 目標值：50 公頃
- 已完成：265 公頃
- 達成率：530 %

# 營造複式斷面規劃圖

年度	107-109	110	111	112	合計
KPI(公里)	8	2	6	4	20
實際完成	8	2.13	6.05	-	16.18



第1區 麥寮鄉

110年05月25日 PLAN 7



## 112年營造複式斷面進度管控


KPI / 4公里  
 已完成 / 0 km  
 達成率 / 0 %

➤ 執行進度說明：

- 1、已於112年3月1日召開112年第1次工作會議。
- 2、112年度複式斷面規劃為自強大橋上下游2公里，目前已進場施作自強大橋下游施工便道。
- 3、高鐵橋下游北岸，由疏濬標案先予辦理土方培厚作業，目前已進場施作施工便道。

# 水防道路植栽規劃圖

水防道路植栽	年度	110	111	112	113	114	115	合計
	KPI(公里)	1	2	2	2	2	2	11
	實際完成	1	2.3	-	-	-	-	3.3

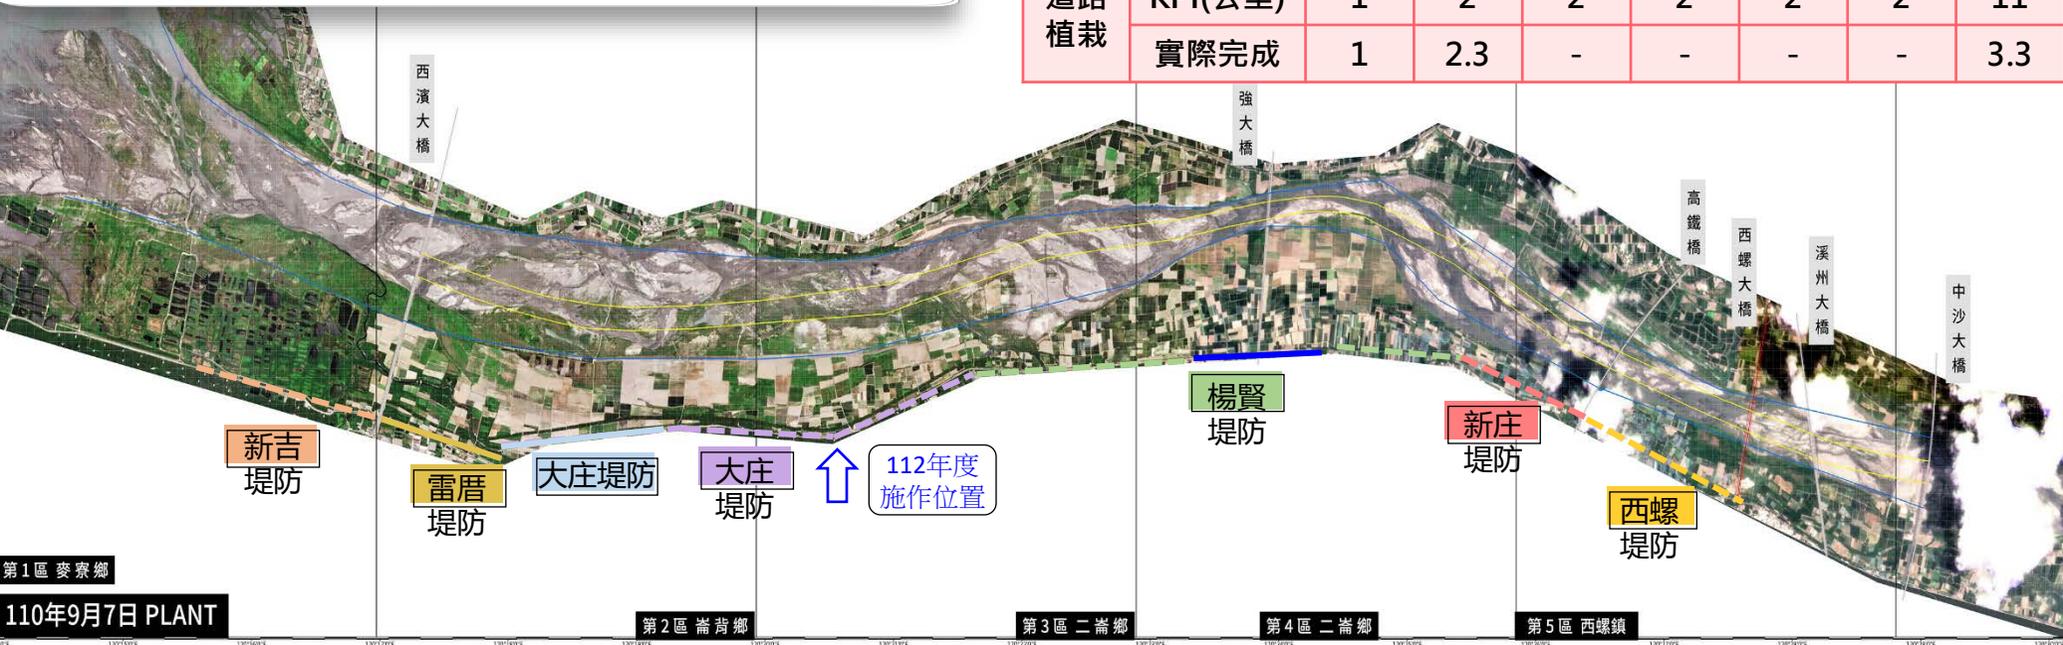

## • 112年水防道路植栽進度管控


**KPI / 2公里**  
**已完成 / 0公里**  
**達成率 / 0%**

➤ 執行進度說明：

- 1、已於112年3月1日召開112年第1次工作會議。
- 2、於大庄堤防施作500公尺水防道路植樹，預計112年8月底前完成(工務課案件)。
- 3、後續1.5公里將滾動式檢討，並於112年12月底施作完成。



# 揚塵抑制措施

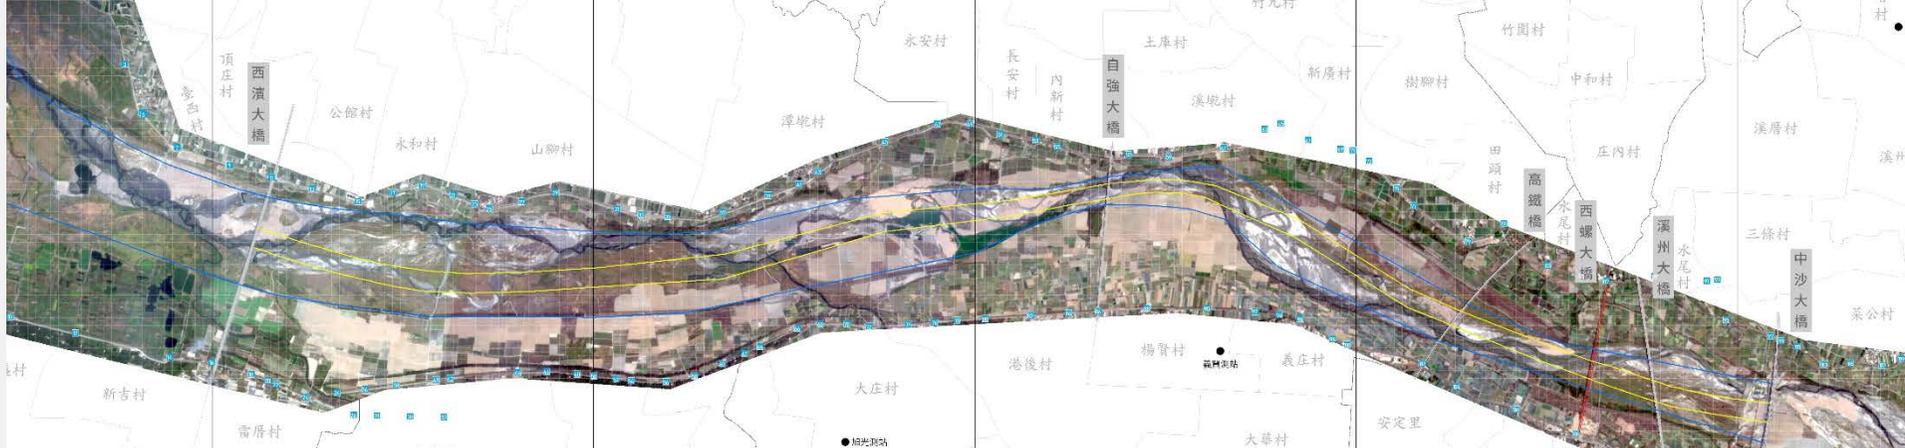

水覆蓋	水覆蓋	水覆蓋	水覆蓋	水覆蓋
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) 西濱下游北岸_50公頃</li> <li>2) 西濱大橋上游南岸_180公頃</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) 跨河電塔下游南岸_30公頃</li> <li>2) 跨河電塔上游南岸_20公頃</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1)51號越堤段A_20公頃</li> <li>2)51號越堤段B_60公頃</li> <li>3)94號越堤段_100公頃</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) 高鐵橋上游北岸_30公頃</li> </ol>
河道整理	河道整理	河道整理	河道整理	河道整理
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) 河道整理0.56公里</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) 河道整理1.4公里</li> <li>2) 74號越堤段0.8公里</li> <li>3) 大義崙排水下游1.385公里</li> <li>4) 跨河電塔下游0.08公里</li> </ol>		
綠覆蓋	綠覆蓋	綠覆蓋	綠覆蓋	綠覆蓋
<ol style="list-style-type: none"> <li>1) 西濱下游北岸_地面綠化_4公頃</li> <li>2) 西濱下游至200公頃河中灘地_空灑草籽_80公頃</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) 西濱上岸岸_地面綠化_2公頃</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) 51號越堤段下游北岸至74號越堤段下游南岸_空灑草籽55公頃</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) 高鐵下游北岸疏濬暫置區_地面綠化3公頃</li> <li>2) 自強大橋上游_空灑草籽50公頃</li> <li>3) 高鐵下游北岸至51號越堤段上游北岸_空灑草籽20公頃</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) 西螺大橋下游_空灑草籽25公頃</li> <li>2) 西螺大橋下游北岸至高鐵下游北岸_空灑草籽26公頃</li> </ol>
防洪植栽	防洪植栽	防洪植栽	防洪植栽	防洪植栽
<ol style="list-style-type: none"> <li>1) 西濱下北岸_植栽_1.45公里</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) 大庄堤防堤段水防道路側植樹1.3公里</li> <li>2) 西濱上岸岸_植栽_1.8公里</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) 74號越堤段下游A_複式斷面植栽0.6公里</li> <li>2) 74號越堤至跨河電塔_植栽_0.85公里</li> <li>3) 74號越堤段下游B_複式斷面植栽0.8公里</li> <li>4) 電塔下南岸疏濬培厚區_防洪林帶1.5公里</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) 高鐵下游北岸疏濬暫置區_防洪林帶0.6公里</li> </ol>	
其他覆蓋	其他覆蓋	其他覆蓋	其他覆蓋	其他覆蓋
<ol style="list-style-type: none"> <li>1) 防塵網_45公頃</li> <li>2) 稻草蓆_70.3公頃</li> <li>3) 施工便道_碎石級配_1公頃</li> <li>4) 簡易灑水設施_21.1公頃</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) 防塵網_4公頃</li> <li>2) 稻草蓆_24公頃</li> <li>3) 施工便道_碎石級配_0.9公頃</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) 稻草蓆_73公頃</li> <li>2) 簡易灑水設施_19.5公頃</li> <li>3) 跨河電塔下游北岸低灘地_稻草蓆22公頃</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) 防塵網_6公頃</li> <li>2) 稻草蓆_18公頃</li> <li>3) 簡易灑水設施_4.2公頃</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1)稻草蓆_47.8公頃</li> </ol>
