

揚塵防治 週報表

113/01/08~113/01/14



各區 空拍現況

第一區

出海口 0號井



第二區

西濱大橋 上游



第三區

大義崙排水 上游



第四區

自強大橋 下游



第五區

西螺大橋 下游



112年度

揚塵KPI進度管制

執行期程:112年5月至113年4月

- 抑制面積
- 進度



其他覆蓋

- 目標值 : 450 公頃
- 已完成 : 291.2 公頃
- 達成率 : 64.7 %



水覆蓋

- 目標值 : 400 公頃
- 已完成 : 310 公頃
- 達成率 : 77.5 %



河道整理

- 目標值 : 2.5 公里
- 已完成 : 3.33 公里
- 達成率 : 133.2 %



防洪植栽

- 目標值 : 6 公里
- 已完成 : 6.05 公里
- 達成率 : 100.8 %



綠覆蓋

- 目標值 : 50 公頃
- 已完成 : 292公頃
- 達成率 : 584 %



營造複式斷面規劃圖

年度	107-109	110-112	113	114	115	合計
KPI(公里)	8	12	4	4	4	20
實際完成	8	12.23	-	-	-	20.23



113年營造複式斷面進度管控

KPI / 4公里

已完成 / 0 km


達成率 / 0 %

執行進度說明：

預計於113年3月上旬召開局內工作進度檢討會議，並依會議結論規劃本(113)年度複式斷面項目進場期程。

水防道路植栽規劃圖

年度	110	111	112	113	114	115	合計
KPI(公里)	1	2	2	2	2	2	11
實際完成	1	2.3	2	-	-	-	5.3

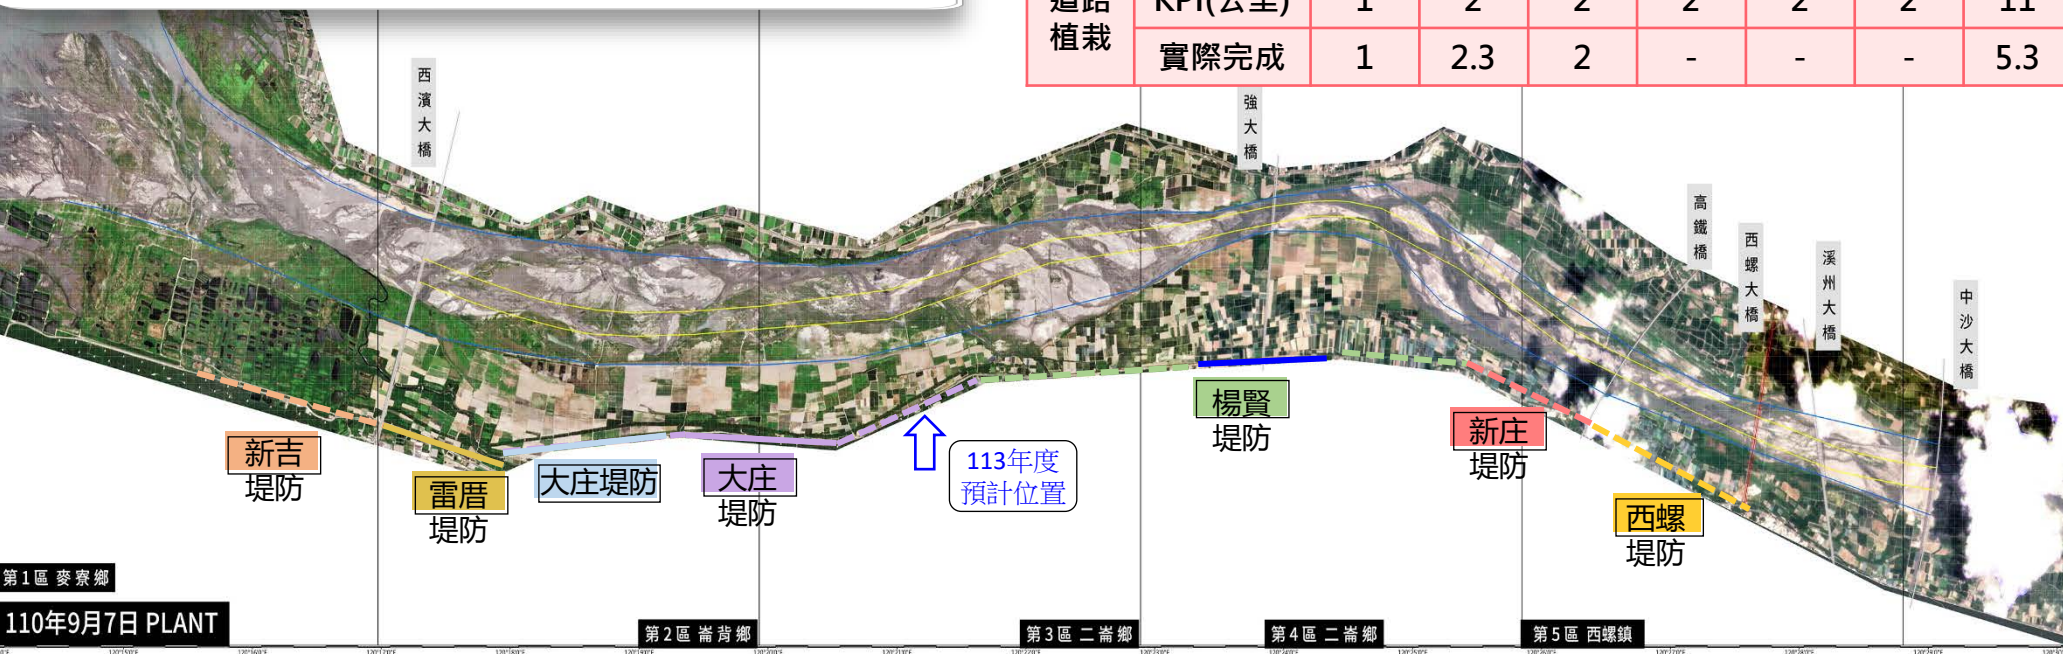

113年水防道路植栽進度管控

KPI / 2公里

已完成 / 0公里

達成率/ 0 %

➤ 執行進度說明：

預計於113年3月上旬召開局內工作進度檢討會議，並依會議結論規劃本(113)年度水防道路植栽項目進場期程



