


揚塵防治 週報表

113/03/04~113/03/10



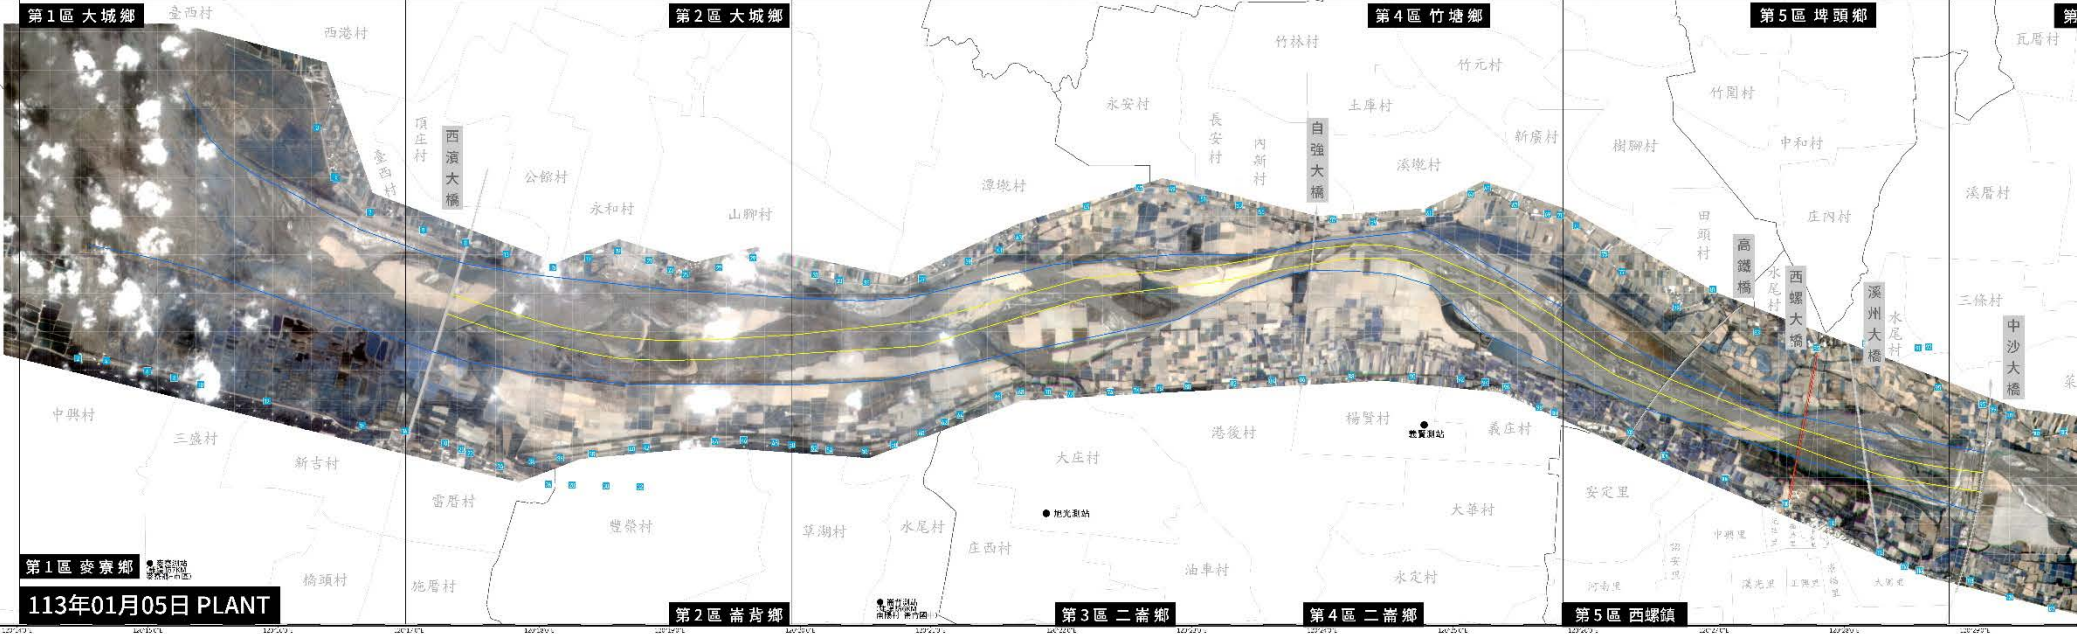

本週3月8日發布揚塵警報
啟動緊急應變措施

本週例行性現地巡查

各區 空拍現況


第一區

出海口 0號井



第二區

西濱大橋 上游

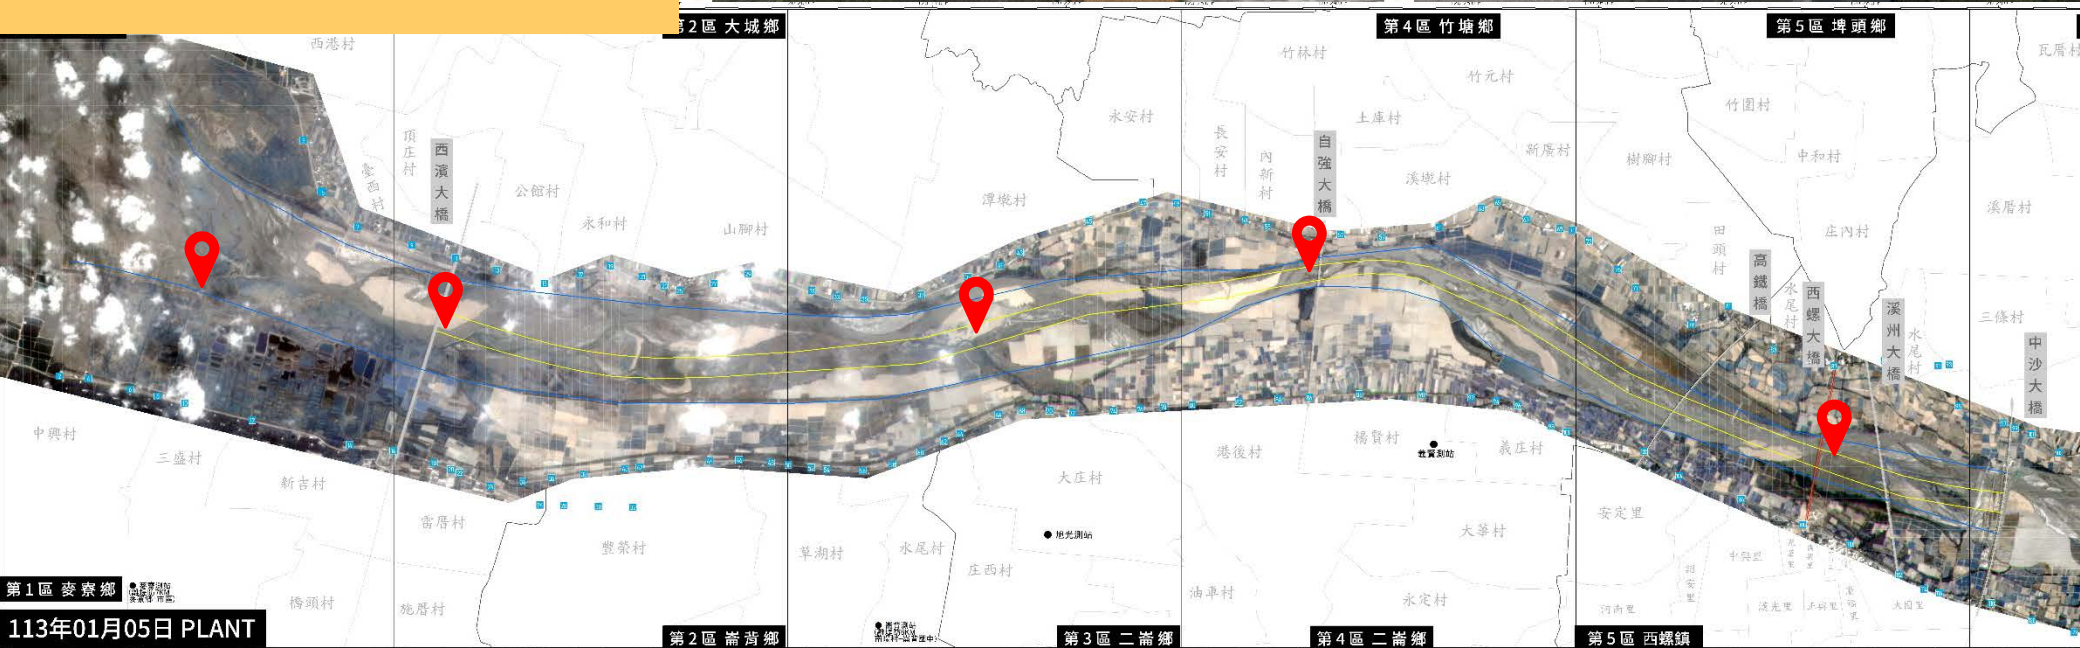

第三區

大義崙排水 上游




第四區

自強大橋 上下游



第五區

西螺大橋 上游

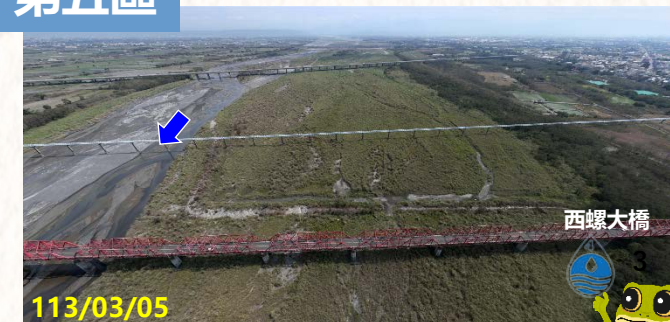

112年度

揚塵KPI進度管制

執行期程:112年5月至113年4月

- 抑制面積
- 進度



其他覆蓋

- 目標值 : 450 公頃
- 已完成 : 336.2 公頃
- 達成率 : 74.7 %



水覆蓋

- 目標值 : 400 公頃
- 已完成 : 350 公頃
- 達成率 : 87.5 %



河道整理

- 目標值 : 2.5 公里
- 已完成 : 4.4 公里
- 達成率 : 176%



防洪植栽

- 目標值 : 6 公里
- 已完成 : 6.05 公里
- 達成率 : 100.8 %



綠覆蓋

- 目標值 : 50 公頃
- 已完成 : 292公頃
- 達成率 : 584 %



營造複式斷面規劃圖

年度	107-109	110-112	113	114	115	合計
KPI(公里)	8	12	4	4	4	20
實際完成	8	12.23	-	-	-	20.23



113年營造複式斷面進度管控

KPI / 4公里

已完成 / 0 km


達成率 / 0 %

執行進度說明：

- 預計113年度案件執行期間為113年5月起，分署將俟相關契約簽訂後，再行擇期召開工作會議研商進場期程。
- 目前將持續辦理現場已完成複式斷面及相關揚塵措施巡查作業，並依河道內水位及裸露地現況，滾動調整因應及緊急應變作為。

水防道路植栽規劃圖

水防道路植栽	年度	110	111	112	113	114	115	合計
	KPI(公里)	1	2	2	2	2	2	11
	實際完成	1	2.3	2	-	-	-	5.3

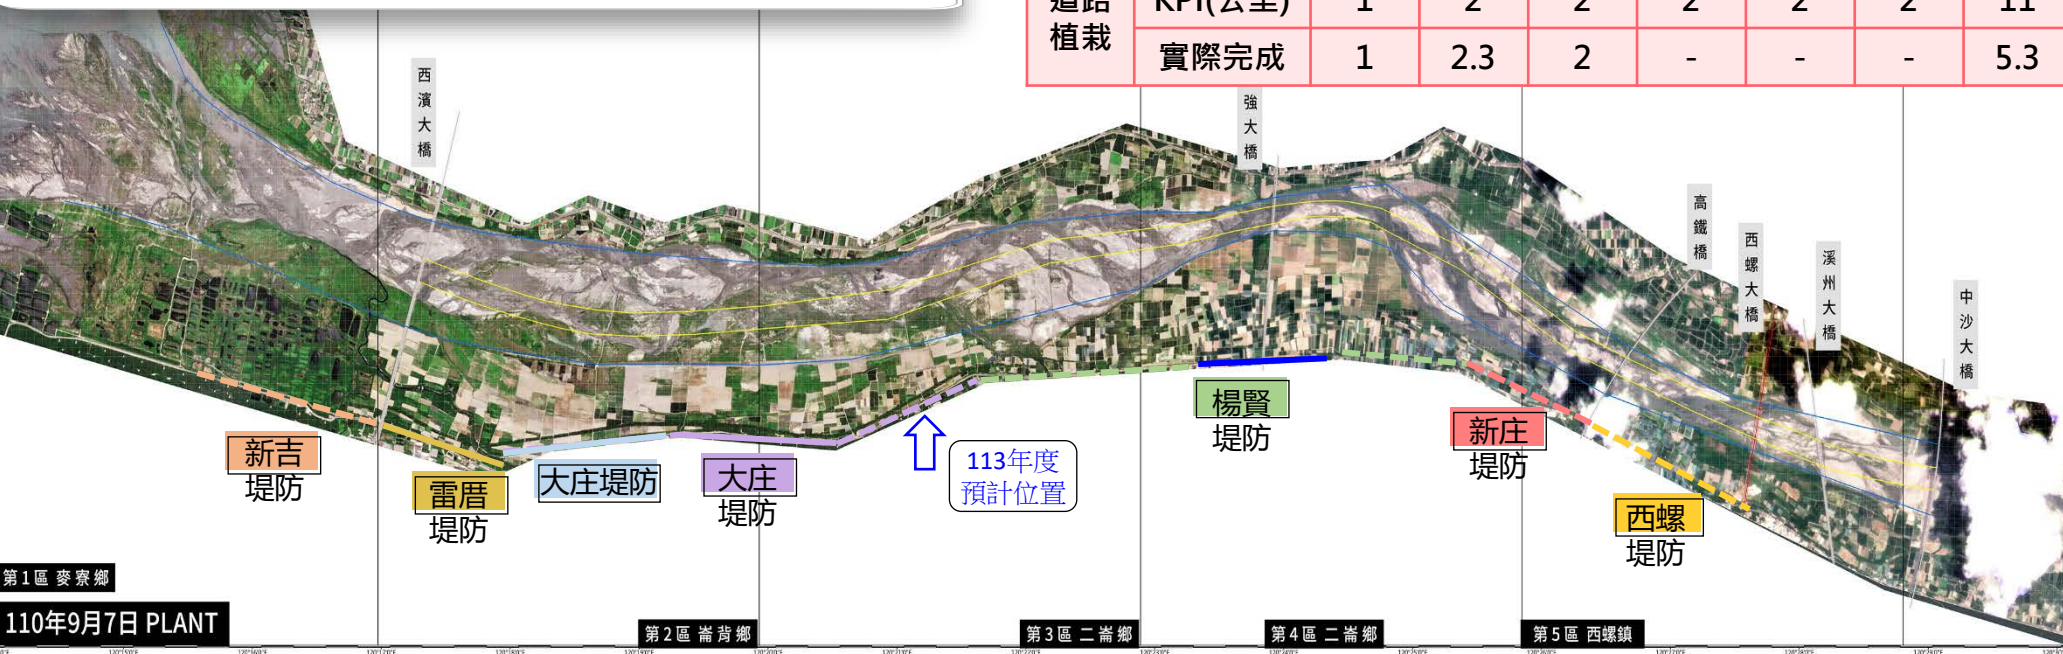

第1區 麥寮鄉

110年9月7日 PLANT

第2區 崙背鄉

第3區 二崙鄉

第4區 二崙鄉

第5區 西螺鎮

• 113年水防道路植栽進度管控

KPI / 2公里

已完成 / 0公里

達成率/ 0 %

➤ 執行進度說明：

預計113年度案件執行期間為113年5月起，分署將俟相關契約簽訂後，再行擇期召開工作會議研商進場期程。



